KHIDI 대표홈페이지 UI/UX 개편 사업 제안서

WEEK 07

2026. 10. 22

TEAM. 아귀
22561016 김아현
22561046 백귀리

PROF.
김기태 교수님

Contents

목차

I. 일반현황

1-1. 일반현황
1-2. 제안사의 조직 및 인원
1-3. 수행조직 및 업무분장

II. 전략 및 방법론

2-1. 사업이해도
  2-1-1. 제안 배경 및 목적
  2-1-2. 제안 범위
  2-1-3. 제안의 특징
  2-1-4. 기대효과
  2-1-5. 발주처가 반복한 단어
  2-1-6. 우리가 읽은 문제
  2-1-7. 되물어야 할 요구사항
  2-1-8. 현황 분석 (AS-IS)
  2-1-9. 벤치마킹
  2-1-10. 사용자 분석
  2-1-11. 요구사항 분석 및 대응표
2-2. 추진 전략
2-3. 적용 기술
2-4. 표준 프레임워크 적용
2-5. 개발방법론

III. 기술 및 기능

3-1. 기능 요구사항
  3-1-1. 정보구조 설계
  3-1-2. 화면 설계
  3-1-3. 콘텐츠 구성
  3-1-4. 운영 방안
3-2. 보안 요구사항
3-3. 데이터 요구사항
3-4. 제약사항

IV. 성능 및 품질

4-1. 성능 요구사항
4-2. 품질 요구사항
4-3. 인터페이스 요구사항
4-4. 테스트 요구사항

V. 프로젝트 관리

5-1. 관리 방법론
5-2. 관리역량
5-3. 일정 계획
  5-3-1. 추진 일정
5-4. 개발 장비
5-5. 투입 인력
  5-5-1. 담당 조직 및 역할
  5-5-2. 역할별 예산 배분

VI. 프로젝트 지원

6-1. 품질 보증
6-2. 시험 운영
6-3. 교육 훈련
6-4. 유지관리
6-5. 기밀보안
6-6. 비상대책
6-7. 기타 지원사항

VII. 기타

7-1. 기타
  7-1-1. 사용자 분석 상세

VIII. 사업 지원 및 별첨

8-1. 본 제안의 범위
8-2. 실제 사업 시 필요한 항목

1-1. 일반현황

일반 사항

구분	내용
제안사명	아귀
구성원	김아현, 백귀리
구성 시기	2026.09
소속	계원예술대학교 디지털미디어디자인과
사업 분야	디지털 서비스 기획, UI/UX 개선
주요 연혁	제안 사업 연혁 없음.

제안사 한 줄 소개

아귀는 사용자 분석을 바탕으로 정보구조와 UI/UX를 설계하여, 누구나 필요한 정보를 쉽고 편리하게 찾도록 돕는 디지털 서비스 2인 기획팀입니다.

전문 영역

사용자 관점의 문제 발견: PC/모바일 홈페이지를 직접 비교하고, 메뉴 탐색과 정보 확인 과정에서 발생하는 불편을 분석한다.
이용 목적 중심의 정보구조 설계: 사용자에게 필요한 정보를 목적별로 묶고, 원하는 콘텐츠에 쉽게 접근하도록 메뉴와 이동 경로를 구성한다.
근거를 연결한 화면 개선: 현황 분석과 벤치마킹 결과를 바탕으로 화면 배치와 메뉴 구조를 개선한다.

1-2. 제안사의 조직 및 인원

제안사 전제 조건

본 제안은 학습 목적의 모의 제안으로, 아귀를 기획/디자인/개발/서버/데이터/보안/시험 및 영문 번역/원어민 검수 인력을 자체 보유한 단독 수행사로 가정한다. 전체 과업은 제안사 내부 인력이 직접 수행하며, 백귀리와 김아현은 KHIDI 국문 홈페이지의 정보 구조 및 화면 설계를 담당한다.
사내 PM과 개발 인력은 분석/설계/개발/시험/운영 전환의 단계별 관리와 시제품 검토, 2주 단위 구현 검토/보완 절차의 적용 경험, 반응형 화면과 접근성 구현 경험을 보유한 것으로 가정한다. 기존 KHIDI 유지관리 사업자는 운영환경 정보 제공과 운영전환과 인계에 협조하는 주체로 구분한다.

조직 및 인원

2명

구성원

22561016 김아현
22561046 백귀리

1-3. 수행조직 및 업무분장

R&R

담당 조직	담당 인력	역할	이 사업에서 맡을 부분	투입 비중
사업 관리 (1)	가상 임원급 총괄 PM	전체 사업 총괄	일정·예산·위험·품질 관리, KHIDI 협의, 보고·검수 및 산출물 제출 관리	8.2%
기획 (1)	백귀리	기획 책임자	요구사항·사용자 분석, 수행 범위 관리, 국문 홈페이지 정보구조 및 화면 설계	6.1%
기획 (1)	김아현	서비스 기획 담당자	국문 홈페이지 현황 및 벤치마킹 분석, 정보 구조 및 화면 설계, 사용성 검증 준비	6.1%
기획 (1)	가상 영문 기획자	영문 홈페이지 기획자	외국인 이용 목적에 따른 콘텐츠 선별, 영문 메뉴·정보구조 및 화면 구성 기획	2.0%
디자인 (1)	가상 사내 디자이너	시각 디자인	국/영문 홈페이지 PC/모바일 디자인, 웹스타일 가이드·시안 제작	12.3%
개발 (1)	가상 화면 개발 담당자	사용자 인터페이스 구현	국/영문 홈페이지 반응형 화면, 접근성 및 브라우저 호환성 대응	16.4%
개발 (1)	가상 기능/연계 개뱔 담당자			

2-1. 사업이해도

2-1-1. 제안 배경 및 목적

반응형 웹 개선을 넘어, 이용 목적에 따라 주요 메뉴로 쉽게 접근하는 KHIDI 홈페이지로 개편

SCQA로 정리한 사업 이해

구분	내용	근거
S 상황	KHIDI 대표홈페이지는 지원사업, 연구·통계, 산업정보 등 다양한 정보를 제공하며, 여러 사용자군이 각자의 목적에 따라 이용한다. RFP는 PC와 모바일의 서비스 품질 균일화와 디지털 약자를 포함한 다양한 사용자의 접근성 향상을 요구한다.	RFP 추진 배경 및 목적을 정리한 2-1-1, 주요 사용자와 이용 목적을 분석한 2-1-10
C 문제	그러나 PC에서 제공하는 주요 서비스 바로가기가 모바일에는 없고, '바로이동' 메뉴의 구성도 기기마다 달라 같은 정보를 다시 찾아야 한다. 모바일 게시물 목록과 후원승인 화면은 주요 정보를 한눈에 확인하기 어렵고, 사업공고의 핵심 내용은 본문과 첨부파일에 분산되어 탐색 부담이 발생한다.	2-1-8 현황 분석, 2-1-9 벤치마킹
Q 질문	사용자가 PC와 모바일에서 탐색 방법을 다시 익히거나 여러 화면과 첨부파일을 오가지 않고, 자신의 목적에 맞는 정보와 핵심 내용을 빠르게 확인하려면 무엇을 바꿔야 하는가?	현황 분석과 벤치마킹에서 도출한 개선과제
A 답	**이용자는 필요한 정보를 찾으려 메뉴를 헤매고, 모바일에서는 잘린 내용을 확인하기 위해 화면을 움직입니다. 저희는 이용 목적별 메뉴와 한눈에 읽히는 모바일 화면을 설계해 이용자의 탐색 부담을 줄이고, KHIDI의 주요 서비스에 쉽게 접근하도록합니다.**	2-2 추진 전략, 3-1-1 정보구조 설계, 3-1-2 화면 설계

RFP에서 확인한 사업 추진 배경

○ 운영중인 대표홈페이지는 '14년 전면 개편 후 '18년에 메인페이지를 개선 하였으나
별도로 운영중인 모바일 웹 제공 정보 품질 저하 등 문제점이 여전히 존재하여 PC 이용자 간 서비스 품질 균일화 필요

○ 디지털 약자를 포함한 다양한 사용자의 서비스 접근성 보장 및 변화하는 사용자 요구에 대응한 UI/UX 고도화 필요
※ '23년 보건복지부 경영평가결과(지적사항)와 '24년 대표홈페이지 고객 만족도 조사 결과에 따른 대표홈페이지 개선 필요

○ 디지털정부서비스 UI/UX가이드라인 발간('24) 등 모든 국민이 쉽고 편리하게 공공 서비스를 이용할 수 있도록 하는 서비스 환경 구축 강조

○ 외부 환경변화에 따른 최신 트렌드(웹 표준, 웹 호환성, 웹 접근성, 보안 및 개인정보보호, 모바일 기기 등)의 웹 기술에 대응 필요

RFP p.1 [I. 사업 개요 - 추진 배경 및 필요성] 원문 발췌.

사업 목적

반응형 웹 기반의 정보구조 및 UI/UX 개선과 최신 웹 기술 적용을 통해 서비스 품질의 통일성 및 호환성을 보장하고,
사용자 접근성 및 편의성을 고려한 정보구조로 홈페이지 사용 만족도를 향상하는 것.

RFP p.4 [II. 사업 추진방안 - 추진 목표 및 추진 방향]을 바탕으로 요약함.

제안사가 이해한 사업 목적

사용자의 이용 목적에 맞게 메뉴와 정보의 배치를 재구성하고,
PC 와 모바일에서 일관된 품질과 접근 경로를 제공하여 누구나 필요한 정보와 주요 서비스를 쉽고 편리하게 찾도록 하는 것.

2-1. 사업이해도

2-1-2. 제안 범위

국문 홈페이지의 사용자 목적 중심 정보구조와 반응형 UI/UX 설계에 집중함

RFP가 제안하는 전체 사업 범위

구분	주요 수행 범위	관련 요구 사항
UI/UX 및 정보구조 개편	국/영문 홈페이지 UI/UX 개편, 메뉴/정보구조 개선	SFR-001~004
웹 서비스 및 기능 고도화	반응형 웹 구현, 기능/개발 연계, 접근성 및 인터페이스 개선	SFR-005~007, INR-001~005
시스템, 데이터, 보안 관리	시스템 환경 및 성능 관리, 데이터 관리 및 검증, 보안 및 개인정보보호	PER-001~004,ECR-001~002, DAR-001~006, SER-001~012
품질 검증 및 사업 운영	품질 검증 및 테스트, 개발 표준 및 사업관리, 운영 전환 및 기술지원	TER-001~003, QUR-001~006, COR-001~007, PMR-001~008, PSR-001~005

수행 범위 - 이번 제안에서 수행하는 범위

요구사항	주요 수행 범위	수행 내용
SFR-001	홈페이지 UI/UX 개편 공통사항	사용자 중심 콘텐츠 최적화, 웹 접근성 및 관련 가이드라인 준수, 국내 유관기관 홈페이지를 벤치마킹하고 최신 웹 트렌드를 분석해 적용 방안 설계
SFR-002	홈페이지 UI/UX 개편 방안 수립	현행 홈페이지 문제점 분석, 벤치마킹, UI/UX 개선안 및 디자인 구성도 제시
SFR-003	메뉴구조 재구성	메뉴 재분류/통폐합, 정보구조 재설계, 주요 메뉴 접근성 강화, 정보 탐색 편의성 개선
SFR-005	반응형 웹 구현	국문 홈페이지 반응형 웹 구현, 화면 및 메뉴 최적화, 콘텐츠 이용환경 통일, 기존 CMS 연동

제외 범위 - 이번 제안에서 다루지 않는 것

본 제안은 RFP의 모든 요구사항에 대한 대응 방안을 제시하며, 백귀리와 김아현은 제안서 8쪽에 명시한 집중 과업 (SFR-001, 002, 003, 005)을 담당하고, 나머지 과업은 사내 가상 인력이 수행하는 것으로 가정한다.

KHISS, Medical Korea 등 연계 사업 포털은 사업 범위에서 다루지 않는다.

2-1. 사업이해도

2-1-2. 제안 범위

집중 과업 - 이번 제안에서 깊게 설계할 것

구분	주요 수행 범위	
디바이스 간 일관된 이용 경험 확보 (SFR-005)	관찰 증거	• PC의 플로팅 메뉴가 모바일에서는 제공되지 않음 (근거: 2-1-8) • '바로이동' 메뉴 구성이 PC와 모바일에서 다름 (근거: 2-1-8) • 모바일 게시글 표에서 가로 스크롤이 필요함 (근거: 2-1-8) • 후원승인 페이지에 PC용 레이아웃이 그대로 적용됨 (근거: 2-1-8)
	개선 방향	반응형 웹을 기반으로 PC/모바일 간 기능과 접근 경로를 일관되게 제공하고, 게시글 목록과 상세 페이지를 각 디바이스 환경에 맞게 최적화함.
	수행 한계	사내의 가상 화면 개발 담당자가 HTML, CSS, JavaScript 등 표준 웹 기술을 활용해 PC와 모바일에 대응하는 반응형 웹을 구현한다고 가정함.
사용자 목적 중심의 정보구조 재설계 (SFR-002, 003)	관찰 증거	• 현재 홈이 기관 중심 분류체계로 구성됨 (추정) • 우수사는 사용자 행동, 목적에 따라 서비스를 그룹화함 (근거: 2-1-9) • 사업공고에서 필요한 핵심 정보를 빠르게 파악하기 어려움 (근거: 2-1-10)
	개선 방향	사용자 분석을 바탕으로 목적별 서비스 그룹 및 Quick Menu를 구성하고, 메뉴와 콘텐츠를 사용자 활용성 중심으로 재분류함.
	수행 한계	홈페이지 이용통계(로그데이터), 고객 만족도조사 결과는 제안사가 확인할 수 없으며, 착수 후 해당 데이터를 제공받아 실제 메뉴별 이용 빈도, 사용자 이동 경로, 이용자 주요 불편사항 등의 항목을 분석하고, 그 결과로 메뉴 구조를 확정할 것임을 명시함.
명확하고 일관된 정보 전달 체계 구축 (SFR-001, 002)	관찰 증거	• 모바일에서 카테고리 탭과 '+' 버튼이 겹침 (근거: 2-1-8) • 중요 정보의 우선순위가 한눈에 드러나지 않음 (추정)
	개선 방향	KRDS를 기준으로 UI 요소와 정보 표현 체계를 정비하고, 중요도에 따라 콘텐츠의 위계와 배치를 재설계함.
	수행 한계	사내의 가상 디자이너가 '진흥원의 정체성을 반영한 디자인 적용'과 '웹스타일 가이드(WSG) 수립 및 설계' 등 디자인 관련 과업을 수행한다고 가정함.

2-1. 사업이해도

2-1-3. 제안의 특징

**PC와 모바일 직접 관찰과 사용자 분석을 바탕으로,
주요 서비스를 쉽게 찾는 이용 목적별 메뉴와 한눈에 읽히는 모바일 화면을 설계함**

핵심 제안

이용자는 필요한 정보를 찾으려 메뉴를 헤매고, 모바일에서는 잘린 내용을 확인하기 위해 화면을 움직입니다.
저희는 이용 목적별 메뉴와 한눈에 읽히는 모바일 화면을 설계해 이용자의 탐색 부담을 줄이고, KHIDI의 주요 서비스에 쉽게 접근하도록 합니다.

제안 근거

1. RFP 요구사항에 따른 반응형 웹 개선 필요
- 관찰: 모바일 및 다양한 디바이스에 최적화된 화면 구성과 일관된 디자인 제공을 요구한다. (근거: RFP 'SFR-005')
- 인사이트: 현재 PC와 모바일 간 화면 구성 및 정보 제공 방식에 차이가 있어 개선 필요성이 확인된다.
- 개선 방향: PC와 모바일의 현재 화면을 비교/분석하고, 일관된 서비스 이용이 가능한 반응형 웹으로 개선한다.

2. PC와 모바일간 서비스 접근 경로의 불일치
- 관찰: PC에서 제공하는 플로팅 메뉴가 모바일에는 없고, '바로이동' 메뉴의 항목도 기기별로 다르다. (근거: 2-1-8)
- 인사이트: 같은 정보를 찾더라도 기기가 바뀌면 메뉴를 다시 탐색해야 하므로, 정보 접근의 일관성과 편의성이 떨어진다.
- 개선 방향: 모바일에 간소형 플로팅 메뉴를 제공하고, PC와 모바일의 '바로이동' 항목을 통일해 주요 서비스에 접근하는 경로를 일관되게 구성한다.

3. 모바일에서 한눈에 확인하기 어려운 정보 배치
- 관찰: 모바일 게시물 목록은 주요 정보 확인에 가로 스크롤이 필요하고, 후원승인 표는 과도한 줄바꿈으로 정보 간 관계를 파악하기 어려우며, 카테고리명과 더보기 버튼이 겹친다. (근거: 2-1-8)
- 인사이트: 필요한 정보와 이동 버튼을 한눈에 파악하기 어려워 반복적인 화면 이동과 탐색이 발생한다.
- 개선 방향: 모바일 너비에 맞게 목록과 표의 정보를 재배치하고, 카테고리와 더보기 버튼을 구분하여 정보 확인과 다음 화면으로의 이동을 쉽게 한다.

우리 제안의 차별화 요소

구분	다른 팀도 할 수 있는 것	우리만 하는 것
반응형 웹	반응형 웹 설계	KHIDI 웹사이트를 PC와 모바일로 직접 사용하고 대조해 두 기기 간 차이점과 불편을 확인해 개선안을 도출함. (2-1-8)
사용자 분석	로그데이터를 활용한 착수 후의 계획 세우기	현재 사이트에서 확인 가능한 데이터(KHIDI 제공 서비스, 게시글 유형별 조회수)를 바탕으로 사용자 분석 (2-1-10)
메뉴 구조 개편	콘텐츠 유형과 분류에 따라 메뉴 재그룹핑, 통폐합	벤치마킹에서 확인한 우수사의 이용 목적별 진입점 설계 방식을 참고하여, 사용자 분석으로 도출한 KHIDI의 주요 이용 목적에 따라 메뉴 구조를 개편함. (2-1-9, 2-1-10)

2-1. 사업이해도

2-1-4. 기대효과

이용 목적에 맞게 찾고, 어떤 기기에서도 정보를 한눈에 확인하도록 설계해 탐색은 쉽게, 이용은 만족스럽게

본 장표는 개편에 따른 기대효과이며, 현재 달성한 성과를 의미하지 않는다. 접근/정보 확인 시간의 감소 목표는 착수 후 기존 화면의 과제 수행시간을 측정하여 KHIDI와 정하고, 개선 화면과 동일 조건에서 비교 검증한다.(p.57)

정량적 효과

지표	기대 효과	확인 방법
과업 성공률	원하는 메뉴, 정보에 접근하는 사용자의 비율이 증가함.	AS-IS와 TO-BE에서 동일한 과업을 수행하게 하고 성공 여부를 비교함.
과업 수행 시간	원하는 서비스에 접근하고 정보를 확인하기까지 걸리는 시간이 감소함.	메뉴 이동, 게시글 정보 확인 등 주요 과업의 수행 시간을 비교함.
탐색 단계 수	원하는 콘텐츠에 도달하기까지 필요한 클릭, 탭 수가 감소함.	PC와 모바일에서 서비스 접근 경로 및 클릭 수를 비교함.
PC/모바일 간 과업 수행 차이	동일한 과업에서 기기별 성공률 및 수행 시간의 차이가 감소함.	같은 과업을 PC와 모바일에서 수행하고 기기별 결과를 비교함.

정성적 효과

지표	기대 효과	확인 방법
서비스 이용 일관성	사용 기기가 달라져도 동일한 서비스의 위치와 이용 방법을 쉽게 이해함.	PC, 모바일 이용 후 메뉴 구조 및 접근 경로에 대해 인터뷰를 진행함.
정보 탐색 편의성	원하는 메뉴와 콘텐츠를 쉽게 발견하게 접근할 수 있다고 느낌.	과업 수행 후 탐색 난이도, 불편 사항 등을 인터뷰함.
인터페이스 명확성	버튼의 기능과 상세 페이지 이동 경로를 쉽게 인지함.	사용자의 첫 클릭 및 진입을 확인하고, 기능 이해 여부를 인터뷰함.
사용자 만족도	KHIDI 홈페이지의 사용자 만족도 향상	KHIDI 대표홈페이지 고객 만족도 조사를 실시해 전년도와 결과를 비교함.

2-1. 사업이해도

발주처가 강조한 '사용자, 메뉴, 접근성'을 개선안 설계의 기준으로 삼아, 누구나 필요한 정보를 쉽게 찾는 KHIDI 홈페이지로 개편

2-1-5. 발주처가 반복한 단어

순위	단위	언급 횟수	언급된 곳
1	사용자	39회	사업 추진 배경, 요구사항, 평가표
2	메뉴	24회	사업 개요 및 목적, 요구사항, 평가표
3	접근성	23회	사업 개요 및 목적, 요구사항, 평가표
4	편의성	16회	사업 내용, 요구사항, 평가표
5	호환성	13회	사업 추진 배경, 요구사항, 평가표
6	반응형	10회	사업 내용, 요구사항, 평가표

2-1-6. 우리가 읽은 문제

목적은 사용자 관점에서 정보구조와 UI/UX를 개선하여,
누구나 원하는 콘텐츠에 쉽고 편리하게 접근할 수 있는 고품질 웹 서비스를 만드는 것이다.
그래서 현재 홈페이지에서 사용자의 정보 탐색을 방해하는 구조와 이용상의 불편을 파악하고,
메뉴 구조, 정보 배치, 인터페이스를 사용자 중심으로 재구성해야 한다.
이를 통해 사용자는 PC/모바일 등 어떤 환경에서도 필요한 정보를 빠르게 찾고 이해하며 이용할 수 있어야 하고,
KHIDI는 콘텐츠를 보다 효과적으로 전달하여 홈페이지의 활용성과 사용자 만족도를 높일 수 있어야 한다.

2-1-7. 되물어야 할 요구사항

모호한 요구사항	왜 모호한가	되물을 질문
경량화 작업 수행	경량화의 기준이 모호함.	경량화의 기준이 뎁스 수인가요? 그렇다면 최대 뎁스 수는 몇까지인가요? 혹은 한 화면에 들어오는 정보의 양인가요? 그렇다면 한 화면에 최대로 띄울 수 있는 정보량은 어느정도 인가요? 혹은 불필요한 페이지를 정보구조에서 없애야 하나요?
다양한 사이즈의 화면 최적화된 UI 구현	어느 사이즈의 화면까지 대응해야 하는지 알 수 없음.	지원해야 할 최소 해상도와 브라우저 버전이 정해져 있나요?
사용하는 데 불편함이 없도록 해야함	불편함의 기준이 모호함,	불편함의 기준이 무엇인가요? 사용성 평가 기준이 있나요? 그렇다면 사용성 평가 대상은 어떻게 설정하면 되나요? 사용성 평가를 위한 태스크는 어떤 걸 기준으로 하죠?

2-1. 사업이해도

2-1-8. 현황 분석 (AS-IS)

PC, 모바일을 직접 비교해 접근 경로의 차이와 반응형에 최적화되지 않은 현재 화면을 확인함

제안사는 2026년 09월 28일 직접 한국보건산업진흥원(KHIDI) 현행 홈페이지를 사용하며 핵심 요구사항의 현황을 확인하였다.

관찰한 것	어디서	문제인가	근거
PC에서 화면 우측에 표시되는 '조직도, 정보공개, 자료실' 등 플로팅 버튼이 모바일 웹에서는 나타나지 않는다.	KHIDI 대표 홈페이지 홈 화면 https://www.khidi.or.kr/kps	PC에서는 어느 화면에서나 접근 가능한 플로팅 버튼이 모바일에는 제공되지 않아 사용 디바이스에 따라 정보 격차가 발생한다. (SFR-001)	플로팅 버튼에 있는 서비스 이용을 위해 모바일에서는 전체 메뉴를 펼쳐 3depth까지 탐색해야 한다. (2026.09.28 관찰)
'바로이동' 드롭다운 버튼을 클릭 시 나오는 메뉴의 종류가 모바일웹과 PC웹이 다르다.	모바일: 메뉴 PC: 상단 GNB	모바일에서 '바로이동'에서 접근할 수 있는 콘텐츠를 PC에서는 동일한 접근 경로로 이용할 수 없다. (SFR-003)	PC에서는 '홈> 사업포털 > KHISS 보건산업통계' 진입 경로로 탐색해야 한다. (2026.09.28 관찰)
모바일 웹의 보도자료, 사업공고 등 게시글목록에서 가로로 스크롤해야 작성자, 작성일 등 정보를 확인할 수 있다.	보도자료, 사업공고, 입찰정보, 채용공고, 바이오헬스 뉴스클리핑 등 홈페이지 내 게시글 목록 전반	화면 크기가 달라지며 화면에서 확인할 수 있는 콘텐츠가 달라진다. (SFR-003)	PC에서는 '번호/제목/작성자/등록일/조회수/첨부' (보도 자료 기준)을 한눈에 확인할 수 있지만, 모바일에서는 작성자, 등록일, 조회수 확인을 위해 가로 스크롤을 해야 한다. (2026.09.28 관찰)
사용자가 선택할 수 있는 표시 언어 이름을 영어로만 표시한다.	상단 GNB에 위치한 Language 드롭다운 버튼 클릭 시	KRDS 가이드라인에 따르면 '원어-현재 서비스를 표시하는데 사용된 언어'로 작성해야 한다. (SFR-004)	모바일과 PC 모두에서 언어 변경을 위해 드롭다운 버튼을 탭/클릭했을 때 영어로만 표시되는 것을 확인했다. (2026.09.28 관찰)
모바일 웹에서 콘텐츠 카테고리 탭의 텍스트와 '+' 버튼이 겹쳐진다.	홈 화면 메인 콘텐츠 영역	해당 카테고리의 상세 페이지로의 진입점인 '+' 버튼과 텍스트의 구분이 어려워 정보 접근성이 떨어진다. (SFR-001)	모바일 웹에서 '공지사항, 사업공고' 등 콘텐츠 종류를 탭했을 때 '+' 버튼이 '보도자료' 텍스트와 겹치게 활성화되는 것을 확인했다. (2026.09.28 관찰)
모바일 웹에서 접속한 후원승인 페이지의 콘텐츠의 레이아웃이 반응형으로 적용됨	홈 > 메뉴 > 후원승인 페이지	콘텐츠의 가독성이 떨어진다. (SFR-005)	PC에서는 '번호/행사명/주최기관/행사기간/행사장소/승인 받은 기관명'을 한눈에 볼 수 있지만 모바일에서는 행사명이 깨지고, 행사 장소와 승인받은 기관명 확인을 위해 가로스크롤을 해야한다. (2026.09.28 관찰)

2-1. 사업이해도

2-1-9. 벤치마킹

앙딱정 자리

국내 유관기관의 벤치마킹을 통해 기관별 강점과 개선점을 비교/분석하고, KHIDI 대표 홈페이지에 적용 가능한 개선 방향을 도출하고자 하였다. (SFR-001, SFR-002)

벤치마킹 대상 및 선정 이유

대상	유형	선정이유
한국산업기술진흥원 (KIAT)	동종업계	산업기술혁신 정책개발 지원 사업을 하는 산업통상부 산하 준정부기관이다
KOTRA 무역투자24	우수사	사용자 목적별(상담, 사업 신청, 사업 추천)로 진입경로를 제공해 원하는 정보에 쉽게 접근할 수 있다
기업마당	경쟁사	보건산업진흥원 사업공고가 그대로 다시 올라온다

분석 기준 표

분석 기준은 정보구조, 기능, UI/UX, 콘텐츠, 디자인의 5개 영역으로 구성하였으며, 사용자 관점에서 정보의 접근성, 기능의 사용 편의성, 탐색 과정의 일관성, 콘텐츠 전달력 및 시각적 가독성을 종합적으로 평가할 수 있도록 세부 항목을 설정하였다.

정보구조	• 서로 관련된 정보와 기능이 사용자의 기대에 맞게 적절한 메뉴로 묶여 있는가? • 사용자가 원하는 정보에 도달하기까지 불필요한 탐색 단계를 거치지 않는가? • 중요한 정보와 부가적인 정보의 우선순위가 명확하게 구분되어 있는가?
기능	• 사용자가 필요한 기능의 존재를 쉽게 인지할 수 있는가? • 사용자가 기능의 이용 방법을 별도의 학습 없이 이해하고 수행할 수 있는가?
UI/UX	• 동일한 기능이나 정보가 페이지마다 일관된 방식으로 제공되는가? • 사용자가 메뉴와 기능을 기억하거나 추론하지 않고도 이해할 수 있는가? • 사용자의 행동 순서에 맞게 정보와 기능이 자연스럽게 배치되어 있는가? • 페이지마다 색상, 타이포그래피, 버튼 등 UI 요소가 일관된 규칙으로 적용되어 있는가?
콘텐츠	• 사용자가 서비스 이용에 필요한 핵심 정보를 충분히 제공받을 수 있는가? • 콘텐츠의 내용과 의미를 사용자가 쉽게 이해할 수 있는가? • 제공되는 정보가 현재 기준으로 유효하고 최신 상태로 관리되고 있는가?
디자인	• 중요도에 따라 정보가 시각적으로 명확하게 구분되어 있는가? • 글자 크기, 행간, 대비 등을 통해 콘텐츠를 편안하게 읽을 수 있는가? • 기관 고유의 정체성을 나타낼 수 있는 차별화된 디자인 콘셉트가 존재하는가?

2-1. 사업이해도

2-1-9. 벤치마킹

분석 기준별 평가 및 종합의견

자사 - 한국보건산업진흥원(KHIDI)

분석 대상	
KHIDI 한국보건산업진흥원	
분석기준	**주요내용 및 평가 방법**
정보구조 서로 관련된 정보와 기능이 사용자의 기대에 맞게 적절한 메뉴로 묶여 있는가? 사용자가 원하는 정보에 도달하기까지 불필요한 탐색 단계를 거치지 않는가? 중요한 정보와 부가적인 정보의 우선순위가 명확하게 구분되어 있는가?	GNB가 '바이오헬스산업정보, 알림/소식, 소통/참여, 열린경영, KHIDI 소개'로 연관성 있는 서비스들끼리 분류가 잘 되어 있는 편이다. 통합 검색과 공지, 사업공고 등 홈에서 바로 접근할 수 있어 불필요한 탐색 단계가 비교적 적다. 홈 상단에 통합검색을 크게 배치하고 최신 공지, 사업공고, 보도자료 등을 제공해 우선 순위가 명확하다.
기능 사용자가 필요한 기능의 존재를 쉽게 인지할 수 있는가? 사용자가 기능의 이용 방법을 별도의 학습 없이 이해하고 수행할 수 있는가?	통합검색, 전체메뉴, 사업공고 등 기본 기능은 쉽게 찾을 수 있으나 사업을 찾고 신청하는 같은 사용자 행동 중심 기능은 직접적으로 강조되지 않는다. 검색, 목록, 게시판 등 일반적인 웹 UI를 사용해 기본 이용이 어렵지 않다.
UI, UX 동일한 기능이나 정보가 페이지마다 일관된 방식으로 제공되는가? 사용자가 메뉴와 기능을 기억하거나 추론하지 않고도 이해할 수 있는가? 사용자의 행동 순서에 맞게 정보와 기능이 자연스럽게 배치되어 있는가? 페이지마다 색상, 타이포그래피, 버튼 등 UI 요소가 일관된 규칙으로 적용되어 있는가?	GNB, 사이드 내비게이션, 푸터 등 UI를 번복적으로 사용해 전반적인 이용 방식이 일관적이다. 모바일에서는 플로팅 메뉴가 없고, 바로 이동에서 이용할 수 있는 서비스 또한 PC와 다르다. 세부 페이지에서 게시글 목록이 잘리거나 깨지는 경우가 있어 기기에 따라 웹 경험이 달라질 수 있다. 검색, 목록, 게시판 등 일반적인 웹사이트 UI를 사용해 이용이 어렵지 않다. 통계 자료 탐색 - 첨부 파일 내려받기, 사업 공고 탐색 - 공고 확인 등 목적별 탐색 흐름이 자연스러운 편이다. 게시판, 콘텐츠 페이지가 KRDS를 기반의 공통적인 화면 규칙을 사용하고 있어 UI 요소의 일관성은 높은 편이다.
콘텐츠 사용자가 서비스 이용에 필요한 핵심 정보를 충분히 제공받을 수 있는가? 콘텐츠의 내용과 의미를 사용자가 쉽게 이해할 수 있는가? 제공되는 정보가 현재 기준으로 유효하고 최신 상태로 관리되고 있는가?	연구보고서, 통계 등 콘텐츠는 풍부하지만, 사업공고 상세는 제목, 작성일, 첨부파일 중심으로 구성돼 지원대상, 기간, 신청방법, 담당자 등을 화면에서 즉시 파악하기 어렵다. 연구·통계 콘텐츠는 주제별로 분류되어 있지만, 사업 공고를 찾는 사용자의 경우 지원대상, 신청방법 등을 첨부파일을 통해서만 알 수 있기 때문에 불편하다. 2026년 10월 2일 기준 신규 입찰정보와 10월 1일 사업공고, 보도자료, 최신 산업 뉴스 등을 지속적으로 제공하고 있어 콘텐츠 최신성이 높다.
디자인 중요도에 따라 정보가 시각적으로 명확하게 구분되어 있는가? 글자 크기, 행간, 대비 등을 통해 콘텐츠를 편안하게 읽을 수 있는가? 기관 고유의 정체성을 나타낼 수 있는 차별화된 디자인 콘셉트가 존재하는가?	홈에서 기관 슬로건과 통합검색을 노출하고 'N'으로 최신 소식을 표시해 시각적 위계가 존재하지만, 사업 공고 페이지같은 경우 공지 이외의 모든 공고가 동일한 위계로 보여진다. 정보의 중요도마다 글자 크기가 달라 구분하기 쉽고 목록과 콘텐츠를 일정한 단위로 나누어 가독성 있게 정보가 읽힌다. 홈의 슬로건과 3D 캐릭터, 아이콘, 컬러를 활용해 공공기관의 딱딱한 이미지가 적다.

종합평가

다양한 보건산업 정보와 서비스를 제공하며 기본적인 웹 이용 체계와 UI 일관성을 확보하고 있으며, 통합검색, 게시판, 필터 등 익숙한 기능을 통해 기본적인 정보 탐색이 용이하다.
하지만 사업공고나 연구자료는 필요한 정보가 제목과 첨부파일 등에 분산되어 있어 탐색 부담이 발생하고, 다른 웹사이트들에 비해 모바일과 PC의 이용 경험 차이가 크다.

2-1. 사업이해도

2-1-9. 벤치마킹

분석 기준별 평가 및 종합의견

동종업계 - 한국산업기술진흥원(KIAT)

분석 대상	
분석기준	**주요내용 및 평가 방법**
정보구조 서로 관련된 정보와 기능이 사용자의 기대에 맞게 적절한 메뉴로 묶여 있는가? 사용자가 원하는 정보에 도달하기까지 불필요한 탐색 단계를 거치지 않는가? 중요한 정보와 부가적인 정보의 우선순위가 명확하게 구분되어 있는가?	기관 소개, 공지, 사업 공고 등 다양한 서비스가 연관성 있게 그룹핑되어 있고, 각 그룹의 레이블링이 적절하고 이해하기 쉽다. 메인에서 사업안내, 규정/서식자료, 정책간행물 등 주요 서비스로 바로 진입할 수 있게 해 반복적인 메뉴 탐색을 방지한다. 검색창, Quick Menu로 주요 서비스를 화면 상단에 먼저 노출하고 이후 정책 간행물, 사진뉴스 등을 배치해 콘텐츠의 우선순위가 비교적 분명하다.
기능 사용자가 필요한 기능의 존재를 쉽게 인지할 수 있는가? 사용자가 기능의 이용 방법을 별도의 학습 없이 이해하고 수행할 수 있는가?	통합검색과 사업공고 검색 등 주요 기능을 직접 노출해 기능의 존재를 쉽게 발견할 수 있다. 검색창, 기간 선택, 접수기간 필터 등 익숙한 UI를 사용해 기능을 쉽게 이용할 수 있다.
UI, UX 동일한 기능이나 정보가 페이지마다 일관된 방식으로 제공되는가? 사용자가 메뉴와 기능을 기억하거나 추론하지 않고도 이해할 수 있는가? 사용자의 행동 순서에 맞게 정보와 기능이 자연스럽게 배치되어 있는가? 페이지마다 색상, 타이포그래피, 버튼 등 UI 요소가 일관된 규칙으로 적용되어 있는가?	하위 페이지에서 동일한 페이지 디자인을 사용하며 사이드 내비게이션, Quick Link 등을 공통적으로 제공해 화면 구조의 일관성이 높다. 모바일에서도 Quick Menu를 제공하고 있지만, 최적화되어 있지 않아 다른 요소에 가려진다. 사업/자료, 고객/소통, 정보공개 등 직관적인명칭을 사용해 메뉴 의미를 쉽게 이해할 수 있다. 사업 검색 - 공고 확인 - 담당자 문의 및 첨부자료 확인은 이어지지만, 실제 신청은 외부 사이트에서 진행해야 하기 때문에 흐름이 단절될 수 있다. 공통된 GNB, 검색영역, Quick Link, 푸터를 반복 사용해 UI 요소의 통일성이 높다.
콘텐츠 사용자가 서비스 이용에 필요한 핵심 정보를 충분히 제공받을 수 있는가? 콘텐츠의 내용과 의미를 사용자가 쉽게 이해할 수 있는가? 제공되는 정보가 현재 기준으로 유효하고 최신 상태로 관리되고 있는가?	상세 공고에서 접수 기간, 담당 부서, 연락처, 첨부 파일, 사업 내용을 제공하며 담당자 문의 기능도 지원해 정보량이 충분하다. 콘텐츠는 쉬운 언어로 분류돼 있지만 전문/행정 용어는 일반 사용자가 이해하기 어려울 수 있다. 2026년 10월의 공지사항, 정책간행물을 업데이트하고 현재 접수 중이거나 예정된 사업공고를 지속적으로 노출하는 등/오 콘텐츠가 최신화되어 있다.
디자인 중요도에 따라 정보가 시각적으로 명확하게 구분되어 있는가? 글자 크기, 행간, 대비 등을 통해 콘텐츠를 편안하게 읽을 수 있는가? 기관 고유의 정체성을 나타낼 수 있는 차별화된 디자인 콘셉트가 존재하는가?	접수중인 공고, 접수 마감인 공고를 색으로 구분하고, 주요 메뉴도 별도의 아이콘으로 강조하는 등 중요한 정보를 빠르게 파악할 수 있다. 글자 크기가 적절하고, 파란 강조색과 흰 화면과의 색 대비가 있어 콘텐츠 가독성이 우수하다. '미래기술, 균형발전, 혁신 동반자' 라는 기관 메시지를 전면 배치와 캐릭터를 활용 등 KIAT의 정체성이 비교적 잘 전달되는 편이다.

종합평가

홈의 Quick Menu, 상세 페이지마다 일관되게 적용된 Quick Link와 UI 요소를 통해 사용자가 주요 기능에 빠르게 접근할 수 있다.
하나의 상세 공고 안에서 접수 기간, 담당 부서, 문의 기능 등 사업 정보가 상단에 정리되어 있어 공고 확인 목적을 가진 사용자가 쉽게 원하는 정보를 찾을 수 있다.

2-1. 사업이해도

2-1-9. 벤치마킹

분석 기준별 평가 및 종합의견

우수사 - 대한무역투자진흥공사(KOTRA)

분석 대상	
kotra 대한무역투자진흥공사 	
분석기준	**주요내용 및 평가 방법**
정보구조 서로 관련된 정보와 기능이 사용자의 기대에 맞게 적절한 메뉴로 묶여 있는가? 사용자가 원하는 정보에 도달하기까지 불필요한 탐색 단계를 거치지 않는가? 중요한 정보와 부가적인 정보의 우선순위가 명확하게 구분되어 있는가?	GNB가 연관성 있는 서비스끼리 그룹핑되어 있고, 홈에서는 '찾아보고, 물어보고, 신청하고, 추천받고'로 묶여있어 사용자가 목적에 맞게 기능을 찾을 수 있다. 홈에서 해외시장정보,사업신청 등 주요 서비스로 직접 이동할 수 있으며 지원사업도 신청 및 상세조회가 가능해 불필요한 탐색 단계가 적다. 주요 서비스와 현재 진행 중인 지원사업을 홈에 우선 배치하고 소식과 소개를 후순위로 제공해 정보의 우선순위가 분명하다.
기능 사용자가 필요한 기능의 존재를 쉽게 인지할 수 있는가? 사용자가 기능의 이용 방법을 별도의 학습 없이 이해하고 수행할 수 있는가?	통합검색뿐 아니라 '찾아보고, 물어보고, 신청하고, 추천받고' 등 목적별 주요 기능을 홈에 직접 노출하고 있어 사용자가 기능을 인지하기 쉽다. 검색창, 필터 등 익숙한 UI를 사용해 기능을 쉽게 이용할 수 있지만, 상단 내비게이션이 타 웹사이트들과 다르게 1depth만 표시해 처음 이용 시 어려움을 느낄 수 있다.
UI, UX 동일한 기능이나 정보가 페이지마다 일관된 방식으로 제공되는가? 사용자가 메뉴와 기능을 기억하거나 추론하지 않고도 이해할 수 있는가? 사용자의 행동 순서에 맞게 정보와 기능이 자연스럽게 배치되어 있는가? 페이지마다 색상, 타이포그래피, 버튼 등 UI 요소가 일관된 규칙으로 적용되어 있는가?	GNB, 사이드 내비게이션, 푸터 등 UI를 번복적으로 사용해 전반적인 이용 방식이 일관적이다. 모바일에서도 동일한 목적별 Quick Menu를 제공하고 있어 기기별 대응이 비교적 우수하다. '찾아보고, 물어보고, 신청하고'처럼 사용자의 이용 목적에 따른 레이블링으로 이해가 쉽지만, '큐레이션' 등 일부 메뉴는 정확히 어떤 것을 지원하는 기능인지 모호하다. 정보 탐색 - 상담 - 지원사업 신청으로 이어지는 사용 흐름을 사이트의 정보 구조에 반영해 사용자가 자연스럽게 서비스를 이용할 수 있다. 주요 페이지에서 공통 헤더, 버튼, 목록 패턴을 반복적으로 사용해 UI 규칙이 통일되어 있다.
콘텐츠 사용자가 서비스 이용에 필요한 핵심 정보를 충분히 제공받을 수 있는가? 콘텐츠의 내용과 의미를 사용자가 쉽게 이해할 수 있는가? 제공되는 정보가 현재 기준으로 유효하고 최신 상태로 관리되고 있는가?	사업 상세에서 사업유형, 기간, 주관부서, 연락처, 첨부파일, 신청 버튼을 제공하고 별도의 상담채널도 다양하게 제공해 이용에 필요한 정보가 매우 충분하다. 사업별 상세 내용은 구조화해 보여줘 콘텐츠의 의미를 파악하기 어렵지 않다. 현재 모집 중인 사업의 신청 마감일을 D-day로 제공하고, 2026년 10월 2일 보도자료 등 최신 콘텐츠가 지속적으로 등록되어 있어 정보 최신성이 높다.
디자인 중요도에 따라 정보가 시각적으로 명확하게 구분되어 있는가? 글자 크기, 행간, 대비 등을 통해 콘텐츠를 편안하게 읽을 수 있는가? 기관 고유의 정체성을 나타낼 수 있는 차별화된 디자인 콘셉트가 존재하는가?	홈에서 Quick Menu 역할을 하는 '찾아보고, 물어보고, 신청하고, 추천받고'를 색으로 강조하고, 지원사업의 마감 날짜를 파란색으로 표기하는 등 중요도에 따른 구분이 명확하다. 주요 정보를 카드와 제목 단위로 구분해 인식이 쉽지만, 사업 상세나 상담 페이지는 항목과 설명이 많아 장시간 이용 시 사용자가 시각적 부담을 느낄 수 있다. '찾아보고, 물어보고, 신청하고, 추천받고'라는 콘셉트로 다른 공공기관 사이트보다 간편한 무역지원 플랫폼 정체성은 명확하지만, 공공기관의 딱딱한 이미지가 있다.

종합평가

사용자의 행동을 기준으로 메뉴 구조를 만들었다는 점이 다른 웹사이트들과 차별화된다. 덕분에 사용자는 자신의 목적에 맞는 정보로 빠르게 접근할 수 있다. 주요사업, 사업분류, 기간 같은 검색 조건과 AI 추천 사업을 제공하기 때문에 다양한 지원 사업 중에서도 자신에게 필요한 사업을 찾는 과정이 체계적인 편이다.
하지만 타 웹사이트들과 상단 내비게이션 이용 방식이 조금 달라(1depth까지만 표시, 아이콘을 클릭해야 전체 depth표시) 처음 이용하는 사용자는 불편함을 겪을 수 있다.

2-1. 사업이해도

2-1-9. 벤치마킹

분석 기준별 평가 및 종합의견

경쟁사 - 기업마당

분석 대상	
중소기업 성공 길잡이 기업마당 Biz info	

분석기준	주요내용 및 평가 방법
정보구조 서로 관련된 정보와 기능이 사용자의 기대에 맞게 적절한 메뉴로 묶여 있는가? 사용자가 원하는 정보에 도달하기까지 불필요한 탐색 단계를 거치지 않는가? 중요한 정보와 부가적인 정보의 우선순위가 명확하게 구분되어 있는가?	GNB가 연관성 있는 서비스끼리 그룹핑되어 있고, 홈에서는 '찾아보고, 물어보고, 신청하고, 추천받고'로 묶여있어 사용자가 목적에 맞게 기능을 찾을 수 있다. 홈에서 해외시장정보,사업신청 등 주요 서비스로 직접 이동할 수 있으며 지원사업도 신청 및 상세조회가 가능해 불필요한 탐색 단계가 적다. 주요 서비스와 현재 진행 중인 지원사업을 홈에 우선 배치하고 소식과 소개를 후순위로 제공해 정보의 우선순위가 분명하다.
기능 사용자가 필요한 기능의 존재를 쉽게 인지할 수 있는가? 사용자가 기능의 이용 방법을 별도의 학습 없이 이해하고 수행할 수 있는가?	통합검색뿐 아니라 '찾아보고, 물어보고, 신청하고, 추천받고' 등 목적별 주요 기능을 홈에 직접 노출하고 있어 사용자가 기능을 인지하기 쉽다. 검색창, 필터 등 익숙한 UI를 사용해 기능을 쉽게 이용할 수 있지만, 상단 내비게이션이 타 웹사이트들과 다르게 1depth만 표시해 처음 이용 시 어려움을 느낄 수 있다.
UI, UX 동일한 기능이나 정보가 페이지마다 일관된 방식으로 제공되는가? 사용자가 메뉴와 기능을 기억하거나 추론하지 않고도 이해할 수 있는가? 사용자의 행동 순서에 맞게 정보와 기능이 자연스럽게 배치되어 있는가? 페이지마다 색상, 타이포그래피, 버튼 등 UI 요소가 일관된 규칙으로 적용되어 있는가?	GNB, 사이드 내비게이션, 푸터 등 UI를 번복적으로 사용해 전반적인 이용 방식이 일관적이다. 모바일에서도 동일한 목적별 Quick Menu를 제공하고 있어 기기별 대응이 비교적 우수하다. '찾아보고, 물어보고, 신청하고'처럼 사용자의 이용 목적에 따른 레이블링으로 이해가 쉽지만, '큐레이션' 등 일부 메뉴는 정확히 어떤 것을 지원하는 기능인지 모호하다. 정보 탐색 - 상담 - 지원사업 신청으로 이어지는 사용 흐름을 사이트의 정보 구조에 반영해 사용자가 자연스럽게 서비스를 이용할 수 있다. 주요 페이지에서 공통 헤더, 버튼, 목록 패턴을 반복적으로 사용해 UI 규칙이 통일되어 있다.
콘텐츠 사용자가 서비스 이용에 필요한 핵심 정보를 충분히 제공받을 수 있는가? 콘텐츠의 내용과 의미를 사용자가 쉽게 이해할 수 있는가? 제공되는 정보가 현재 기준으로 유효하고 최신 상태로 관리되고 있는가?	사업 상세에서 사업유형, 기간, 주관부서, 연락처, 첨부파일, 신청 버튼을 제공하고 별도의 상담채널도 다양하게 제공해 이용에 필요한 정보가 매우 충분하다. 사업별 상세 내용은 구조화해 보여줘 콘텐츠의 의미를 파악하기 어렵지 않다. 현재 모집 중인 사업의 신청 마감일을 D-day로 제공하고, 2026년 10월 2일 보도자료 등 최신 콘텐츠가 지속적으로 등록되어 있어 정보 최신성이 높다.
디자인 중요도에 따라 정보가 시각적으로 명확하게 구분되어 있는가? 글자 크기, 행간, 대비 등을 통해 콘텐츠를 편안하게 읽을 수 있는가? 기관 고유의 정체성을 나타낼 수 있는 차별화된 디자인 콘셉트가 존재하는가?	홈에서 Quick Menu 역할을 하는 '찾아보고, 물어보고, 신청하고, 추천받고'를 색으로 강조하고, 지원사업의 마감 날짜를 파란색으로 표기하는 등 중요도에 따른 구분이 명확하다. 주요 정보를 카드와 제목 단위로 구분해 인식이 쉽지만, 사업 상세나 상담 페이지는 항목과 설명이 많아 장시간 이용 시 사용자가 시각적 부담을 느낄 수 있다. '찾아보고, 물어보고, 신청하고, 추천받고'라는 콘셉트로 다른 공공기관 사이트보다 간편한 무역지원 플랫폼 정체성은 명확하지만, 공공기관의 딱딱한 이미지가 있다.

종합평가

사용자가 원하는 지원사업을 쉽게 찾고, 신청 여부를 판단하는 것에 큰 강점이 있다. 메인에서 신청 가능한 지원 사업 등 중요한 정보를 우선해서 보여주고, 상세 페이지에는 신청기간, 사업개요, 신청방법, 문의처가 화면 상단에 모여 있어 사업 내용을 빠르게 파악할 수 있다. 하지만 상세 페이지에 필터와 검색 옵션이 많아 한 화면의 정보 밀도가 높아 복잡하게 느껴질 수 있다. 또 디자인은 정보 전달 역할에 충실하지만 브랜드만의 고유한 인상은 약한 편이며, 모바일에서의 사용성에도 개선의 여지가 있다.

2-1. 사업이해도

2-1-9. 벤치마킹

벤치마킹 분석 기준별 비교표

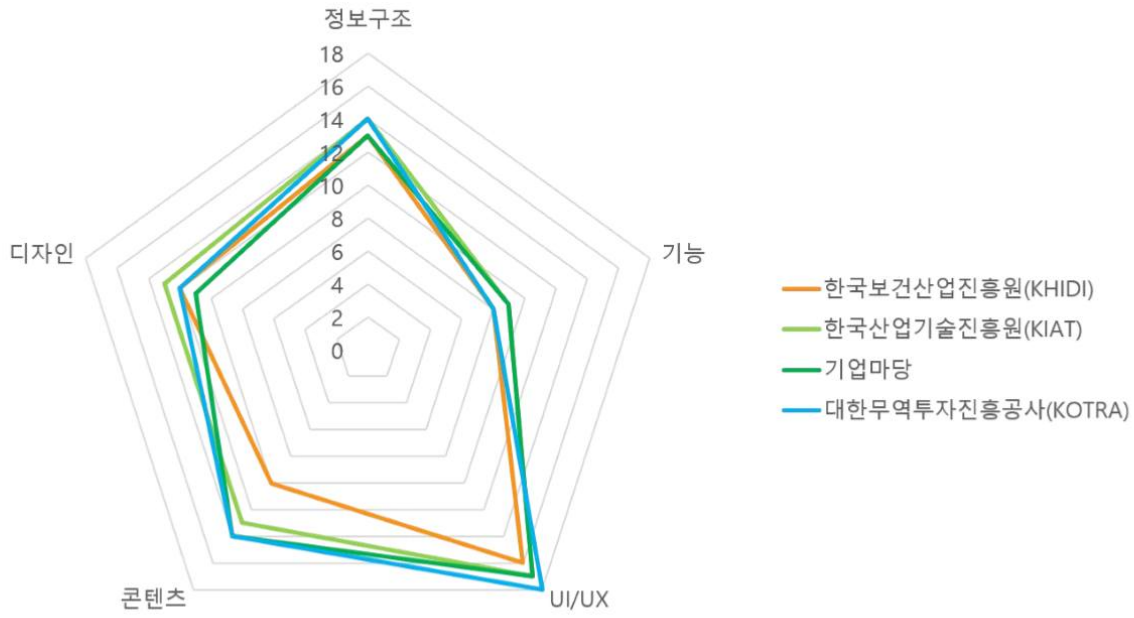

분석 기준별 종합 시사점

각 기관의 우수 사례와 개선 필요 사항을 종합하여 KHIDI 대표 홈페이지에 적용할 수 있는 개선 방향을 구체화하였다.
특히 이용 목적에 따른 정보 분류, 핵심 서비스 접근성 강화, PC-모바일 간 탐색 경로의 일관성 확보에 중점을 두었다.

정보구조	• 기관의 업무와 콘텐츠 유형을 단순히 나누기보다 사용자의 목적과 행동을 기준으로 관련 정보와 서비스를 그룹화할 필요가 있다. • 지원사업, 연구자료 등 주요 정보는 사용자가 실제로 탐색하고 비교하는 조건을 반영해 목적별, 조건별로 접근할 수 있는 구조를 제공해야 한다. • 이를 통해 기관 중심의 정보 구조에서 벗어나 사용자가 원하는 정보까지 최소한의 단계로 도달할 수 있는 구조를 만들어야 한다.
기능	• 통합 검색뿐 아니라 분야, 대상, 지역, 사업 유형 등 사용자의 탐색 조건에 맞춰 정보를 좁혀갈 수 있는 검색·필터 기능을 강화할 필요가 있다. • 또한 검색에서 끝나는 것이 아니라 조회, 비교, 신청, 문의 등 실제 사용자의 행동까지 자연스럽게 이어지는 기능 흐름을 제공해야 한다. • 주요 기능과 서비스는 홈과 메뉴에서 바로 접근할 수 있도록 진입점을 명확하게 노출할 필요가 있다.
UI/UX	• 공통 UI 요소와 사용 규칙을 일관되게 적용해 사용자의 학습 부담을 줄일 필요가 있다. • 디바이스에 관계없이 동일한 목적과 기능을 유지하면서 화면 환경에 맞게 최적화할 필요가 있다. • 세부 인터랙션과 화면 요소가 정상적으로 작동하도록 설계해 기기나 페이지에 따라 이용 경험이 달라지는 문제를 최소화할 필요가 있다.
콘텐츠	• 사업 참여와 의사결정에 필요한 신청기간, 대상, 지원내용, 신청방법, 문의처 등의 핵심 정보를 일정한 기준으로 구조화해 제공할 필요가 있다. • 게시물과 첨부 파일에 정보가 분산되지 않도록 핵심 내용은 본문에서 우선 제공하고, 상세 자료는 추가적으로 확인할 수 있도록 정보의 위계를 설계해야 한다. • 사용자가 다양한 정보 속에서 필요한 것을 빠르게 파악할 수 있도록 목적에 따른 정보 전달 방식과 가독성을 강화할 필요가 있다.
디자인	• 핵심 서비스와 콘텐츠가 먼저 인지될 수 있도록 사용자 목적과 정보 중요도에 따른 시각적 위계를 구축해야 한다. • 많은 정보와 검색 조건을 제공하더라도 한 화면 내 정보량을 조절하고 그룹화, 여백 등을 활용한 읽기 쉬운 디자인이 필요하다. • 공공기관의 전문성과 신뢰성을 유지하면서 기관의 주요 서비스와 특성을 드러낼 수 있는 차별화된 브랜드 경험을 구축해야 한다.

2-1. 사업이해도

2-1-9. 벤치마킹

벤치마킹 인사이트 3가지

1. 사용자 목적 중심의 정보 구조 재편
기관의 업무와 콘텐츠를 나열하는 구조에서 벗어나,
사용자가 KHIDI 웹사이트를 방문하는 목적을 기준으로 정보와 서비스를 재구성한다.

2. 핵심 정보 구조화를 통한 탐색 경험 개선
사업 공고의 게시물과 첨부파일에 분산된 정보를 신 청기간, 대상, 지원 내용, 신청 방법 등 사용자의 판단에 필요한 핵심 정보 중심으로 구조화해 쉽게 확인할 수 있도록 한다.

3. PC-모바일 간 일관된 이용 경험 제공
사용 기기에 따라 달라지는 메뉴와 기능, 레이아웃을 개선해 어떤 환경에서도 일관된 서비스 경험을 제공한다.

2-1. 사업이해도

2-1-10. 사용자 분석

**서비스 현황과 이용 자료를 바탕으로 주요 사용자를 5개 군으로 구분하고,
사업지원/연구/국제의료/정책/일반 정보 등 각 사용자군이 찾는 정보와 이용 목적을 구체화함**

주요 사용자와 이용 목적

핵심서비스 이행표준, 서비스 업무 유형, 2025년 업무유형별 고객 만족 수준 평가, 공지사항 및 연구보고서 페이지의 조회수 상위 게시물, 현재 자사 웹사이트에서 제공하는 서비스를 종합적으로 검토하여 주요 사용자와 이용 목적을 도출하였다. 서비스 업무 유형과 조회수 상위 게시물 목록 등 세부 선정 근거는 별첨 자료(7-1-1)를 참조한다.

주요 사용자	이용 목적	근거
[바이오헬스 기업·산업체 실무자] 제약·바이오, 의료기기, 화장품, 디지털헬스 기업, 바이오헬스 스타트업·중소기업	지원사업 공고, 참가기업 모집, 사업화·해외진출·수출 지원, 시장·산업정보, 컨설팅 정보 등을 탐색	• 핵심서비스 이행표준 • 2025 업무유형별 고객 만족 수준 평가 • 공지사항 페이지 조회수 상위 게시물 • 연구보고서 페이지 조회수 상위 게시물 • 현재 자사 웹사이트 제공 서비스
[보건의료 R&D 연구자] 대학·연구소 연구자, 병원 연구자, 산·학·연·병 전문가, R&D 기획·관리 담당자	R&D 공고, 접수·평가 정보, 연구비 관리, 교육·설명회·워크숍, 연구·통계자료 등을 탐색	• 핵심서비스 이행표준 • 서비스 업무 유형 • 2025 업무유형별 고객 만족 수준 평가 • 공지사항 페이지 조회수 상위 게시물 • 연구보고서 페이지 조회수 상위 게시물 • 현재 자사 웹사이트 제공 서비스
[의료기관·국제의료 관계자] 병원, 의료진, 외국인환자 유치기관, 의료 해외진출 기관 및 담당자	해외진출 신고, 유치기관 등록·실적보고, 국제의료 정책·법규, 설명회·행사, 해외시장·실적자료 등을 탐색	• 핵심서비스 이행표준 • 2025 업무유형별 고객 만족 수준 평가 • 공지사항 페이지 조회수 상위 게시물 • 연구보고서 페이지 조회수 상위 게시물 • 현재 자사 웹사이트 제공 서비스
[정부·공공기관·정책 담당자] 중앙·지방정부, 공공기관, 유관단체, 정책연구자, 정책·제도 담당자	산업통계, 정책동향, 정책분석, 정부 공고, 공공데이터, 국제협력 자료 등을 탐색	• 핵심서비스 이행표준 • 서비스 업무 유형 • 2025 업무유형별 고객 만족 수준 평가 • 공지사항 페이지 조회수 상위 게시물 • 연구보고서 페이지 조회수 상위 게시물 • 현재 자사 웹사이트 제공 서비스
[일반 정보 이용자·구직자·공공 참여자] 취업준비생, 이직 준비자, 학생, 일반 국민, 공모·정책 참여자	채용정보, 교육·행사, 공모전, 조사·의견수렴, 산업동향·통계, 공공정보, 후원승인 등을 탐색	• 핵심서비스 이행표준 • 2025 업무유형별 고객 만족 수준 평가 • 공지사항 페이지 조회수 상위 게시물 • 현재 자사 웹사이트 제공 서비스

2-1. 사업이해도

2-1-10. 사용자 분석

**PC·모바일의 바로가기 구성이 달라 같은 정보를 다시 찾아야 하며,
모바일에서는 게시물의 날짜·작성기관과 행사의 일정·장소를 한눈에 확인하기 어려울 것으로 예상됨**

사용자가 겪는 문제

아래 사용자별 문제는 웹사이트 이용 과정에서 발생할 것으로 예상되는 어려움을 정리한 것으로, 실제 사용자 검증을 거치지 않은 가설이다. 향후 사업 착수 후 주요 사용자군을 대상으로 사용성 테스트를 실시하여 문제의 실제 발생 여부와 이용에 미치는 영향을 검증하고, 그 결과를 바탕으로 개선 방향과 우선순위를 구체화할 예정이다.

주요 사용자	사용자가 겪는 문제 (추정)
[바이오헬스 기업·산업체 실무자] 제약·바이오, 의료기기, 화장품, 디지털헬스 기업, 바이오헬스 스타트업·중소기업	지원사업과 시장정보를 탐색하는 과정에서 PC와 모바일의 정보 접근 경로가 달라지고, 게시물 비교가 어려움. PC에서는 플로팅 영역을 통해 자료실·뉴스클리핑·정보공개 등에 바로 접근할 수 있지만 모바일에서는 동일한 단축경로가 없어 다시 메뉴를 탐색해야 함. 반대로 모바일 '바로이동'에는 보건산업통계가 제공되지만 PC에서는 같은 위치에서 접근할 수 없어 기기마다 탐색 방법이 달라짐. 또한 모바일 게시판에서 날짜·작성자 등을 확인하려면 가로스크롤이 필요하고, 카테고리 '+' 버튼이 텍스트와 겹쳐 추가 콘텐츠 탐색도 어려움.
[보건의료 R&D 연구자] 대학·연구소 연구자, 병원 연구자, 산·학·연·병 전문가, R&D 기획·관리 담당자	연구·통계자료와 R&D 정보를 반복적으로 탐색할 때 빠른 재접근과 자료 비교가 어려움. PC에서는 플로팅 영역의 자료실·뉴스클리핑을 통해 최신 자료로 바로 이동할 수 있지만 모바일에서는 해당 단축경로가 사라짐. 반면 모바일에서는 '바로이동'의 보건산업통계로 직접 이동할 수 있으나 PC에서는 같은 위치에 해당 메뉴가 없어 기기별 탐색 방식이 달라짐. 게시판에서도 연구공고의 제목, 작성기관, 등록일 등을 한 화면에서 비교하기 어려워 가로스크롤을 반복해야 함.
[의료기관·국제의료 관계자] 병원, 의료진, 외국인환자 유치기관, 의료 해외진출 기관 및 담당자	국제의료 관련 공고·행사를 모바일에서 탐색하고 정보를 검증하는 과정에서 가독성과 정보 관계 파악이 어려움. 외국인환자·해외진출 관련 게시물을 모바일에서 볼 때 게시일과 상세정보를 함께 비교하기 어렵고, 카테고리 진입 버튼의 식별성도 떨어짐. 언어 선택 기능 역시 현재 상태와 전환 가능 언어를 직관적으로 이해하기 어려울 수 있음. 특히 후원승인 페이지는 모바일에서 행사명·주최기관·기간·장소가 지나치게 세로로 분절되어, 어떤 행사가 누가 주최하고 언제 열리는지 한눈에 연결해서 파악하기 어려움.
[정부·공공기관·정책 담당자] 중앙·지방정부, 공공기관, 유관단체, 정책연구자, 정책·제도 담당자	공공자료·통계·기관정보에 접근하는 단축경로가 모바일에서 사라지고, PC와 모바일의 통계 접근 방식이 달라 반복적인 정보 탐색이 비효율적임. PC 플로팅 영역에서는 조직도·경영공시·정보공개·자료실·뉴스클리핑으로 바로 이동할 수 있지만 모바일에서는 이러한 바로가기가 제공되지 않아 전체 메뉴에서 다시 찾아야 함. 반대로 국민영양통계·보건산업통계는 모바일 '바로이동'에서 제공되지만 PC의 동일 메뉴에서는 접근할 수 없어 기기 간 일관성이 떨어짐. 정책·통계 게시물을 비교할 때도 모바일 게시판의 가로스크롤이 탐색 효율을 낮춤.
[일반 정보 이용자·구직자·공공 참여자] 취업준비생, 이직 준비자, 학생, 일반 국민, 공모·정책 참여자	사이트 구조에 익숙하지 않은 상태에서 모바일로 채용·행사·공모 정보를 찾고 검증하기가 어려움. 채용공고 등의 날짜와 상세정보를 보기 위해 게시판을 좌우로 이동해야 하며, 같은 '바로이동' 메뉴의 항목이 PC와 모바일에서 달라 탐색 구조를 예측하기 어려움. 카테고리 '+' 버튼 겹침도 추가 정보 탐색을 방해함. 행사 신뢰성을 확인하기 위해 후원승인 페이지를 방문하더라도 모바일에서는 행사명이 한두 글자씩 줄바꿈되고 일정·기관 정보가 분리되어 내용을 빠르게 확인하기 어려움.

2-1. 사업이해도

2-1-11. 요구사항 분석 및 대응표

본 제안에서는 RFP의 전체 요구사항을 검토하고 분야별 대응 방향과 협력 방안을 수립하며, 실제 수행은 사용자 중심의 정보구조 재설계 및 UI/UX 개선을 집중 과업으로 설정한다. 제안사는 사용자 중심의 정보 구조 재설계 및 KRDS 기반 UI/UX 개선을 핵심 수행 영역으로 설정한다. 진흥원 WI 정립, 실제 시스템 구축과 성능/장비/데이터/보안 등 전문 기술이 요구되는 분야는 사내 가상의 전문 인력이 수행하는 것으로 가정하며, 구체적인 기술 구현 방법과 세부 운영 계획은 본 제안의 중점 수행 범위로 다루지 않는다.

기능 요구사항 (SFR)

요구사항 ID	요구 내용	대응 방안	본문 위치
SFR-001	기관 정체성과 최신 웹 트렌드를 반영한 일관된 디자인 체계를 수립하고, 접근성/확장성/외부 연계성을 갖춘 홈페이지를 구축해야 함.	KRDS를 기준으로 UI 요소와 정보 표현 체계를 정비하고, 중요도에 따라 콘텐츠의 위계와 배치를 재설계함. '진흥원의 정체성을 반영한 디자인 적용'은 운영 중인 결과물을 유지함.	2-4 (p.36) 3-1-2 (p.48~52)
SFR-002	현행 홈페이지와 타 기관 사례, 이용 통계 등을 분석하여 메뉴/콘텐츠/디자인 개선안을 수립하고 PC, 모바일 화면 구성안을 제시해야 한다.	현황 분석, 벤치마킹, 사용자 분석을 통해 정보구조 및 UI/UX 개선안을 도출하고 핵심 화면을 설계함. 'PC/모바일용 디자인 구성도 3종 이상 제시'는 추진 일정에 표시함.	2-1-8~2-1-10 (p.12~21) 2-5 (p.37) 3-1-2 (p.48~52)
SFR-003	사용자가 필요한 정보를 빠르게 찾도록 메뉴를 재분류/통폐합하고, 주요 메뉴의 접근성과 향후 확장성을 확보해야 한다.	이용 목적별 메뉴 체계를 재구성하고, 주요 서비스에 접근할 수 있는 Quick Menu를 설계함.	3-1-1 (p.38~47) 3-1-3 (p.53)
SFR-004	영문 홈페이지를 국문과 일관되게 개편하고, 외국인에게 필요한 콘텐츠를 선별/번역하여 제공해야 한다.	사내의 가상 영문 기획자, 전문 번역 담당자, 원어민 검수 담장자가 정보 구조 경량화 및 화면을 설계함.	2-3 (p.35) 2-5 (p.37) 4-3 (p.62)
SFR-005	국/영문 홈페이지를 반응형 웹으로 구현하고, 기기별 동일한 콘텐츠와 일관된 디자인을 제공하며 기존 CMS와 연동해야 한다.	PC/모바일 간 메뉴와 기능의 접근 경로를 통일하고, 기기별 최적화된 반응형 화면을 설계함. 사내의 가상 화면 개발 담당자와 기능 연계/개발 담당자가 HTML, CSS, JavaScript 등 표준 웹 기술을 활용해 PC와 모바일에 대응하는 반응형 웹을 구현하고, CMS 연결을 담당함.	3-1-1 (p.38~47) 3-1-2 (p.48~52)
SFR-006	관세피해신고의 등록/수정/삭제, 본인인증, 관리자 처리 및 상태별 알림 기능을 개발해야 한다.	사내의 가상 기능/연계 개발 담당자가 신고·관리자·본인확인, 문서보기, 알림 기능을 개발함.	2-3 (p.35) 3-3 (p.55) 4-3 (p.62)
SFR-007	네이버/카카오/구글 등 소셜계정을 활용한 간편 회원가입 및 로그인 기능을 구현해야 한다.	사내의 가상 기능/연계 개발 담당자가 SNS 회원가입 및 로그인 기능을 개발함.	2-3 (p.35) 3-2 (p.54) 4-3 (p.62)

2-1. 사업이해도

2-1-11. 요구사항 분석 및 대응표

성능 요구사항 (PER)

요구사항 ID	요구 내용	대응 방안	본문 위치
PER-001	시스템 성능과 안정적 운영을 위한 관리 방안을 마련하고, 성능 저하를 사전에 감지 및 조치해야 한다.	사내의 가상 서버/성능 담당자가 로그와 성능 점검 도구로 개발 중 주요 지표를 확인하고, 개발 담당자와 성능 저하 원인을 개선한 후 운영에 반영함.	4-1 (p.59) 4-4 (p.63)
PER-002	웹페이지를 요청 후 3초 이내 표시하고, 처리 시간이 긴 작업은 사용자에게 사전 안내해야 한다.	사내의 가상 화면 개발 담당자가 이미지/스크립트와 반복 요청 처리를 최적화하고, QA 담당자가 RFP의 적용 조건에서 요청 후 3초 이내 화면 표시 여부를 검증함. 시간이 오래 걸리는 작업은 시작 시 사용자에게 안내함.	4-1 (p.59)
PER-003	테스트 및 시험운영 시 CPU 사용률을 측정하고, 평균 사용률이 70%를 초과하지 않도록 해야 한다.	사내의 가상 서버/성능 담당자가 시험 및 시험운영 중 서비스 가용시간과 최대 부하 상황의 CPU 사용률을 측정하고, 평균 사용률 70% 이하 여부를 확인함.	4-1 (p.59) 6-2 (p.71)
PER-004	서비스 운영 및 최대 부하 상황에서 자원 사용률을 측정하고, 평균 메모리 사용률을 75% 이하로 유지해야 한다.	사내의 가상 서버/성능 담당자가 메모리 및 디스크 사용량을 측정하고, 최근 3년 최대 부하 사용량의 2배 조건을 포함하여 메모리 평균 사용률 75% 이하 여부를 검증함.	4-1 (p.59) 6-2 (p.71)

2-1. 사업이해도

2-1-11. 요구사항 분석 및 대응표

시스템 장비 요구사항 (ECR)

요구사항 ID	요구 내용	대응 방안	본문 위치
ECR-001	기존 클라우드 서버/OS와 호환성을 확보하고 및 기능 개발로 인한 성능 저하를 방지해야 한다.	사내의 가상 서버/성능 담당자가 기존 클라우드 서버·운영체제와의 호환성을 확인하고, 기능 추가 전후 성능을 비교하여 기존 서비스 운영에 영향을 주지 않도록 점검함.	2-3 (p.35) 5-4 (p.67)
ECR-002	현재 운영중인 서버와 동일한 개발/테스트 환경을 구축해야 한다.	KHIDI 승인 후 운영환경 정보를 확인하고, 사내의 가상 서버/성능 담당자가 운영환경과 동일한 개발 및 시험환경을 구성함. 시험을 완료한 결과물은 KHIDI 승인 후 운영 서버에 반영함. 기존 서버 설정을 활용해 분리된 테스트 환경을 구성함.	5-4 (p.67)

인터페이스 요구사항 (INR)

요구사항 ID	요구 내용	대응 방안	본문 위치
INR-001	웹 표준, 웹 접근성, 범정부 UI/UX 가이드를 준수해야 한다.	국문/영문 기획 담당자와 디자이너가 KRDS 및 웹 접근성 기준을 설계에 반영하고, 화면 개발 담당자가 구현한 후 QA 담당자가 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2와 웹 표준 준수 여부를 검증함.	2-4 (p.36) 4-3 (p.62)
INR-002	주요 브라우저 및 디바이스 간 호환성을 확보해야 한다.	사내의 가상 디자이너와 화면 개발 담당자가 기기별 화면 배치 기준을 정하고, QA 담당자가 주요 브라우저와 PC/모바일에서 화면/기능/이동 경로의 호환성을 확인함.	3-1-2 (p.48~52) 4-3 (p.62)
INR-003	파일 업로드, 저장, 열람 및 Excel 다운로드를 제공해야 한다.	사내의 가상 기능/연계 개발 담당자가 기존 CMS의 파일 관리 기능을 확인해 문서 업로드/저장/열람과 Excel 내려받기를 구현함. 파일 용량 제한은 구축 시 확정하고, 신고 첨부파일의 문서 바로보기와 CSV 내려받기도 함께 검증함.	4-3 (p.62)
INR-004	삭제, 입력정보 완료 혹은 미완료 후 저장 등과 같이 사용자의 수행 활동에 대한 확인 메시지를 제공해야 한다.	국문/영문 기획 담당자가 입력/저장/삭제/오류 상황의 안내 내용을 정리하고, 디자이너와 개발 담당자가 확인 메시지와 입력값 검증 및 오류 안내 및 필요한 자동수정 기능을 구현함.	4-3 (p.62)
INR-005	자주 사용하는 업무의 접근성 및 진행 상태와 결과를 직관적으로 표시해야 한다.	백귀리, 김아현은 국문 이용 목적별 메뉴와 빠른 이동 경로를 기획하고, 영문 기획자는 외국인 이용 목적에 맞는 경로를 구성함. 개발 담당자는 진행 상태 및 처리 결과, 날짜 직접 입력 및 달력 선택 기능을 구현함.	3-1-1 (p.38~47) 3-1-2 (p.48~52)

2-1. 사업이해도

2-1-11. 요구사항 분석 및 대응표

데이터 요구사항 (DAR)

요구사항 ID	요구 내용	대응 방안	본문 위치
DAR-001	데이터 용어/도메인/코드 표준 수립 및 상위표준을 준수해야 한다.	사내의 가상 DB 담당자가 기존 용어, 코드, 데이터 형식과 상위 표준을 확인하고, 신고 및 인증 등 신규/변경 항목을 포함한 데이터 표준을 정리함.	3-3 (p.55)
DAR-002	업무 변화에 대응할 개념/논리/물리 데이터 구조를 설계해야 한다.	사내의 가상 DB 담당자가 기존 구조와 신규 기능의 관계를 분석해 개념, 논리, 물리 데이터 구조를 설계함. 활용 가능한 기존 구조를 유지하면서 필요한 변경 및 추가 사항을 반영함.	3-3 (p.55)
DAR-003	데이터 모델의 정규화/중복/정합성을 검증해야 한다.	사내의 가상 DB 담당자가 데이터 구조의 중복, 관계, 일관성을 검토하고, 기능/연계 개발 담당자와 실제 처리 흐름을 대조하여 검증 결과를 기록함.	3-3 (p.55)
DAR-004	데이터 값 정확성 검증 및 오류 데이터를 정비해야 한다.	사내의 가상 DB 담당자가 필수값 누락/형식 오류/중복 등 점검 규칙을 정하고 검증을 수행함. 발견한 오류는 KHIDI 업무 담당자와 정정 범위를 확인한 후 조치함.	3-3 (p.55)
DAR-005	데이터 이관 계획/백업/복구 및 전후 정합성을 검증해야 한다.	사내의 가상 DB 담당자가 이관 대상, 순서, 변환 규칙과 백업 및 복구 계획을 수립함. 시험 이관과 이관 전후 건수, 주요 값 비교를 통해 누락과 불일치를 확인함.	3-3 (p.55) 6-6 (p.75)
DAR-006	메타데이터 현행화 및 개방 데이터 서비스 연속성을 확보해야 한다.	사내의 가상 DB 담당자가 변경 및 추가 데이터의 관리정보를 갱신하고, 기관 및 중앙 메타데이터 관리체계의 현행화를 지원함. 기존 개방데이터와 신규 데이터의 개방 대상 여부를 확인하여 서비스 연속성을 확보함.	3-3 (p.55)

2-1. 사업이해도

2-1-11. 요구사항 분석 및 대응표

테스트 요구사항 (TER)

요구사항 ID	요구 내용	대응 방안	본문 위치
TER-001	테스트 단계별 수행 절차, 담당 조직, 점검 기준, 일정 및 결함 보완 방안을 포함한 시험계획을 수립해야 한다.	사내의 가상 QA 담당자가 단계별 시험방법, 담당자, 일정, 판정 기준, 보완 절차를 포함한 시험계획을 수립함. 백귀리, 김아현은 국문 홈페이지 사용성 검증을, 영문 기획 담당자는 영문 홈페이지의 이용 흐름 검토를 담당함.	4-4 (p.63)
TER-002	시험계획에 따라 테스트를 실시하고, 결과를 기록 및제출하며 미통과 항목을 보완하여 요구사항 충족 여부를 검증해야 한다.	사내의 가상 QA 담당자가 요구사항별 시험 결과와 오류를 기록하고, 각 개발 담당자가 수정한 후 재시험함. 결과는 KHIDI에 제출하여 승인을 받고, 미통과 항목은 보완 일정에 따라 시험을 완료함.	4-4 (p.63)
TER-003	단위/통합/시스템/성능시험을 수행하고, 시험운영 결과를 반영하여 시스템을 안정화해야 한다.	사내의 가상 개발, QA, 서버/성능 담당자가 단위/통합/시스템/성능시험과 시험운영을 수행함. 운영 중 발견한 문제를 지속적으로 반영하고, 인계 후 안정화를 위한 담당자와 대응 절차를 마련함.	4-4 (p.63) 6-2 (p.71)

2-1. 사업이해도

2-1-11. 요구사항 분석 및 대응표

보안 요구사항 (SER)

요구사항 ID	요구 내용	대응 방안	본문 위치
SER-001	기관 보안정책 준수 및 사업 보안 대책을 수립 및 이행해야 한다.	사내의 가상 보안/개인정보 담당자가 KHIDI 보안정책과 보안성 검토 내용을 반영한 보안관리계획을 수립하고, 총괄 PM이 분야별 이행 여부를 관리함.	3-2 (p.54)
SER-002	인력, 문서, 장비에 대한 정보보호 관리체계를 운영해야 한다.	사내의 가상 총괄 PM이 전체 참여인력의 보안서약과 보안 교육을 관리하고, 보안/개인정보 담당자가 인력/문서/장비의 접근 및 반출입 절차를 점검함.	3-2 (p.54) 6-5 (p.74)
SER-003	시큐어코딩 적용 및 웹 보안 취약점을 진단하고 제거해야 한다.	사내의 가상 개발 담당자가 안전한 코드 작성 기준을 적용하고, 보안/개인정보 담당자가 소스코드와 웹 취약점을 점검함. 발견한 취약점은 개발 담당자가 수정한 후 재점검함.	3-2 (p.54)
SER-004	사용자 역할 및 등급별 접근권한을 설정 및 관리해야 한다.	사내의 가상 기능/연계 개발 담당자가 내/외부 사용자와 관리자 역할을 구분해 조회/처리 권한 및 접속권한 관리화면을 구현하고, 보안/개인정보 담당자가 권한 적정성을 확인함.	3-2 (p.54)
SER-005	DB 관리자/사용자별 권한 구분 및 DB의 접근을 통제해야 한다.	사내의 가상 데이터베이스 담당자가 기존 DB 접근통제 정책을 확인하고, 계정별 최소 권한을 설정함.	3-2 (p.54)
SER-006	애플리케이션/DB 인증 및 개인정보를 암호화해야 한다.	사내의 가상 기능/연계 개발, DB 담당자가 RFP의 인증 개인정보 암호화 기준을 적용함. 인증정보를 소스코드에 직접 기록하지 않고, 관리자 화면에도 개인정보가 그대로 노출되지 않도록 처리함.	3-2 (p.54)
SER-007	저장매체, 문서, 장비 반출통제 및 유출을 방지해야 한다.	사내의 가상 보안/개인정보 담당자가 자료, 저장매체, 장비의 반출입과 삭제 이력을 관리하고, 승인되지 않은 복사, 외부 전송 및 반출을 통제함.	3-2 (p.54) 6-5 (p.74)
SER-008	접속/수정/삭제 로그 보관, 주간 분석 및 위변조를 방지해야 한다.	기능/연계 개발 담당자가 접속/수정/삭제 기록과 로그관리 화면을 구현함. 서버/성능 담당자는 시범운영 이후 로그를 최소 1년 이상 백업/유지하고, 보안/개인정보 담당자는 주 1회 이상 분석함.	3-2 (p.54)
SER-009	개인정보 취급시 표준 개인정보처리 위탁관리에 대한 정의를 명시해야 한다.	총괄 PM과 보안/개인정보 담당자가 KHIDI와 제안사 간 개인정보 처리 위탁 범위와 계약 내용을 관리함. 개인정보 처리 업무를 재위탁하지 않고, 승인된 사내 담당자만 업무 목적 범위에서 처리함.	3-2 (p.54)
SER-010	사업 종료 후 자료 반납/삭제/폐기 및 증빙해야 한다.	사업 종료 시 제공자료와 산출물을 KHIDI에 반납하고, 사내 장비외 저장매체의 관련 자료를 지침에 따라 삭제함. 삭제 증빙과 대표자 명의 확약서를 제출함.	3-2 (p.54) 6-5 (p.74)
SER-011	시스템 정보/개인정보 등 누출을 금지한다.	시스템 구성, 계정, 취약점 결과, 개인정보 등 누출금지정보를 구분하고, 담당 업무에 따른 접근 제한과 자료 반출 승인 절차를 적용함.	3-2 (p.54) 6-5 (p.74)
SER-012	개인정보 수집 최소화 및 보호조치를 적용한다.	기능/연계 개발, DB 담당자가 개인정보 수집을 최소화하고, 암호화 및 안전한 전송, 접근통제, 기록관리 기능을 구현함. 보안/개인정보 담당자가 RFP의 세부 보호조치 준수 여부를 검증함.	3-2 (p.54)

2-1. 사업이해도

2-1-11. 요구사항 분석 및 대응표

품질 요구사항 (QUR)

요구사항 ID	요구 내용	대응 방안	본문 위치
QUR-001	요구 기능 구현 및 기능별 정상 작동을 검증한다.	QA 담당자가 승인된 최종 요구사항과 시험항목을 연결하여 전체 기능을 검증함. 적용 가능한 자동검증과 사용자 확인시험을 통해 예상 결과와 실제 결과의 일치 여부를 확인함.	4-2 (p.61) 6-1 (p.70)
QUR-002	시스템 간 데이터 교환 정확성 및 정합성을 확보해야 한다.	기능/연계 개발/DB 담당자가 CMS/인증/알림 등 연계 구간의 송수신 값과 처리 결과를 확인하고, QA 담당자가 누락/중복·불일치 여부를 검증함.	4-2 (p.61) 4-3 (p.62)
QUR-003	시스템 신뢰성, 모든 이용 채널의 일관성을 확보해야 한다.	화면 개발 담당자가 PC/모바일에서 동일한 서비스의 자료와 처리 결과가 일치하도록 구현함. QA와 보안/개인정보 담당자가 채널 간 일관성 및 접근통제를 확인함.	4-2 (p.61)
QUR-004	시험운영 결함 관리 및 시스템 가용성을 확보해야 한다.	QA 담당자가 결함을 추적하고, 시스템 엔지니어가 운영환경의 안정성과 장애 대응체계를 검증함.	4-2 (p.61) 6-2 (p.71)
QUR-005	사용자 및 관리자용 사용 및 운영 매뉴얼 제공	국문/영문 기획 담당자가 화면 이용방법을 정리하고, 개발/서버 담당자가 설치/설정/연계/로그/운영 절차를 작성함. QA 담당자가 매뉴얼에 따른 설치/제거의 1시간 이내 완료 여부를 확인함.	4-2 (p.61) 6-3 (p.72)
QUR-006	단계별 산출물 작성/제출 및 이력 관리	일정 계획에 단계별 산출물을 표시하고 총괄 PM이 산출물별 작성자/검토자/제출기한/버전을 관리함. QA 담당자가 요구사항 반영과 보완 완료 여부를 확인한 후 제출함.	2-5 (p.37) 5-3 (p.66)

2-1. 사업이해도

2-1-11. 요구사항 분석 및 대응표

제약사항 (COR)

요구사항 ID	요구 내용	대응 방안	본문 위치
COR-001	개발 및 방법론 표준안을 제시하고 승인된 내용을 준수하며, 주관기관에서 제시하는 표준안을 수용하여 구축을 추진한다.	총괄 PM이 기획, 디자인, 개발, 데이터의 작업 기준을 통합하고, 개발 담당자가 기존 시스템과 호환되는 개발방법과 기술 표준을 제시하여 KHIDI 승인 후 적용함.	2-5 (p.37) 3-4 (p.56)
COR-002	코드/SQL/성능/위험요인에 대한 품질점검을 실시해야 한다.	개발, DB, QA 담당자가 코드 및 데이터 처리/통합 동작을 점검하고, 서버/성능·보안 담당자가 성능 저하와 보안 위험을 분석하여 조치 결과를 관리함.	3-4 (p.56)
COR-003	웹 표준/접근성/크로스브라우징 관련 기준을 준수해야 한다.	기획, 디자인 담당자가 접근성과 호환성을 설계에 반영하고, 화면 개발, QA 담당자가 웹 표준 문법검사, 주요 브라우저 동작 및 접근성 기준 준수 여부를 검증함.	3-4 (p.56) 4-3 (p.62)
COR-004	코딩 가이드에 맞춘 소스코드 작성/제공 및 취약점에 관해 조치해야 한다.	개발 담당자가 주석, 명명 규칙을 포함한 코드 작성 기준과 변경 이력을 관리함. 보안 점검 결과를 반영하고, 개발 소스코드와 관련 설명자료를 KHIDI에 제공함.	3-4 (p.56)
COR-005	IRM 및 SW사업정보 저장소 데이터를 등록, 제출해야 한다.	총괄 PM이 정보자원 및 SW사업정보 제출을 관리함. 기능점수 산정 역량을 보유한 것으로 가정한 기능/연계 개발 담당자가 기능점수 데이터를 작성하고, 관련 인력이 분야별 자료를 보완함.	3-4 (p.56)
COR-006	기능별 활용 로그 수집 및 업무수행 영향도를 측정해야 한다.	기능/연계 개발 담당자가 화면별 이용기록 수집을 구현하고, 기획 담당자가 주요 기능의 활용과 탐색 개선 결과를 분석함. 운영 성과 측정을 위한 수집 기준과 자료 인계방안을 마련함.	3-4 (p.56) 6-7 (p.76)
COR-007	웹사이트 개발 관련 법령, 규정, 표준을 준수해야 한다.	총괄 PM이 RFP의 준수 기준 목록을 관리하고, 기획/디자인/개발/DB·보안 담당자가 분야별 준수 여부와 이미지 및 글꼴 등의 사용권을 확인함.	3-4 (p.56)

2-1. 사업이해도

2-1-11. 요구사항 분석 및 대응표

프로젝트 관리 요구사항 (PMR)

요구사항 ID	요구 내용	대응 방안	본문 위치
PMR-001	계약 후 10일 이내에 수행 일정, 업무 범위, 인력 운영, 보고 및 보안 관리 방안을 포함한 사업수행계획서를 제출해야 한다.	총괄 PM이 계약일로부터 10일 이내에 일정/업무/역할/보고/보안관리 내용을 포함한 사업수행계획서를 제출함. 인력 변경은 RFP의 사전 승인 절차에 따라 관리함.	5-1 (p.64) 5-3 (p.66)
PMR-002	요구사항 추적표를 작성하여 이행 현황을 관리하고, 사업 진행 점검 및 시정 요구에 대응해야 한다.	총괄 PM이 요구사항별 담당자, 설계자료, 구현 결과, 시험 결과를 연결한 추적표를 관리하고, KHIDI 점검 및 시정 요구의 반영 여부를 확인함.	5-1 (p.64)
PMR-003	사업 중 취득한 정보의 기밀을 유지하고, 보안각서 제출 및 시스템 관련 자료의 유출 방지 대책을 마련해야 한다.	전체 참여인력이 보안각서를 제출하고, 총괄 PM과 보안/개인정보 담당자가 자료, 소스코드, 장비의 접근 및 유출 방지 절차를 관리함.	6-5 (p.74)
PMR-004	개발/시험/사업관리에 필요한 환경과 장비를 확보하고, 단계별 개발 방법론 및 표준/변경/문서 관리 방안을 제시해야 한다.	제안사가 개발, 시험, 사업관리에 필요한 장비와 소프트웨어를 준비함. 총괄 PM이 단계별 수행방법, 문서, 변경관리 기준을 정하고 각 담당자가 적용함.	5-4 (p.67)
PMR-005	기술적용계획표의 표준을 준수하고, 기술 준수 결과를 제출하며 기술 변경 시 발주기관의 승인을 받아야 한다.	개발 담당자가 기술적용계획표에 따라 기술을 선정·적용하고, 총괄 PM이 검사 전 기술 준수 결과표를 제출함. 기술 변경은 KHIDI 승인 후 반영함.	2-3 (p.35) 3-4 (p.56)
PMR-006	시스템의 유지보수와 확장성을 고려해 개발/UI/데이터 표준 및 명명 규칙을 수립하고 적용해야 한다.	기획, 디자인 담당자가 메뉴/용어/화면 기준을, 개발, DB 담당자가 코드/프로그램/데이터 명명 및 관리 기준을 수립하여 적용함.	2-4 (p.36) 3-4 (p.56)
PMR-007	품질보증의 범위, 담당 조직, 수행 절차 및 점검 방법을 포함한 품질 관리 방안을 수립해야 한다.	QA 담당자가 품질보증 범위, 조직, 절차, 점검방법을 정리하고, 각 담당자의 검토 결과와 개선 이력을 통합 관리함.	6-1 (p.70)
PMR-008	보안, 일정 지연, 품질 저하, 장비 변경에 따른 예산 초과 등 위험요인을 사전에 분석하고 대응 및 변경관리 방안을 마련해야 한다.	총괄 PM이 일정, 예산, 품질, 보안, 환경 변경 위험을 관리하고, 각 담당자가 영향과 대응방안을 보고함. 변경 필요 시 KHIDI와 협의하여 승인 결과를 일정과 산출물에 반영함.	5-1 (p.64) 6-6 (p.75)

2-1. 사업이해도

2-1-11. 요구사항 분석 및 대응표

프로젝트 지원 요구사항 (PSR)

요구사항 ID	요구 내용	대응 방안	본문 위치
PSR-001	기존 서비스 중단을 최소화하고, 안정적인 시스템 전환 및 시험운영을 지원해야 한다.	개발, 서버/성능 담당자가 배포 순서/확인 항목/원상복구 계획을 수립함. 기존 유지관리 업체와 운영 조건을 확인하고, 인수시험과 KHIDI 승인 후 기존 업무의 중단 없이 전환하도록 수행함.	4-4 (p.63) 6-2 (p.71)
PSR-002	장애 발생에 대비한 대응 절차를 수립하고, 데이터 백업 및 복구 체계를 마련해야 한다.	서버/성능 담당자가 장애 유형별 대응과 백업 및 복구 절차를 마련하고 복구시험을 실시함. 기존 유지관리 업체와 연락체계를 유지하며 장애와 조치 이력을 관리함.	6-6 (p.75)
PSR-003	사용자와 관리자가 시스템을 원활하게 이용/운영할 수 있도록 기능별 사용 방법과 시스템 관리 절차를 문서화해야 한다.	국문/영문 홈페이지 기획 담당자는 화면 이용방법을, 개발, 서버 담당자는 시스템 설정/연계/로그/운영방법을 작성하여 사용자/관리자 매뉴얼로 제공함.	6-3 (p.72)
PSR-004	운영 담당자가 시스템 운영/감시/백업/복구 업무를 수행할 수 있도록 교육계획을 수립하고 실무교육을 제공해야 한다.	총괄 PM이 교육 일정을 조정하고, 개발, 서버 담당자가 KHIDI 운영 담당자에게 기능 사용/시스템 감시/백업/비상복구 실무교육을 실시함.	6-3 (p.72)
PSR-005	시스템의 안정적인 유지보수와 향후 확장을 위해 기술이전 계획을 수립하고 필요한 기술지원을 제공해야 한다.	개발, 서버, DB 담당자가 소스코드/설계서/환경설정/운영자료를 정리하여 KHIDI와 기존 유지관리 업체에 인계하고, 운영 및 기능 보완에 필요한 기술지원을 제공함.	6-4 (p.73) 6-7 (p.76)

2-2. 추진 전략

PC, 모바일 직접 비교와 사용자 분석을 근거로, 이용 목적별 퀵 메뉴를 구성하고 모바일 화면에 최적화된 게시글 목록을 재설계 전략을 추진함

핵심 제안

이용자는 필요한 정보를 찾으려 메뉴를 헤매고, 모바일에서는 잘린 내용을 확인하기 위해 화면을 움직입니다.
저희는 이용 목적별 메뉴와 한눈에 읽히는 모바일 화면을 설계해 이용자의 탐색 부담을 줄이고, KHIDI의 주요 서비스에 쉽게 접근하도록 합니다.

제안 근거

1. RFP 요구사항에 따른 반응형 웹 개선 필요
- 관찰: 모바일 및 다양한 디바이스에 최적화된 화면 구성과 일관된 디자인 제공을 요구함. (근거: RFP 'SFR-005')
- 인사이트: 현재 PC와 모바일 간 화면 구성 및 정보 제공 방식에 차이가 있어 개선 필요성이 확인됨.
- 개선 방향: 기기별 화면 구성과 이용 경험을 비교/분석하고, 일관된 서비스 이용이 가능한 반응형 웹으로 개선

2. 기기별 서비스 접근 경로의 불일치
- 관찰: PC와 모바일에서 플로팅 버튼 존재 여부 및 '바로이동' 메뉴의 구성과 접근 경로가 다름. (근거: 2-1-8)
- 인사이트: 동일한 서비스를 이용하더라도 기기에 따라 접근 방식이 달라 사용자에게 혼란을 줄 수 있음.
- 개선 필요성: 기기와 관계없이 일관된 서비스 접근 경로 제공

3. 모바일 환경에 최적화되지 않은 정보 제공 방식
- 관찰: PC 중심의 화면 구성으로 인해 모바일에서는 일부 정보를 확인하기 어려움. (근거: 2-1-8)
- 인사이트: 게시글 목록 등에서 가로 스크롤이 필요하며, 기기에 따라 정보의 가독성과 접근 편의성에 차이가 발생함.
- 개선 필요성: 모바일 화면에 적합한 정보 배치 및 가독성 개선

우리 제안의 차별화 요소

구분	다른 팀도 할 수 있는 것	우리만 하는 것
반응형 웹	반응형 웹 설계	KHIDI 웹사이트를 PC와 모바일로 직접 사용하고 대조해 두 기기 간 차이점과 불편을 확인해 개선안을 도출함. (2-1-8)
사용자 분석	로그데이터를 활용한 착수 후의 계획 세우기	현재 사이트에서 확인 가능한 데이터(KHIDI 제공 서비스, 게시글 유형별 조회수)를 바탕으로 사용자 분석 (2-1-10)
메뉴 구조 개편	콘텐츠 유형과 분류에 따라 메뉴 재그룹핑, 통폐합	벤치마킹에서 확인한 우수사의 이용 목적별 진입점 설계 방식을 참고하여, 사용자 분석으로 도출한 KHIDI의 주요 이용 목적에 따라 메뉴 구조를 개편함. (2-1-9, 2-1-10)

2-2. 추진 전략

세부 추진 전략

본 세부 추진 전략의 '혜택'은 설계에 따른 기대효과이며, 실제 계약 후 기존/개선 화면의 클릭 수, 수행 시간, 성공률을 비교하여 검증할 계획임. (p.57)

제안 1 모바일 환경에 최적화된 간소형 플로팅 버튼으로 PC와 동일한 메뉴에 같은 경로로 접근할 수 있게 함

- 기능: 모바일에 동일한 메뉴의 간소화된 플로팅 버튼을 제공한다.
- 혜택: 모바일에서도 전체 메뉴를 다시 탐색하는 부담을 줄이고, PC 사용자와 같은 경로로 같은 서비스를 이용할 수 있다.
- 증거: PC에서 화면 우측에 표시되는 플로팅 버튼이 모바일 웹에서는 나타나지 않는다.

제안 2 KRDS를 준수하여 언어 변경 기능에 현재 사용 언어로 이용 가능한 언어를 표시하고, 언어 선택 기능의 인지성과 접근성을 높임

- 기능: 현재 사용 언어로 표시 언어들을 확인할 수 있게 한다..
- 혜택: KRDS 준수로 공공기관 사용자들의 일관된 사용 흐름과 접근성을 확보할 수 있다.
- 증거: 모바일과 PC 모두 언어 선택 항목이 영어로만 표시되어, 원어와 현재 서비스 표시 언어를 함께 표기하도록 한 KRDS 가이드라인을 준수하지 않고 있다.

제안 3 사용자 분석을 바탕으로 메뉴를 이용 목적별로 그룹화하고, 메인에 퀵 메뉴를 제공해 원하는 정보에 최소한의 단계로 접근할 수 있도록 함

- 기능: 사용자 분석을 기반으로 이용 목적을 나누고, 이를 바탕으로 서비스를 그룹핑해 홈에서 Quick Menu로 제공한다.
- 혜택: 사용자가 웹 이용 목적에 따라 빠르게 원하는 콘텐츠로 접근할 수 있다.
- 증거: 자사는 홈을 전체 메뉴, 사업공고 등 기본적인 분류 체계로 구성한 반면, 우수사는 사용자의 행동 중심으로 서비스를 그룹핑해 각자 목적에 맞게 접근하기 쉽다.

제안 4 PC와 모바일의 '바로이동' 메뉴 구성과 진입 경로를 통일하여 기기 간 일관된 서비스 이용 경험을 제공함

- 기능: 모바일에서 표시되는 드롭다운 메뉴를 PC에도 동일하게 제공한다.
- 혜택: 사용하는 기기가 달라져도 헤매지 않고 국민영양통계, 보건산업통계를 이용할 수 있다.
- 증거: '바로이동' 드롭다운 버튼을 클릭 시 나오는 메뉴의 종류가 모바일웹과 PC웹이 다르다.

2-2. 추진 전략

세부 추진 전략

제안 5. 모바일에 최적화된 게시물 목록을 설계하여 가로 스크롤 없이 주요 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 한다.

- 기능: 모바일용 게시글 목록 표(공지사항, 사업공고, 보도자료, 연구자료 등)를 다시 설계한다.
- 혜택: 모바일에서도 스크롤을 헤매지 않고 사업공고, 공지사항을 한눈에 확인할 수 있다.
- 증거: 모바일 웹의 보도자료, 사업공고 등 게시글 목록에서 가로로 스크롤해야 작성자, 작성일 등 정보를 확인할 수 있다.

제안 6. 모바일 화면에서 카테고리명과 더보기 버튼이 겹치지 않도록 배치와 터치 영역을 개선하여 정보 가독성과 탐색 편의성을 높인다.

- 기능: 상세 페이지 이동 버튼의 위치/구조를 재설계한다.
- 혜택: 헤매지 않고 상세 페이지의 진입점을 인지하며, 터치 오류로 발생하는 불편을 줄일 수 있다.
- 증거: 모바일 웹에서 콘텐츠 카테고리 탭의 텍스트와 '+' 버튼이 겹쳐진다.

제안 7. 후원승인 페이지의 표와 콘텐츠 배치를 모바일 환경에 맞게 재설계하여 행사명, 일정, 기관 등 관련 정보를 한눈에 파악할 수 있도록 한다.

- 기능: 모바일용 후원승인 표를 다시 설계한다.
- 혜택: 모바일에서도 스크롤을 헤매지 않고 후원승인 표를 한눈에 확인할 수 있다.
- 증거: 모바일 웹에서 접속한 후원승인 페이지의 콘텐츠의 레이아웃이 반응형으로 적용된다.

제안 8. 사업공고 페이지의 정보 우선순위를 정립하고 사업 개요, 신청 기간, 신청 방법 등 핵심 정보를 본문에 명확히 제시하여 정보 탐색의 효율성을 높인다.

- 기능: 사업공고 페이지를 경쟁사처럼 핵심정보를 빠르게 탐색할 수 있는 구조로 개선한다.
- 혜택: 사업공고 정보를 찾는 사용자들이 첨부파일을 내려 받거나 불필요하게 스크롤하지 않고도 사업 개요, 신청기간 등 사업 정보를 한눈에 확인할 수 있다.
- 증거: 자사의 사업공고페이지와 달리 경쟁사는 소관부처/지자체, 사업수행기관, 신청기간, 사업개요, 사업신청방법, 문의처 등의 정보를 한 번에 확인하기 쉽다

2-3. 적용 기술

기존 운영자산에 국/영문 반응형 화면과 신고/인증 기능을 연결하고, 시제품과 단계별 시험으로 사용성과 작동 여부를 검증함

적용 기술

본 사업은 기존 KHIDI의 서버/CMS/데이터베이스를 활용하면서, 국/영문 홈페이지와 요구 기능을 개편함. 화면 개발 담당자는 표준 웹 기술로 화면 크기에 따라 정보가 재배치되는 반응형 화면을 구현하고, 기존 CMS에서 수정한 콘텐츠가 PC와 모바일에 함께 반영되도록 연결함. 기능/연계 개발 담당자는 관세피해신고, 관리자 처리, 본인확인, SNS 로그인, 문서 바로보기 기능을 구현하며, 신고 처리상태별 알림은 기구축 SMS, 대량메일 발송시스템과 연계함. 기존 기능은 요구사항, 보안, 호환성을 확인하여 재사용하고, 충족하지 못하는 부분은 보완 개발함.
개발 전에는 메뉴 탐색/모바일 목록/신고 입력 등 주요 흐름을 Figma 프로토타입으로 제작해 기획/디자인/개발 담당자가 함께 검토함. 이를 통해 화면의 사용성과 구현 조건을 조기에 확인하고, 연계 항목/송수신 정보/오류 처리방식을 설계서에 반영함. QA와 서버, DB, 보안 담당자는 기능/연계/성능/접근성/보안을 단계별로 검증하여 실제 운영환경에 적용 가능한지 확인함.

2-4. 표준 프레임워크 적용

KRDS로 화면의 일관성을 확보하고, 기존 CMS와 호환되는 공통기능을 활용해 중복 개발과 유지관리 부담을 줄임

표준 프레임워크 적용

국/영문 화면은 KRDS를 기준으로 메뉴, 버튼, 입력창, 안내 메시지의 구성과 사용방식을 통일하고, 디자이너가 이를 웹 스타일 가이드로 정리함. 기능/연계 개발 담당자는 기존 시스템과 기술적용계획표를 확인하여 전자정부 표준프레임워크의 적용 범위와 구성을 제시하고 KHIDI 승인 후 반영함.
게시판, 파일 처리, 권한, 로그 등 공통기능은 기존 CMS와 표준프레임워크 공통컴포넌트의 지원 범위를 비교하여 활용 대상을 선정함. 동일한 기능을 중복 구축하지 않도록 기존 기능을 우선 확인하고, 신규·변경 요구에 맞지 않는 부분은 보완함.

예상 문제	대응 방안
기존 CMS와 프레임워크의 버전/실행환경 차이	착수 단계에서 구성과 호환성을 확인하고, 분리된 시험환경에서 연결을 검증한 후 적용
공통컴포넌트가 신고/인증 등 업무 요구를 모두 지원하지 못함	요구 기능과 지원 기능을 대조하여 부족한 처리/화면/연계 기능을 별도 구현
공통 화면 요소가 모바일/접근성 기준에 맞지 않음	KRDS와 접근성 기준에 맞게 조정하고, 실제 브라우저/기기에서 재검증
외부 라이브러리의 사용권/보안 문제	사용 조건/버전/취약점을 확인하고 적용/변경 이력을 관리

QA 담당자는 공통기능과 개별 기능이 함께 정상 작동하는지 검증함. 적용한 기술/버전/공통컴포넌트/변경사항은 문서화하여 향후 유지관리에 활용하도록 제공함.

2-5. 개발방법론

단계별 산출물과 2주 단위 구현 검토로 누락과 오류를 조기에 잡고, 설계부터 운영 전환까지 연결해 완성도를 높임

개발방법론

본 사업은 분석/설계/개발/시험·운영 전환의 단계별 관리에 짧은 주기의 구현 검토를 결합하여 수행함. 기존 시스템과의 연계 조건은 초기에 확인하고, 사용자 화면은 프로토타입으로 검토하여 개발 후 발생하는 재작업을 줄임.

총괄 PM은 요구사항별 담당자/산출물/시험항목/제출기한을 연결하여 관리함. 백귀리, 김아현은 국문 홈페이지 분석, 정보구조 및 화면 설계를, 영문 기획 담당자는 영문 콘텐츠와 메뉴를 설계함. 디자이너는 이를 바탕으로 국/영문 디자인 시안을 제작하며, RFP에 따라 착수 후 2개월 이내에 PC용/모바일용 디자인 구성도를 각각 3종 이상 제시함. 대상 화면과 시안별 제작 범위, 검토/수정/절차는 착수 수 KHIDI와 구체화하며, 이를 바탕으로 잠정 배치한 디자이너의 업무량과 일정을 검토함.
개발 담당자는 확정된 항목부터 순차적으로 구현하며, 약 2주마다 기획, 디자인, 개발, QA 담당자가 결과를 함께 검토하고, 변경사항은 영향과 승인 여부를 확인하여 반영한다.

수행 단계	주요 절차/기법	주요 산출물 및 내용	제출시기
착수	역할/일정/보고/보안관리 기준 수립	사업수행계획서/착수계/보안관리계획	계약체결 후 10일 이내
분석/설계	현황/사용자/연계 분석, 메뉴/데이터/화면 설계, 시제품 검토	요구사항 분석서/인터페이스 설계서/DB 설계서/시스템 구성도, 국/영문 메뉴/화면 구성안	분석/설계자료는 RFP에 따라 분석 후 7일 이내 제출, PC/모바일 디자인 구성도는 착수 후 2개월 이내 각각 3종 이상 제시
개발	확정 항목부터 구현, 코드 검토/변경관리, 단위시험	프로그램 명세서/소스코드/단위시험 계획 및 결과	명세서/단위시험 자료는 구현 완료 후 14일 이내
통합/검증	기능/연계/성능/보안/접근성 시험, 사용성 검증과 재시험	통합시험 계획/결과, 취약점 점검/조치결과, 분야별 검증자료	통합시험 자료는 구현 완료 후 14일 이내, 웹취약점 점검/조치결과서는 오픈 1주 이전
운영 전환/완료	배포/복구 확인, 시험운영/교육/인계/검수	사용자/운영자/관리자 매뉴얼, 교육/인계자료, 유지관리/하자보수 계획, 최종보고서	매뉴얼은 구현 완료 후 14일 이내, 나머지는 RFP 제출기한에 따라 완료 단계 제출

3-1. 기능 요구사항

3-1-1. 정보구조 설계

PC·모바일의 메뉴와 이용 경로를 일관되게 정비하고, 이용 목적에 맞춰 정보를 배치하여 원하는 서비스와 핵심 정보를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 개선함

AS-IS와 TO-BE 비교

번호	위치	AS-IS	TO-BE	바꾼 방법	근거	KRDS 수준
01	모바일 플로팅 메뉴	PC에서 제공하는 플로팅 메뉴가 모바일에는 없음	모바일에서도 조직도·경영공시·정보공개·자료실·뉴스클리핑에 바로 접근	간소형 플로팅 메뉴 신설 및 PC와 동일한 연결 항목 제공	2-1-8 현황 분석, 관찰 1	권장
02	PC·모바일 언어 선택 메뉴	'English', 'Korean'으로 표시하여 한국어 설명과 현재 선택 상태가 불명확	'English(영어)', 'Korean(한국어)'로 병기하고 현재 사용 언어 구분	언어명 표기 개선 및 선택 상태 표시	2-1-8 현황 분석, 관찰 4	권장
03	홈 화면 목적별 빠른 메뉴	게시물·서비스 분류 중심으로 구성되어 이용 목적별 접근 경로가 없음	'지원사업·사업참여', '산업·정책·통계', '해외진출·국제의료', '교육·행사·참여'의 4개 목적별 메뉴 제공	기존 서비스를 이용 목적별로 그룹화하고 빠른 메뉴 추가	2-1-9 벤치마킹, KOTRA 및 정보구조 종합 시사점	우수
04	PC '바로이동' 메뉴	'메인', 'Q&A'만 제공하여 모바일과 메뉴 구성이 다름	'국민영양통계', '보건산업통계'를 추가하여 모바일과 동일한 메뉴 구성 제공	통계 메뉴 2개 추가 및 기기 간 진입 경로 통일	2-1-8 현황 분석, 관찰 2	권장
05	모바일 게시물 목록	작성자·작성일 등 주요 정보를 확인하려면 가로 스크롤이 필요	제목과 주요 부가정보를 화면 너비 안에서 확인	모바일 전용 목록 구성 및 정보 배치 재설계	2-1-8 현황 분석, 관찰 3	권장
06	모바일 카테고리·더보기 영역	카테고리명과 '+' 버튼이 겹쳐 기능 식별과 선택이 어려움	카테고리명과 더보기 버튼을 명확히 구분하고 충분한 터치 영역 확보	요소 간 간격 조정 및 버튼 위치·터치 영역 개선	2-1-8 현황 분석, 관찰 5	필수
07	모바일 후원승인 페이지	표의 텍스트가 과도하게 줄바꿈되어 행사명·일정·기관의 관계를 파악하기 어려움	행사별 관련 정보를 묶어 모바일에서 쉽게 확인	표와 콘텐츠를 모바일 화면에 맞게 재배치하고 정보 간 관계 유지	2-1-8 현황 분석, 관찰 6	권장
08	사업공고 상세 페이지	핵심 정보를 빠르게 파악하기 어려워 첨부파일 확인이나 반복 탐색이 필요	사업 개요·신청 기간·신청 방법·문의처 등 핵심 정보를 본문에서 우선 제공	정보 우선순위 정립 및 핵심 정보 요약 영역 구성	2-1-9 벤치마킹, KHIDI·기업마당 비교	권장

3-1. 기능 요구사항

3-1-1. 정보구조 설계

메뉴구조도

이하 메뉴구조에서는 전략 1~4의 적용 방향을 현행(As-Is)과 개선안(To-Be) 비교를 통해 제시한다. 화면 구성과 정보 배치 개선에 해당하는 전략 5~8은 이후 화면설계에서 구체적인 적용 방안을 제시한다.

전략1. 모바일 환경에 최적화된 간소형 플로팅 버튼으로 PC와 동일한 메뉴에 같은 경로로 접근할 수 있게 함

- **모바일 웹 메뉴 구조도 AS-IS**

- **모바일 웹 메뉴 구조도 TO-BE**

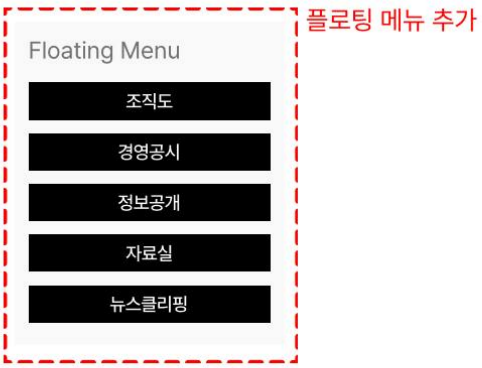

플로팅 메뉴 추가

1Depth 2Depth 3Depth

3-1. 기능 요구사항

3-1-1. 정보구조 설계

전략2. KRDS를 준수하여 언어 변경 기능에 현재 사용 언어로 이용 가능한 언어를 표시하고, 언어 선택 기능의 인지성과 접근성을 높임

- 모바일 웹 메뉴 구조도 AS-IS

- 모바일 웹 메뉴 구조도 TO-BE

3-1. 기능 요구사항

3-1-1. 정보구조 설계

전략2. KRDS를 준수하여 언어 변경 기능에 현재 사용 언어로 이용 가능한 언어를 표시하고, 언어 선택 기능의 인지성과 접근성을 높임

- **PC 웹 메뉴 구조도 AS-IS**

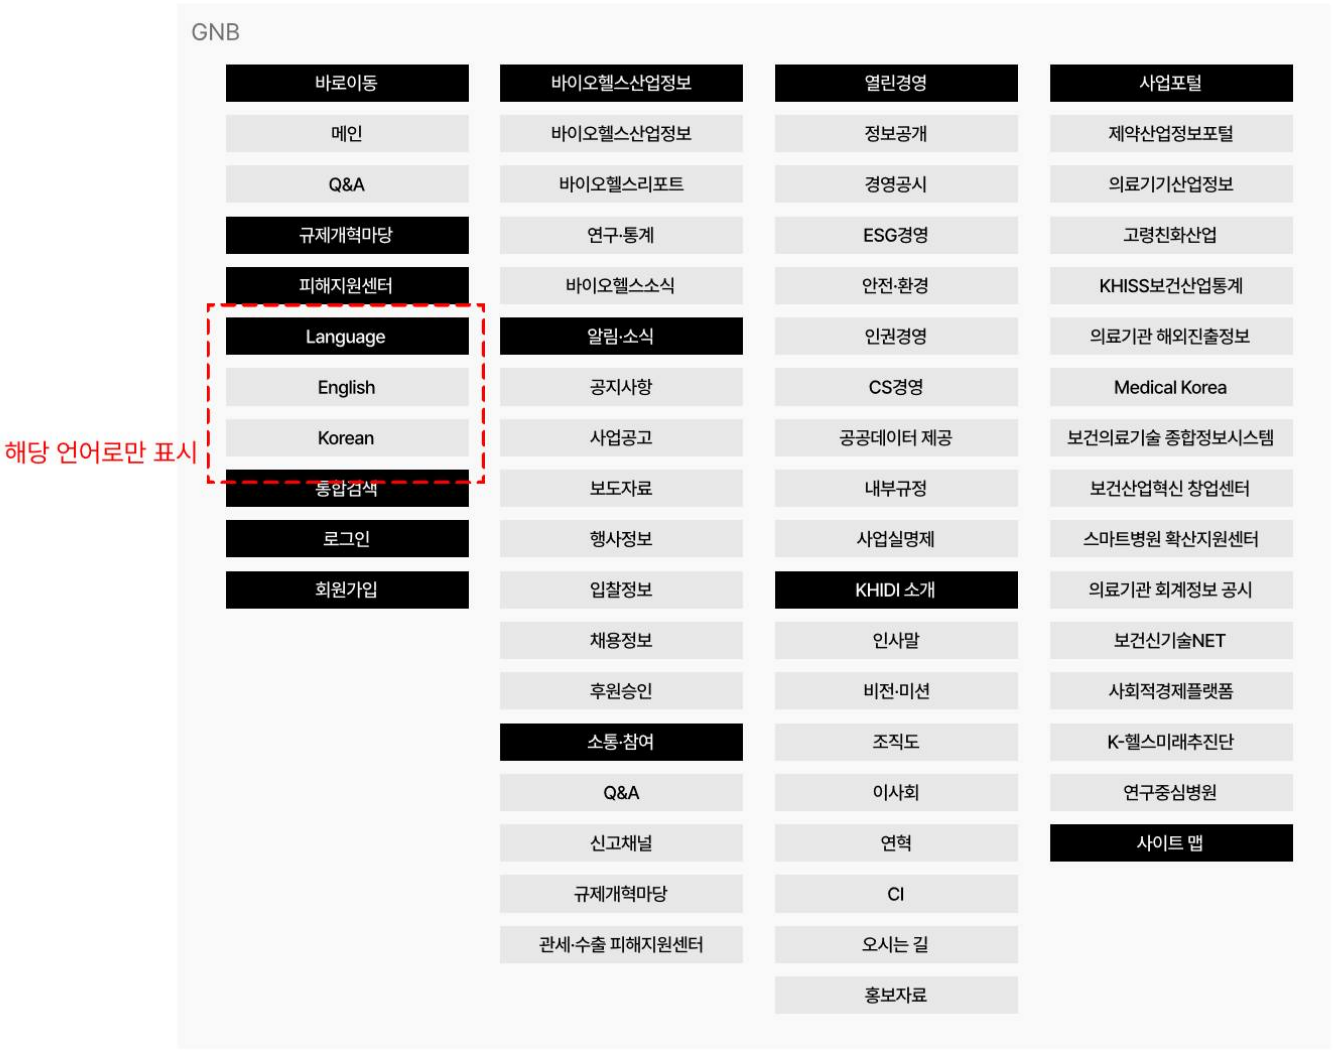

3-1. 기능 요구사항

3-1-1. 정보구조 설계

전략2. KRDS를 준수하여 언어 변경 기능에 현재 사용 언어로 이용 가능한 언어를 표시하고, 언어 선택 기능의 인지성과 접근성을 높임

- **PC 웹 메뉴 구조도 TO-BE**

3-1. 기능 요구사항

3-1-1. 정보구조 설계

전략3. 사용자 분석을 바탕으로 메뉴를 이용 목적별로 그룹화하고, 메인에 퀵 메뉴를 제공해 원하는 정보에 최소한의 단계로 접근할 수 있도록 함

- **PC 웹 메뉴 구조도 AS-IS**

3-1. 기능 요구사항

3-1-1. 정보구조 설계

전략3. 사용자 분석을 바탕으로 메뉴를 이용 목적별로 그룹화하고, 메인에 퀵 메뉴를 제공해 원하는 정보에 최소한의 단계로 접근할 수 있도록 함

- **PC 웹 메뉴 구조도 TO-BE**

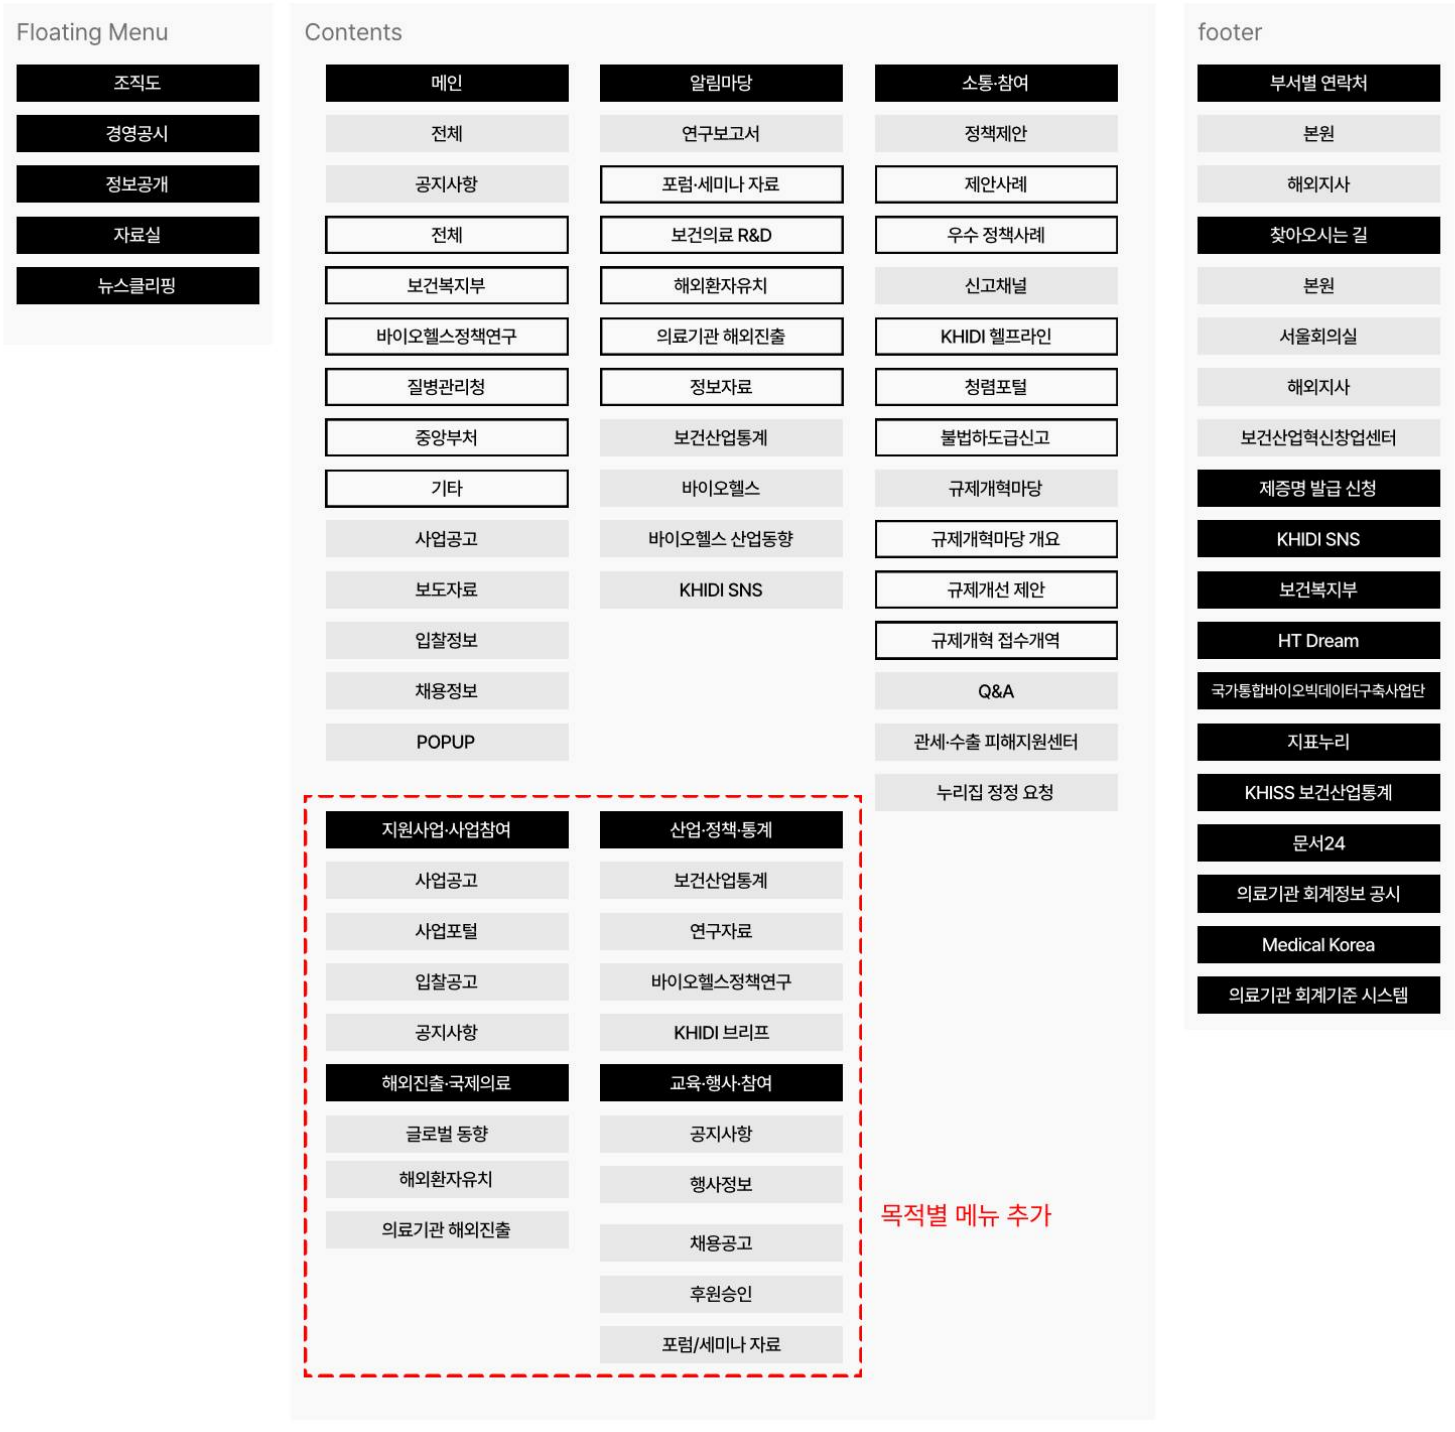

3-1. 기능 요구사항

3-1-1. 정보구조 설계

전략4. PC와 모바일의 '바로이동' 메뉴 구성과 진입 경로를 통일하여 기기 간 일관된 서비스 이용 경험을 제공함

- **PC 웹 메뉴 구조도 AS-IS**

3-1. 기능 요구사항

3-1-1. 정보구조 설계

전략4. PC와 모바일의 '바로이동' 메뉴 구성과 진입 경로를 통일하여 기기 간 일관된 서비스 이용 경험을 제공함

- **PC 웹 메뉴 구조도 TO-BE**

3-1. 기능 요구사항

3-1-1. 정보구조 설계

개편근거

PC와 모바일에서 같은 정보에 쉽게 접근하도록 하기 위해, 현황 분석에서 확인한 바로가기의 부재와 '바로이동' 메뉴의 차이를 근거로 모바일 플로팅 메뉴를 추가하고 기기별 메뉴 구성과 진입 경로를 통일했다.
이용 목적에 맞는 정보를 빠르게 찾도록 하기 위해, 사용자 분석에서 도출한 주요 이용 목적과 벤치마킹 사례를 근거로 기존 서비스를 '지원사업·사업참여', '산업·정책·통계', '해외진출·국제의료', '교육·행사·참여'의 네 그룹으로 재구성했다.
언어 선택 기능을 쉽게 이해하도록 하기 위해, 현황 분석에서 확인한 영어로만 표시된 언어명과 KRDS의 언어 선택 안내를 근거로 'English(영어)', 'Korean(한국어)'를 병기하고 현재 사용 언어를 구분하도록 구성했다.

3-1. 기능 요구사항

3-1-2. 화면 설계

이용 목적별 퀵 메뉴와 KRDS 기반 언어 표시를 적용하고, PC/모바일 간 동일한 접근 경로를 제공함

AS-IS 표 번호: 02, 03, 04

AS-IS

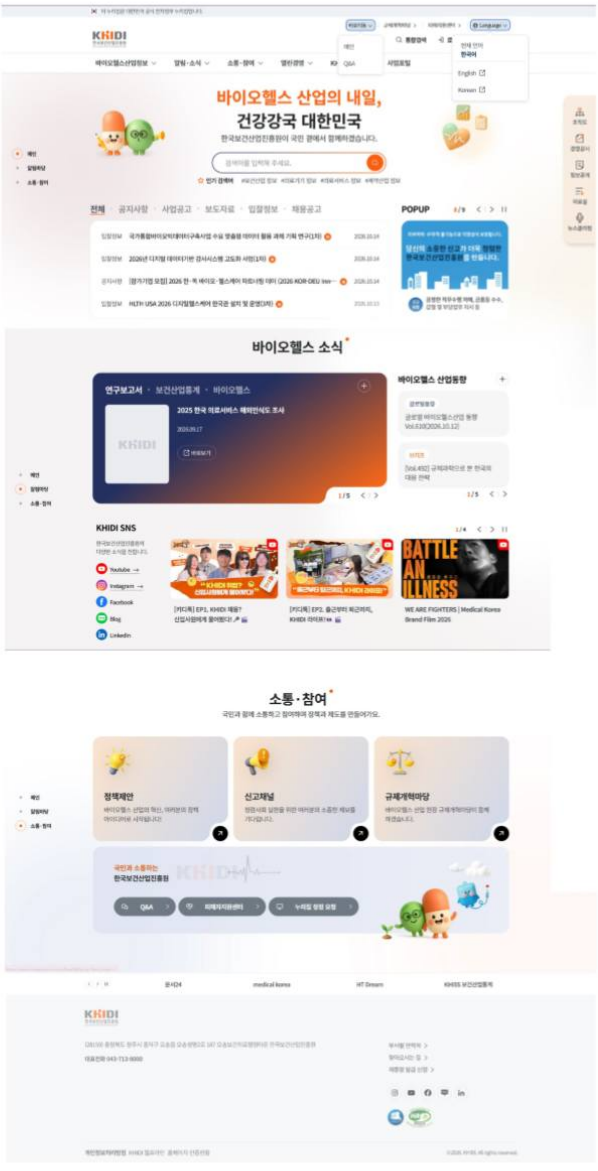

TO-BE

** 푸터 영역은 기존과 동일 **

3-1. 기능 요구사항

3-1-2. 화면 설계

사업공고 상세 화면 상단에 사업 개요,신청 기간, 신청 방법, 문의처를 요약 배치해, 첨부파일을 열거나 반복 탐색하지 않고도 핵심 정보를 빠르게 확인할 수 있도록 함

AS-IS 표 번호 : 08

AS-IS

TO-BE

3-1. 기능 요구사항

3-1-2. 화면 설계

메인에 이용 목적별 퀵 메뉴와 주요 메뉴에 연결되는 모바일용 플로팅 버튼를 제공해 필요한 정보로의 접근을 쉽게 함

AS-IS 표 번호 : 01, 03, 06

AS-IS

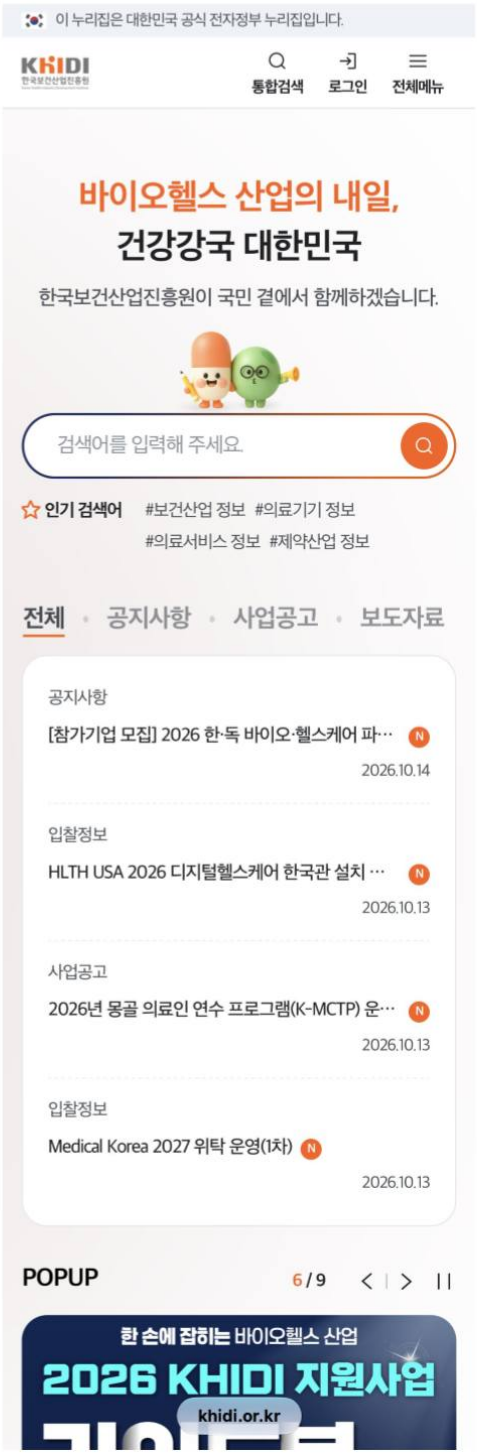

TO-BE

3-1. 기능 요구사항

3-1-2. 화면 설계

별도의 가로 스크롤 없이 제목, 작성자, 첨부 파일 존재 여부 등을 한눈에 확인할 수 있도록 모바일에 최적화된 게시글 목록을 설계함

AS-IS 표 번호 : 05

AS-IS

TO-BE

3-1. 기능 요구사항

3-1-2. 화면 설계

행사명, 일정, 기관 등 관련 정보를 한눈에 볼 수 있도록 후원승인 페이지의 표를 모바일 환경에 맞게 설계함

AS-IS 표 번호 : 07

AS-IS

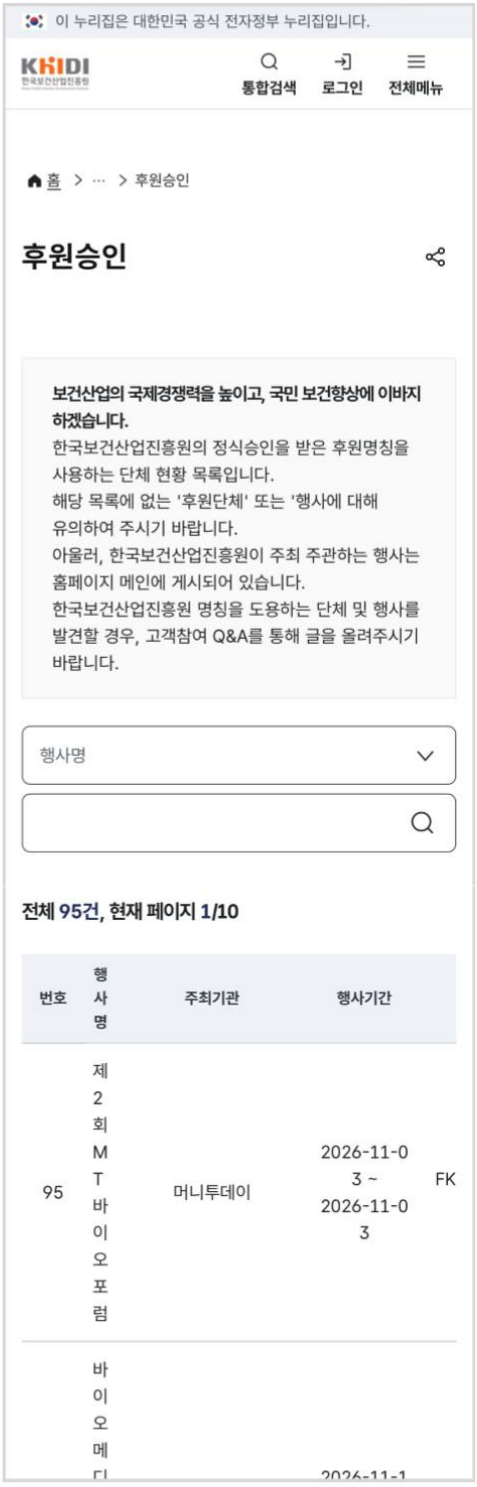

TO-BE

3-1. 기능 요구사항

3-1-3. 콘텐츠 구성

기존 콘텐츠를 새로 만드는 대신, 사용자의 이용 목적에 따라 네 가지 그룹으로 재구성하고 필요한 정보에 빠르게 접근하도록 배치한다.

콘텐츠 구분	구성 내용 및 제공 방식
지원사업·사업참여	사업공고, 공지사항, 사업포털, 입찰공고를 묶어 지원·참여 기회를 탐색하도록 구성한다.
산업·정책·통계	보건산업통계, 연구자료, 바이오헬스정책연구, KHIDI 브리프를 묶어 산업·정책 정보를 제공한다.
해외진출·국제의료	해외환자유치, 의료기관 해외진출, 글로벌 동향의 기존 정보와 연결한다.
교육·행사·참여	공지사항, 행사정보, 채용공고, 후원승인, 포럼·세미나 자료를 묶어 참여 목적의 탐색을 지원한다.
공통 검색·소식	통합검색과 공지사항·사업공고·보도자료 영역을 제공하고, 모바일에서도 주요 정보를 쉽게 확인하도록 배치한다.
빠른 접근 메뉴	조직도·경영공시·정보공개·자료실·뉴스클리핑의 모바일 접근 경로를 마련하고, '바로이동'의 통계 메뉴를 PC·모바일에서 통일한다.
게시물·후원승인 목록	게시물의 제목·작성자·등록일 등 주요 정보와 행사명·기관·일정의 관계가 모바일에서도 쉽게 파악되도록 재배치한다.
사업공고 상세정보	사업 개요·신청 기간·신청 방법·문의처를 본문에서 우선 확인하도록 구성한다.

3-1-4. 운영 방안

제안한 메뉴와 화면을 실제 서비스에 적용할 경우, 콘텐츠 관리와 기술 관리를 구분하여 다음과 같이 운영한다.

담당 주체	관리 대상	관리 방법
KHIDI 정보화전략팀·관련 업무부서	메뉴 분류, 콘텐츠 내용, 사업공고 핵심정보	메뉴 및 화면 변경을 승인하고, 업무 부서가 기존 CMS에서 게시물과 문의처 등을 현행화한다.
총괄 PM	일정, 승인 및 조치 이력	담당자와 기한을 지정하고 전체 프로젝트를 관리한다.
국문/영문 기획 담당자	이용 목적별 메뉴, 정보 배치	백귀리, 김아현은 국문 홈페이지, 영문 기획자는 영문 홈페이지를 담당하며, 메뉴구조도 및 화면 설계안을 제작한다.
디자인, 영문 콘텐츠 담당자	공통 UI, 웹 스타일 가이드, 영문 표현	디자이너는 진흥원의 WI 설계 및 화면 기준을 관리하고, 번역/원어민 검수 담당자는 변경된 영문 문구의 정확성과 용어의 일관성을 확인한다.
화면, 기능/연계 담당자	반응형 화면, CMS, 신고/인증/알림 등	승인된 사항을 구현하고 PC, 모바일 동작과 시스템 연결을 확인하며, 발견된 오류를 수정한다.
QA, 서버, DB, 보안 담당자	기능/성능/데이터/보안	분야별 점검 결ㄹ과와 오류를 기록하고, 수정 후 재검증하며 배포, 백업, 복구 절차를 확인한다.
기존 KHIDI 유지관리 업체	기존 CMS, 서버/연계환경	환경 및 연계정보를 제공하고, 기존 계약 범위에서 운영 반영, 백업, 복구 및 변경사항 인계에 협조한다.

3-2. 보안 요구사항

보안 요구사항

신고/인증/데이터 처리 흐름에 맞춰 접근권한, 암호화, 기록관리를 적용하고, 취약점 수정 후 재검증으로 보호조치의 작동 여부를 확인함

총괄 PM은 KHIDI 보안정책에 따라 참여인력의 보안서약, 교육/자료 접근, 장비 반출입을 관리하고, 보안/개인정보 담당자는 설계/개발/시험 단계별 이행 여부를 점검한다. 신고, 본인확인, SNS 로그인은 처리하는 개인정보와 전달 경로를 먼저 확인하여 필요한 항목만 수집하도록 설계한다.
개발 담당자는 RFP의 소프트웨어 개발보안 기준을 적용하여 입력값 검증/파일 처리/사용자별 접근통제를 구현하고, 데이터베이스 담당자는 업무별 최소 권한과 접속 승인/이력을 관리한다. 개인정보는 RFP의 암호화/인증 및 인가/안전한 전송 기준을 적용하고, 인증정보의 소스코드 직접 기록과 관리자 화면의 불필요한 노출을 방지한다.
기능/연계 개발 담당자는 비밀번호 관리 및 동일 계정 동시접근 차단, 권한 및 접속기록 관리화면을 구현한다. 권한 부여 기록은 최소 3년, 접속기록은 최소 1년 보관하고, 보안/개인정보 담당자는 접속/수정/삭제 로그를 주 1회 이상 분석한다.
보안/개인정보 담당자는 소스코드와 웹 취약점을 점검하고, 발견된 문제를 개발 담당자가 수정한 후 동일 조건에서 재점검하여 조치 결과를 기록한다. 기존 인증, 암호화 기능도 요구 기준 충족 여부를 확인한 후 활용하며, 부족한 부분은 보완한다. 개인정보 처리업무는 KHIDI와 제안사 간 계약 범위에서 수행하고 재위탁하지 않으며, 종료 시 자료 반납 및 삭제와 증빙 및 대표자 확약서 제출까지 관리한다.

3-3. 데이터 요구사항

데이터 요구사항

데이터 표준과 검증 규칙을 정하고, 이관 전후 대조와 오류 정정 및 재검증으로 기존 정보와 신규 기능의 데이터 정확성을 확보함

DB 담당자는 기존 데이터 용어/코드/형식과 RFP의 상위 표준을 분석하여 국/영문 콘텐츠 및 신규 기능의 데이터 기준을 정리한다. 기존 구조의 활용 가능성을 확인하고, 관세피해신고, 처리상태, 인증 연계 등에 필요한 데이터 구조와 관계를 설계한다. 기능/연계 개발 담당자와 실제 처리 흐름을 대조해 구조의 중복/누락/관계 오류를 확인한다.
데이터 값은 필수값/형식/허용 범위/중복/연결 관계에 대한 점검 규칙을 정하고, 검증 쿼리와 기능시험으로 확인한다. 발견된 오류는 발생 위치와 영향을 기록하고, KHIDI 업무 담당자와 정정 범위를 확인한 후 수정 및 재검증한다.
이관은 대상/순서/변환 규칙/작업 시점과 백업/복구 절차를 정한 후 시험 이관을 수행한다. 이관 전후 건수, 주요 값, 연결 관계를 비교하여 누락과 변형 여부를 확인하고, 오류 발생 시 원인을 수정하여 재이관하거나 승인된 절차로 복구한다.
검증 계획, 결과와 데이터 처리 규칙은 산출물로 관리하고, 변경 및 추가 데이터의 관리정보는 기관 및 중앙 메타데이터 관리체계의 현행화를 지원한다. 관리시스템이 없는 경우 지정 항목을 문서로 제출하며, 기존 개방데이터와 신규 데이터의 공개 대상 여부를 확인하여 서비스 연속성을 확보한다.

3-4. 제약사항

제약사항 준수방안

기존 환경의 호환성과 표준/접근성/보안 제약을 사전에 확인하고, 시험환경 검증과 보완 개발로 요구 기능과 품질을 충족함

총괄 PM은 RFP의 기술/개발/접근성/보안/데이터 기준을 준수 목록으로 관리하고, 담당자별 적용 방법과 검증 결과를 연결한다. 국문/영문 기획 담당자와 디자이너는 메뉴/용어/화면 기준을, 개발, DB 담당자는 코드 및 데이터의 작성/명명/변경관리 기준을 수립한다.
기존 CMS, 서버, 프레임워크의 구성 차이는 착수 단계에서 확인하고, 분리된 시험환경에서 연결을 검증하여 운영 중인 서비스에 미치는 영향을 줄인다. 기존 기능이나 공통컴포넌트가 신고 및 인증 등 요구를 충족하지 못하면 부족한 기능을 보완 개발하고 통합시험으로 확인한다.
화면 개발 담당자는 W3C HTML/CSS 문법검사와 주요 브라우저의 화면 및 동작 호환성을 확인하고, QA는 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2 및 접근성 품질마크 인증 기준에 맞춰 검증한다. 코드/데이터 처리/성능/보안 문제는 분야별 담당자가 원인을 분석하고, 수정과 재검증 결과까지 기록한다.
개발 소스코드와 기능/입출력/주요 처리 설명자료를 KHIDI에 제공하고, 정보자원 및 SW사업정보는 지정 양식에 따라 제출한다. 기능점수 데이터는 산정 역량을 보유한 것으로 가정한 사내 기능/연계 개발 담당자가 작성하며, 실제 역량 증빙은 없다. 31~60일에 초안을 작성하고, 101~114일에 구현 범위를 반영하여 보완/검토하는 것을 잠정 일정으로 계획한다. 총괄 PM은 관련 설계·구현자료와의 일치 여부 및 제출 준비를 확인하며, 세부 작성/검토/제출 일정은 착수 후 KHIDI와 확정한다. 화면별 이용기록의 수집 기준과 운영 성과 측정자료의 인계방안을 마련하며, 기술적용계획 변경은 KHIDI 승인 후 반영한다. 이미지/글꼴/외부 소프트웨어는 사용권/버전/보안 적합성을 확인하여 적용한다.

4-1. 성능 요구사항

핵심 정보에 3회 이내 도달/과제 성공률 90% 이상을 목표로, 주요 사용자 10명이 안내 없이 기존/개선 화면에서 동일 과제를 수행하도록 하여 성공률과 탐색 시간/경로를 비교 검증함

사용성 목표와 측정 방법

현재 확인한 내용은 홈페이지 관찰 결과이며, 클릭 수/수행 시간/성공률은 아직 측정하지 않았다. 실제 계약 시 기존 화면과 개선 화면에서 동일한 과제를 수행하게 하여 결과를 비교한다.

목표	현재 상태	목표	측정 방법
원하는 정보까지 탐색 단계 감소	모바일에 주요 바로가기가 없어 전체 메뉴를 다시 탐색해야 하는 경우가 관찰됨 (클릭 및 탭 수는 미측정)	선정한 핵심 정보에 3회 이내 클릭 및 탭으로 도달	동일한 시작 화면에서 과제별 클릭, 탭 수 기록
핵심 과제 성공률 향상	메뉴 탐색과 정보 확인의 어려움 관찰 (성공률은 미측정)	핵심 과제별 도움 없이 성공한 참여자 비율 90% 이상	정확한 도착 페이지와 확인 정보를 기준으로 성공 여부 기록
PC/모바일 이용 차이 감소	플로팅 메뉴와 '바로이동' 항목이 기기별로 다른 것이 관찰됨	동일 과제의 성공률 차이 10%p 이내, 탐색 단계 차이 1회 이내	동일 참여자의 기기별 수행 결과 비교
핵심 정보의 발견 시간 감소	모바일 웹 사업공고와 후원승인 화면에서 정보 우선순위 및 관계 파악의 어려움이 관찰됨	기존 화면 대비 핵심 정보 발견 시간 감소 및 반복적으로 시선을 헤매는 구간 축소	아이트래킹으로 정보 영역을 처음 본 시간 및 시선 경로 확인, 사후 인터뷰
메뉴 및 버튼의 이해도 향상	모바일 웹에서 카테고리와 더보기 버튼의 겹침이 관찰됨	참여자의 80% 이상이 탐색 편의성에 5점 중 4점 이상 응답	잘못 선택한 횟수와 사후 인터뷰, 평가 기록

테스트 계획

백귀리와 김아현은 실제 계약 후 국문 홈페이지의 기존 화면과 개선 화면을 비교하는 사용성 검증(아이트래킹)을 수행한다. 본 내용은 향후 수행계획이며, 현재 모의 제안에서 시험을 완료한 결과를 의미하지 않는다. 실제 계약이 체결되면 발주기관과 대상, 인원, 과제, 목표치를 협의한 후, 아이트래킹 과제 수행 시간, 성공률 분석 및 사후 인터뷰를 실시한다.

참가자	기업 실무자, 보건의료 R&D 연구자, 의료기관/국제의료 관계자, 정책 및 공공기관 담당자, 일반 정보 이용자/구직자 등 우리 팀이 분석한 주요 사용자 유형에서 각 2명, 총 10명
진행 장소	계원예술대학교 디자인관 5층 UT 스튜디오 (진행 장소는 착수 후 협의 하에 변경 가능)
모집 기준	해당 정보를 찾을 필요가 있는 이용자를 모집하고, 홈페이지 이용 경험과 주로 사용하는 기기를 확인
진행자	우리 팀 1명이 과제 안내와 인터뷰 담당
기록 담당자	우리 팀 1명이 시간/성공 여부/클릭/오류 행동과 장비 상태 기록

4-1. 성능 요구사항

사용성 평가 과제와 기록 항목

참여자에게 이용 목적만 제시하고 메뉴 이름이나 정답 경로는 알려주지 않는다. 과제 시작 및 종료 조건은 사전에 동일하게 정하고, 도움을 제공한 경우에는 도움 없이 성공한 결과와 구분하여 기록한다.

과제	참여자에게 제시할 안내	성공 기준	주요 관찰 내용
PC 웹에서 지원사업 확인	“지정 분야의 지원사업을 찾아 신청 기간, 신청 방법, 문의처를 확인해 주세요.”	조건에 맞는 공고와 세 가지 정보를 정확히 확인	완료시간, 성공 여부, 클릭 수, 첨부파일 확인 필요 여부
PC 웹에서 연구 및 통계 탐색	“지정한 주제의 연구자료 또는 통계 서비스를 찾아주세요.”	지정 자료 페이지 또는 통계 서비스 진입점에 도달	첫 선택 메뉴, 잘못 진입한 경로, 되돌아간 횟수
모바일 웹에서 게시물 정보 확인	“지정 게시물을 찾아 제목·작성자·등록일을 확인해 주세요.”	게시물과 세 가지 정보를 정확히 확인	가로 화면 이동, 정보 발견시간
모바일 웹에서 지정 서비스로의 빠른 이동	“현재 화면에서 지정한 주요 서비스로 이동해 주세요.”	도움 없이 해당 서비스에 도달	빠른 메뉴 발견 여부, 선택 오류, 클릭 수

4-1. 성능 요구사항

응답시간과 CPU, 메모리 사용량을 운영환경에 맞춰 측정하고, 기준 미달 원인을 개선 및 재검증해 서비스 성능을 확보함

성능 요구사항

서버/성능 담당자는 개발/시험/시험운영 중 로그와 성능 점검 도구를 활용하여 화면 응답시간과 자원 사용량을 확인함. 화면 개발 담당자는 이미지/스크립트와 반복 요청을 최적화하고, 기능/연계 개발·DB 담당자는 처리 지연과 데이터 조회 원인을 개선함. QA 담당자는 측정 조건과 결과를 기록하여 수정 전후를 비교함. (PER-001~004)

점검 대상	적용 기준	담당 및 확인 방법
웹페이지 표시시간	RFP 적용 조건에서 요청 후 3초 이내 완전 표시	QA가 주요 페이지의 표시시간을 측정하고 개발 담당자가 지연 원인을 개선
시간이 오래 걸리는 처리	작업 시작 시 지연 가능성을 사용자에게 안내	기능/연계 개발 담당자가 안내를 구현하고 QA가 표시 여부 확인
CPU	서비스 가용시간 및 최대 부하 상황에서 평균 사용률 70% 이하	서버/성능 담당자가 시험·시험운영 중 측정
메모리/디스크	자원 사용량 측정, 메모리 평균 사용률 75% 이하	최근 3년 최대 부하 사용량의 2배 조건을 포함하여 서버/성능 담당자가 검증
운영 안정성	신규 기능으로 기존 서비스 성능이 저하되지 않도록 관리	변경 전후 결과를 비교하고 문제를 조치한 후 운영 반영

3초 기준의 예외는 RFP에 명시된 대량 데이터 질의, 500KB 이상 큰 이미지 및 동영상 포함 페이지, 동시 사용자 용량의 90% 초과 상황 등을 구분하여 기록함. 예외 항목을 일반 페이지의 성능 미달을 정당화하는 용도로 사용하지 않으며, 적용 범위와 측정 조건은 시험 계획서에 명시함.

4-2. 품질 요구사항

산출물별 완료 기준과 확인 방법을 정하고, 요구사항 대응표부터 화면설계/프로토타입까지 내용을 대조하여 누락과 불일치를 점검함

품질 기준

산출물은 제안 범위와 요구사항의 연결, 설계의 일관성, 검증 기록의 충실성을 기준으로 확인한다.
실제로 확인한 결과와 가정/향후 검증계획을 구분하며, 수행하지 않은 개발이나 시험을 완료 실적으로 표시하지 않는다.

본 제안서에 포함된 산출물

산출물	완료 기준	확인 방법
요구사항 분석 및 대응표	집중 과업, 협력 과업, 제외 과업이 구분되고, 각 대응 방안과 본문 내용이 일치한다.	요구사항 ID와 해당 설명/설계자료 대조
국문 홈페이지 현황 (AS-IS)/벤치마킹/사용자 분석자료	관찰 내용과 출처, 관찰일이 표시되고, 확인한 문제에서 개선 방향이 도출된다.	근거자료와 분석 결과의 연결 확인, 관찰과 추정 구분
메뉴구성도 및 기존안 vs 개선안 비교표	목적별 4개 그룹, 모바일 플로팅 메뉴, PC/모바일 바로이동 통일안이 반영되고 연결 대상이 명확하다.	메뉴 누락 및 중복 확인, 기기별 진입 경로 비교
PC/모바일 화면설계서	핵심 정보와 메뉴의 대응 관계가 일치하고, 모바일 목록/버튼 겹침/후원승인 표/사업공고 정보 배치의 개선안이 제시된다.	개선 전략별 반영 여부와 화면 간 일관성 확인
프로토타입	검증할 주요 화면과 이동 경로가 연결되고, 메뉴 탐색 및 정보 확인 과업을 시연할 수 있다.	주요 과업을 직접 수행하여 화면 확인
최종 제안서 및 설계 결과물	본문, 대응표, 메뉴/화면설계의 내용이 일치하고, 검토 과정의 수정사항과 남은 확인사항이 정리된다.	최종 자료 대조 및 수정 반영 확인

본 제안서에 포함되지 않는 산출물 (가정)

산출물	완료 기준	확인 방법
영문 정보구조/콘텐츠 구성안	외국인 이용 목적에 따른 콘텐츠 선별과 간결한 메뉴가 반영됨	영문 기획 담당자 검토, KHIDI 확인
국/영문 디자인, 웹 스타일 가이드	기관 정체성, KRDS 공통 요소, 기기별 화면과 국/영문 일관성이 반영됨	디자이너 작성, 기획/개발 검토
번역/원어민 검수 자료	메뉴/콘텐츠/알림의 번역과 공식 영문 명칭 확인 및 검수 완료, 확인서 준비	번역/원어민 검수 담당자 확인
프로그램/연계 기능	반응형 화면/CMS/신고/본인확인/SNS 로그인/문서보기/알림 등의 요구 기능 구현과 시험 완료	개발 담당자 작성, QA 검증
데이터/성능/보안 자료	데이터 검증, 성능 기준 확인, 취약점 조치와 재점검 결과가 기록됨	분야별 담당자 작성, QA 확인
매뉴얼/소스/최종 결과물	최종 구현 내용과 문서가 일치하고, 제출자료/소스/변경 이력 및 인계자료가 정리됨	총괄 PM/QA 최종 확인, KHIDI 검수

4-2. 품질 요구사항

기기/브라우저별 접근성과 화면 표시를 점검하고, 기능·연계 시험과 사용자 확인시험으로 PC/모바일의 정보 및 처리 결과가 일치하는지 검증함

접근성 및 반응형 대응

화면 개발 담당자는 RFP에 명시된 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2와 웹 표준을 적용하고, QA 담당자는 웹 접근성 품질마크 인증 기준에 맞춰 결과를 점검함.
국/영문 홈페이지는 하나의 소스로 기기별 화면에 대응하고, 기존 CMS에서 수정한 콘텐츠가 PC과 모바일에 함께 반영되도록 구현함. 모바일에서는 목록, 표의 핵심 정보를 화면 너비에 맞게 재배치하고, 메뉴와 버튼이 겹치거나 주요 정보가 잘리지 않도록 점검함.
사내의 가상 화면 개발 담당자가 Chrome, Edge, Safari와 RFP에 제시된 기타 주요 브라우저에서 핵심 기능과 레이아웃을 확인함. 화면 너비와 전환 지점은 실제 콘텐츠와 기기 시험을 바탕으로 정하며, 특정 픽셀값을 RFP의 필수 기준으로 임의 지정하지 않음. 접근성 기준 충족은 구현과 시험으로 확인하며, 현재 모의 제안에서 실제 인증을 취득한 것으로 표현하지 않음.

품질 요구사항

QA 담당자는 KHIDI가 승인한 최종 요구사항을 기준으로 전체 기능과 산출물의 품질을 관리함. 개발 담당자는 기능별 예상 결과를 정리하고, QA는 입력값의 정상/오류/경계 조건과 기능 간 연결을 시험함. 적용 가능한 기능에는 자동검증을 활용하고, KHIDI 사용자 확인시험을 통해 실제 업무에서의 작동 여부를 검증함. CMS/인증/알림 등 시스템 간 연결은 송수신 값뿐 아니라 누락/중복/처리 결과의 일치 여부까지 확인함. 동일한 서비스는 PC/모바일에서 같은 자료와 처리 결과를 제공하도록 검증하고, 영문 콘텐츠는 승인된 선별 범위와 번역 결과를 기준으로 확인함. 시험운영 중 결함 수/발생률/지속시간을 기록하고, 결함 발생률 5% 이상이면 RFP에 따라 시험운영을 연장하며 결함 지속시간은 3시간 이내로 관리함. 결함 발생률의 계산 기준은 시험계획 수립 시 명시하여 KHIDI와 확인함. 사용자/관리자 매뉴얼에는 기능/연계/설치/제거/설정/로그 확인방법을 포함하고, 매뉴얼에 따른 설치/제거가 1시간 이내 가능한지 검증함. 총괄 PM은 산출물의 작성/검토/승인/제출 이력을 관리하고, 연장이 필요한 경우 사업 완료 일정에 미치는 영향과 조치계획을 즉시 협의함.

4-3. 인터페이스 요구사항

연계 경험을 갖춘 담당자가 기존 시스템 연결방안의 장단점을 비교 및 검증하고, 기획/디자인/개발 담당자가 탐색부터 입력/결과 확인까지 일관된 이용 흐름을 구현함

시스템 인터페이스

시스템 인터페이스 책임자는 사내 기능/연계 개발 담당자로 지정하며, 기존 시스템 연계 구현 경험을 보유한 인력으로 배치하는 것을 가정함. 착수 후 기존 유지관리 업체를 통해 CMS/인증/문서보기/SMS/메일 등의 연결 조건을 확인하고, DB 담당자와 송수신 항목/처리 결과/오류 대응을 설계함. 기존 방식의 재사용과 필요한 보완 개발을 비교하여 호환성/보안/관리 용이성을 충족하는 방안을 적용함.

연계 대상/방안	장점	확인할 한계/위험	적용 계획
기존 CMS/파일 관리 활용	콘텐츠 이중 관리와 중복 개발 감소	변경 메뉴/신규 기능 지원 여부 확인 필요	지원 기능은 재사용하고 부족한 항목은 연계/보완 개발
기구축 SMS/대량메일 연결	기존 발송체계를 활용하여 운영 일관성 확보	발송 조건/결과 확인/실패 처리 점검 필요	RFP에 따라 신고 처리상태별 알림을 연결하고 발송 결과 검증
기존 인증/문서보기 활용 및 보완	운영 중인 기능 활용 가능	요구 인증수단/파일 형식/사용권/접근성 충족 여부 확인 필요	미충족 항목은 보완하고 신고 본인확인과 SNS 로그인을 구분하여 구현

기능/연계 개발 담당자는 신고 첨부파일 바로보기, CSV/Excel 내려받기, 본인확인과 SNS 로그인까지 포함한 연결을 구현함. QA 담당자는 정상/오류/응답 실패 상황에서 데이터와 사용자 안내가 올바른지 시험함.

사용자 인터페이스

사용자 인터페이스 구현 책임자는 사내 화면 개발 담당자로 지정하며, 반응형 화면과 접근성 구현 경험을 보유한 인력을 배치하는 것으로 가정함. 백귀리/김아현은 국문 메뉴/정보 흐름/화면 구성을, 영문 기획 담당자는 영문 이용 흐름을 설계하고, 디자이너는 이를 시각 디자인과 공통 화면 요소로 구체화함. 화면 개발 담당자는 KRDS와 웹 접근성 기준을 반영하여 구현하고, QA 담당자는 브라우저/기기별 동작과 접근성을 검증함. 입력/저장/삭제/오류 안내는 기존 문구를 그대로 유지하는 대신 신규 기능과 국/영문 사용 상황에 맞춰 검토함. 국문 기획 담당자는 주요 과제의 탐색 경로와 정보 이해도를 확인하고, 영문 기획/번역/검수 담당자는 영문 메뉴와 문구를 검토함. 검토에서 발견한 문제는 담당자가 수정하고 QA가 재확인함.

4-4. 테스트 요구사항

요구사항별 시험환경, 담당자, 통과 기준을 정하고, 기능/연계/성능/보안 시험부터 운영환경 검증과 재시험까지 수행해 정상 작동을 확인함

테스트 요구사항

QA 담당자는 요구사항별 시험항목/담당자/환경/일정/통과 기준과 미통과 항목의 보완 절차를 포함한 통합 시험계획을 수립함. 시험은 국문/영문 홈페이지와 신고/본인확인/SNS 로그인/CMS/문서보기/알림 기능을 모두 포함함. 개발 담당자는 자체 단위시험 후 QA에 결과를 전달하고, QA는 통합시험과 재시험을 관리함.

시험 구분	주요 확인 내용	수행 담당
단위시험	화면/입력/조회/저장/수정/삭제 등 개별 기능	화면 개발, 기능/연계 개발
통합/시스템시험	신고 등록부터 관리자 처리/알림까지의 연결, CMS/인증/파일 처리, 권한별 동작	QA 주관, 개발/DB 참여
성능시험	페이지 표시시간, CPU/메모리 사용률, 최대 부하 조건	서버/성능/개발, QA 기록
보안시험	코드/웹 취약점, 개인정보 노출, 접근권한과 기록관리	보안/개인정보/개발/DB
접근성/호환성 시험	웹 표준, 키보드 이용, 주요 브라우저 및 PC/모바일 동작	화면 개발/QA
국/영문 검토	국문 탐색/정보 확인, 영문 메뉴/콘텐츠/안내 문구 및 구현	백귀리/김아현, 영문 기획/번역/검수, QA
시험운영/인수 시험	실제 업무 흐름, 장애 대응, 백업/복구, 운영 전환	QA/개발/서버/성능, KHIDI 참여

각 시험은 예상 결과/실제 결과/성공 여부/오류 내용/수정 담당자/재시험 결과를 기록하고 KHIDI에 제출하여 승인을 받음. 운영 전환 전에는 기존 유지관리 업체와 배포/원상복구 조건을 확인하고, 사전 검증과 KHIDI 승인을 거쳐 반영함. 분석/설계 산출물은 분석 후 7일 이내, 프로그램 명세서/단위 및 통합시험 자료/관련 매뉴얼은 구현 완료 후 14일 이내 제출하도록 관리함. 소스코드 점검을 포함한 웹취약점 점검/조치 결과서는 시스템 오픈 1주 이전에 제출함. 인계 후에는 지정된 담당자가 장애와 개선 요청을 관리하여 안정화를 지원함.

5-1. 관리 방법론

요구사항별 진척/위험/보안/산출물 이력을 연결하고, 정기 보고와 변경 승인으로 일정과 품질을 관리함

관리 방법론

본 사업은 분석/설계/개발/시험/운영 전환의 단계별 결과를 확인하고 다음 작업에 반영하는 방식으로 관리함. 사내 임원급 총괄 PM이 전체 일정/예산/품질/위험과 KHIDI 협의를 총괄하고, 분야별 담당자가 작업 결과와 확인사항을 보고함. 백귀리/김아현은 국문 분석/기획을 담당하며, 영문 기획/디자인/개발/기술 검증은 해당 사내 인력이 수행함. 계약체결 후 10일 이내에 업무 범위/일정/역할/보고/보안관리 및 산출물 제출계획을 포함한 사업수행계획서를 제출함. 요구사항 추적표를 통해 각 요구사항의 담당자/설계 자료/구현 결과/시험 결과를 연결하여 누락을 확인함. 개발 과정에서는 약 2주 단위로 구현 결과를 함께 검토하고, 주간/월간 보고와 주요 문제 발생 시 수시 보고를 실시함. 변경이 필요한 경우 담당자가 사유와 일정/비용/품질 영향을 정리하고, 총괄 PM이 KHIDI 승인 여부를 확인하여 반영함. 산출물은 작성자/검토자/버전/변경 내용을 기록하고 확정본을 구분하여 관리함. 일정 지연/보안 문제/성능 저하 등 위험은 담당자와 조치기한을 지정하여 해결 여부까지 추적함. 사업 진척과 검수는 요구사항 이행 및 산출물 완료 여부를 중심으로 확인하고, 인력별 업무일수는 제안사의 내부 배치/비용 계획으로 관리함.

5-2. 관리역량

총괄 PM이 분야별 책임과 의사결정을 조율하고, 담당자/기한/검토 결과를 명확히 공유해 협의사항을 실행으로 연결함

관리 역량

사내 임원급 총괄 PM을 중심으로 기획/디자인/개발/시험/서버/데이터/보안 담당자가 각 분야의 책임을 맡는 관리체계를 구성함. 백귀리는 국문 기획 책임자로서 요구사항과 사용자 분석, 메뉴/정보구조의 방향을 관리하고, 김아현은 현황/벤치마킹 분석과 화면 구성 기획 및 사용성 검증 준비를 담당함. 영문 기획 담당자는 외국인 이용 목적과 콘텐츠 구성을 검토하고, 디자인 담당자는 국/영문 시각 디자인과 웹 스타일 가이드를 관리함. 화면/기능 개발 담당자는 구현 가능성과 기존 시스템 연결 조건을 검토하며, QA 담당자는 시험과 품질 확인 결과를 통합 관리함. 주요 결정은 담당자/완료기한/검토 결과를 기록하여 후속 작업과 연결함. 의견이 다른 경우 사용자 문제와 RFP 기준, 기존 환경의 제약을 함께 확인하여 총괄 PM이 조정함. 각 산출물은 작성자와 검토자를 구분하고, 분야 간 연결이 필요한 항목은 공동 검토함. 기존 유지관리 업체와는 환경정보/연계 조건/운영 전환 및 인계사항을 확인함. 백귀리/김아현의 수행 역량은 이번 제안에서 작성한 현황 분석/벤치마킹/사용자 분석/정보구조와 화면 구성 자료를 통해 제시함. 가상 사내 인력의 역할과 역량은 모의 수행 전제로 설명하며, 실제로 보유하지 않은 경력/실적/인증을 증빙 사실로 제시하지 않음.

5-3. 일정 계획

100일 내 구현을 목표로 설계/개발을 병행하고, 이후 검증/시범운영/보완을 거쳐 150일 내 최종 인계와 검수를 완료하도록 단계별 산출물과 승인 일정을 관리함

5-3-1. 추진 일정

수행 단계	기간	산출물 및 주요 완료 시점	선행조건
1. 사업착수	1~10일	수행 범위 및 역할분담표, 사업수행계획서, 착수계, 보안관리계획 / **계약체결 후 10일 이내 제출 및 착수보고**	계약, RFP 요구사항 확인, 사내 역할 배정, KHIDI 협의 창구와 자료 요청사항 정리
▸ 사업수행	1~150일	1~30일: 국문 홈페이지 현황, 사용자, 벤치마킹 및 기존 환경 분석, 영문 콘텐츠 현황 확인 1~15일: 운영환경 정보 확인, 개발·시험환경 구성 및 동작·보안 점검 (16일 개발 착수에 필요한 환경 확보를 목표로 하며, 세부 일정은 착수 후 KHIDI의 자원/접근권한 제공 및 확인 절차와 연계하여 확정함) 16~60일: 국/영문 메뉴 및 화면 설계, 디자인/프로토타입 제작 / **착수 후 2개월 이내 PC·모바일 디자인 구성도 각각 3종 이상 제시** 16~100일: 확정된 항목부터 국/영문 화면, CMS 연결, 신고/본인확인/SNS 로그인/문서보기/알림 등을 순차 구현 및 번역/검수 병행 31~60일: 기능점수 데이터 초안 작성 91~100일: 준비된 항목의 시험 이관, 데이터 대조/오류 보완 및 복구 절차 검증 101~114일: 통합시험, 필요한 수정 및 재시험을 수행하고 결과서 제출, 구현 범위 반영 및 자료 대조/보완 115~119일: 추가 검증 및 보완, 변경 부분 재시험, 운영 전환 준비 120~140일: 사전 시험 통과와 승인을 전제로 운영 전환/시험운영/관리자 교육 141~150일: 추가 보완 및 재검증, 최종 인계 및 검수 대응	기존 자료 및 운영 환경 확인, 단계별 승인, 개발/시험 환경 확보, 데이터 구조/이관 프로그램 준비, 번역 대상 확장, 시험 통과 및 운영 반영 승인
▸ 산출물 제출 및 사업 검수	1~150일, 단계별 제출	분석 및 설계자료는 **분석 후 7일 이내 제출** 구현 완료를 100일 목표로 계획하고, **명세서/단위/통합시험 자료/사용자 및 운영자/관리자 매뉴얼은 구현 완료 후 14일 이내 제출** 오픈을 120일로 계획할 경우, 웹취약점 점검/조치결과서는 113일까지 제출 데이터 검증/메타데이터 현행화/교육/인계/종료 보안자료와 최종 결과물 제출	해당 단계의 작업/검토 완료, 요구사항 반영 확인, 오류/취약점 조치와 재검증, KHIDI 검수 일정 협의
▸ 착수·중간·최종 보고회	착수: 10일 이내 중간: 75일 전후 최종: 141~150일	착수보고: 범위/조직/일정/관리계획 중간보고: 국/영문 설계 결과, 구현, 진척, 위험 및 대응 현황 최종보고: 요구사항 이행, 시험 결과/인계/하자보수 계획	보고자료 취합, 단계별 결과 확보, KHIDI와 보고일 확정
2. 수시 점검 및 현황 보고	1~150일	매주 1회 주간보고, 매월 1회 월간보/·보안점검표 , 착수 후 1개월 이내 보안교육 결과 제출, 이후 월 1회 이상 보안교육 주요 오류, 일정 지연, 보안, 변경사항 발생 시 수시 보고	분야별 진척/문제/결정 필요사항 취합, 담당자와 조치기한 지정

5-4. 개발 장비

제안사가 업무별 장비와 도구를 준비하고 사용권·보안 적합성을 확인하며, KHIDI 승인 후 운영환경과 동일한 개발/시험환경을 구성하여 검증의 신뢰성을 확보함

개발 장비

제안사가 개발/시험/사업관리/품질관리에 필요한 장비와 소프트웨어를 준비하고, 사용권과 보안 적합성을 확인하여 운용함. KHIDI 승인 후 기존 서버/운영체제/소프트웨어와 연계 조건을 확인하며, 운영환경과 동일한 개발/시험환경을 구성함. 작업장소는 KHIDI와 협의하고, 원격지 개발 시에는 접근통제/장비관리/자료전송/백업 등 보안대책을 제시하여 확인받음.

구분	준비 장비/도구	활용 목적	관리 담당
국문/영문 기획	업무용 PC/노트북, 문서/표 작성 도구, Figma	분석, 메뉴구조도/화면 구성안/시제품 작성	국문/영문 기획 담당
디자인	디자인 작업용 PC, 디자인 도구, Figma	국/영문 시안, 공통 화면 요소, 웹 스타일 가이드 제작	디자인 담당
개발	개발용 PC, 코드 작성/버전관리 도구, 개발/시험 서버	화면/기능 개발, 코드 변경관리, 연계 시험	화면/기능/연계 개발 담당
화면/호환성 시험	PC/모바일 기기, 주요 브라우저, 접근성 점검 도구	기기/브라우저별 화면과 동작, 접근성 검증	화면 개발/QA 담당
성능/데이터/보안 점검	부하/성능 모니터링, DB 검증, 코드/웹 취약점 점검 도구	자원 사용량/데이터 정확성/보안 검증	서버/성능/DB/보안 담당
사용성 검증	과제 기록 도구, 사용 가능한 아이트래킹 장비	수행시간/성공률/시선 흐름 및 인터뷰 기록	백귀리/김아현, QA 지원

장비는 자산/반출입대장으로 관리하고, 업무별 접근권한과 저장 위치를 구분함. 유료 도구와 오픈소스는 모두 이용 조건을 확인하며, 기존 장비/라이선스의 활용 여부와 추가 비용을 예산에 반영함. 시제품 검토는 설계 검증으로 구분하고 실제 코드/운영환경 시험을 대신한 것으로 표시하지 않음. 본 모의 제안은 필요한 환경과 준비 책임을 제시하는 것이며, 실제 기관 시스템 접근이나 환경 구축을 완료한 것으로 표현하지 않음.

5-5. 투입 인력

5-5-1. 담당 조직 및 역할

사내 전문인력이 기획부터 개발/검증까지 직접 수행하고, KHIDI의 승인과 기존 유지관리 업체의 운영 협조를 연결해 책임 공백을 줄임

수행 구조

본 사업은 제안사 아귀가 단독으로 수행하며, 기획/디자인/개발/시험/서버/데이터/보안/영문 콘텐츠 업무를 사내 인력이 분담함. KHIDI는 요구사항 확인/승인/검수를 담당하고, 기존 유지관리 업체는 시스템 기반정보와 운영 전환/인계를 협조함.

협업 대상/담당 조직	담당 인력	주요 역할
KHIDI 정보화전략팀/관련 업무부서	사업/콘텐츠/신고 업무 담당자	자료 제공, 요구사항 확인, 설계/운영 반영 승인, 업무시험 및 최종 검수
아귀 — 사업관리	사내 임원급 총괄 PM	전체 일정/예산/위험/품질, 보고/의사결정/검수 관리
아귀 — 국문 기획	백귀리/김아현	국문 현황/사용자 분석, 메뉴/정보구조와 화면 구성 기획, 사용성 검증
아귀 — 영문 기획/디자인	영문 기획자/디자이너	영문 콘텐츠/메뉴 기획, 국/영문 시각 디자인과 웹 스타일 가이드
아귀 — 개발	화면 개발/기능/연계 개발 담당자	국/영문 반응형 화면, CMS/신고/인증/문서보기/알림 구현
아귀 — 시험/기술 검증	QA/서버/성능/DB/보안 담당자	시험계획/오류 관리, 환경/성능/데이터/보안 검증
아귀 — 영문 콘텐츠	전문 번역/원어민 검수 담당자	콘텐츠/메뉴/알림 번역, 용어/표현 검수 및 확인자료 작성
기존 KHIDI 유지관리 업체	기존 시스템/CMS/서버 담당자	환경/연계정보 제공, 운영 전환/백업/복구/인계 협조

의사소통 및 의사결정

총괄 PM을 KHIDI의 대표 협의창구로 지정하고, 분야별 실무협의 결과는 결정사항/담당자/기한과 함께 기록함. 기획/디자인/개발 담당자는 설계 단계부터 구현 가능성을 함께 검토하고, QA 담당자는 검증 기준의 누락 여부를 확인함. 협의는 '요구사항 확인 → 기획 및 디자인 → 사내 기술 검토 → KHIDI 승인 → 구현 및 시험 → 사용자 확인 → 검수' 순서로 진행함. 기존 유지관리 업체와의 협조는 제안사의 개발/시험/하자보수 책임을 대신하는 것으로 구분하지 않음.

5-5. 투입 인력

5-5-2. 역할별 예산 배분

SW기술자 평균임금과 역할별 업무량을 근거로 인건비와 수행경비를 구분해, 부가세 포함 9,900만 원의 사용처와 산정 근거를 명확히 제시함

본 예산 배분은 9,900만 원에는 인력별 업무 비용, 도구 사용비, 관리비, 보완 대비액, 회사 이익과 부가가치세를 포함함.
역할별 업무량은 모의 제안을 위한 계획값이며 실제 수행 가능성은 착수 후 기존 시스템의 재사용 범위, 기능별 작업량, 번역 분량 및 도구/서비스 이용료를 확인하여 검증함.

구분	금액	주요 내용
사업관리	9,840,780원	일정·예산·위험·품질 관리, KHIDI 협의, 보고·검수 및 산출물 관리
국문 기획	10,099,980원	백귀리·김아현의 요구사항·사용자·현황 분석, 국문 메뉴·정보구조 및 화면 구성 기획, 사용성 검증 준비
영문 기획	1,683,330원	외국인 이용 목적 분석, 콘텐츠 선별, 영문 메뉴·정보구조 및 화면 구성 기획
디자인	7,550,130원	국·영문 PC·모바일 디자인, KRDS 적용, 시안 및 웹 스타일 가이드 제작
화면 개발	13,466,640원	국·영문 반응형 화면 구현, 접근성 및 브라우저 호환성 대응
기능·시스템 연계 개발	22,695,000원	CMS 연결, 관세피해신고·관리자 기능, 본인확인·SNS 로그인, 문서보기·내려받기·알림 구현
시험·품질관리	5,658,900원	시험계획과 품질기준 관리, 기능·통합시험, 오류 추적 및 재시험
서버·성능	4,155,752원	개발·시험환경 구성, 성능 확인, 배포·백업·복구 검증
데이터	4,155,752원	데이터 구조·표준·정확성 검증, 필요한 데이터 이관 및 관리정보 정리
보안·개인정보	4,063,096원	취약점·권한·개인정보 보호조치 점검 및 수정 결과 확인
영문 번역·원어민 검수	3,000,000원	콘텐츠·메뉴·알림 번역, 표현·용어 검수 및 확인자료 작성
인건비 소계	**86,369,360원**	
도구·시험환경 사용비	1,500,000원	업무 도구, 시험환경 및 검증에 필요한 사용비
일반 관리비	1,000,000원	사업 수행을 지원하는 사내 행정·회계·공통 운영비
하자·추가 보완 대비액	500,000원	계획 외 오류 수정과 추가 보완에 대비한 금액
계획 이익	630,640원	사업 수행 후 회사에 남도록 계획한 이윤
공급가액 합계	**90,000,000원**	
부가가치세	**9,000,000원**	공급가액의 10%
총 계획 예산	**99,000,000원**	**부가가치세 포함**

2025년 SW기술자 임금실태조사
https://www.sw.or.kr/site/kipa/ex/board/View.do?bcIdx=64717&cbIdx=304&gubun=G

일평균임금은 공식 자료(2025년 SW 기술자 임금실태조사)이며, 업무량과 기타 비용은 모의 제안의 계획값이다.

6-1. 품질 보증

QA가 요구사항별 검증 결과와 보완 이력을 통합 관리하고, 단계별 산출물 대조와 오류 수정 후 재시험으로 누락과 결함의 해소 여부를 확인함

품질 보증

총괄 PM은 사업 전체의 품질 확보를 책임지고, QA 담당자는 요구사항별 확인 기준/시험 결과/보완 이력을 통합 관리함. 백귀리, 김아현은 국문 메뉴/정보구조와 사용성을, 영문 기획 담당자는 영문 콘텐츠 구성과 이용 흐름을 확인함. 디자이너는 국/영문 디자인과 웹 스타일 가이드의 일관성을 점검하고, 개발 담당자는 기능 구현과 연계 결과를 검증함. 서버/성능/DB/보안 담당자는 각 분야의 수치/정확성/보호조치를 확인함. 각 단계에서는 요구사항 추적표와 산출물 완료 기준을 대조하여 누락과 문서 간 불일치를 점검함. 오류는 발생 조건/영향/담당자/수정기한을 기록하고, 수정 후 QA가 재시험하여 종료 여부를 판단함. 영문 번역/원어민 검수는 메뉴/콘텐츠/안내 문구까지 포함하고, 최종 구현 화면에 검수 결과가 반영되었는지 확인함. 시험운영 중 발견한 결함도 동일한 절차로 관리하고, KHIDI가 승인한 최종 요구사항을 기준으로 검수자료를 제출함. 실제 보유하지 않은 품질인증이나 수행 실적을 제안사의 증빙으로 제시하지 않음.

6-2. 시험 운영

단위/통합시험부터 실제 운영환경 검증과 관리자 확인까지 단계별로 수행하고, 발견된 오류를 보완해 안정적으로 서비스를 전환함

시험 운영

시험운영은 단위/통합/시스템/성능/보안시험과 인수시험을 거쳐 실제 운영환경에 반영한 후 수행함. QA 담당자가 운영 중 확인할 업무와 오류 기록 기준을 정하고, KHIDI 업무 담당자가 주요 기능을 직접 확인하도록 지원함. 시험 범위에는 국/영문 콘텐츠/반응형 화면/CMS/신고/본인확인/SNS 로그인/문서보기/알림 기능을 포함함.

단계	계획 기간	주요 확인 내용	담당
운영 전 사전 검증	101~114일	기능/연계/권한/접근성/브라우저/성능/보안 확인, 백업/복구 시험과 사용자 확인시험	QA 주관, 분야별 담당 참여
추가 검증/ 전환 준비	115~119일	추가 보완, 변경 부분 재시험, 운영 전환 조건 확인	개발/서버/성능 담당, 기존 유지관리 업체 협조
운영 전환	120일 목표	사전 시험 통과와 KHIDI 승인된 결과물 배포, 콘텐츠/설정/연계 확인, 이상 발생 시 복구 절차 적용	개발/서버/성능 담당, 기존 유지관리 업체 협조
시험운영/교육	120~140일	실제 업무 흐름, 신고 처리/알림/파일/영문 서비스 확인, 오류/장애 기록 및 운영교육	QA/개발/기술 담당, KHIDI 참여
보완/안정화/인계	141~150일	수정 결과 재검증, 미해결 사항 확인, 운영자료 인계와 최종 검수	총괄 PM/QA/관련 담당

서버/성능 담당자는 RFP 적용 조건에서 페이지 표시시간 3초 이내, CPU 평균 사용률 70% 이하, 메모리 평균 사용률 75% 이하 여부를 확인함. QA 담당자는 결함 수·발생률·지속시간을 기록하고, 결함 발생률 5% 이상 시 시험운영을 연장하며 결함 지속시간은 3시간 이내로 관리함.
141~150일은 보완/인계/검수가 예정된 구간으로, 시험운영 연장을 위한 전용 예비기간이 아님. 수용 가능한 연장 일수는 현재 미확정이며, 착수 후 작업량과 선행조건을 구체화하여 일정 여유를 검토함.
연장이 필요한 경우 총괄 PM이 결함 수정/재검증/추가 관찰에 필요한 기간과 인계/검수 영향을 산정하여 KHIDI와 대응계획을 협의함. 사업기간이 자동 연장되는 것으로 간주하지 않음.
백귀리, 김아현의 국문 홈페이지 사용성 검증은 101~119일에 수행하고, 120~140일에는 시험운영에서 확인된 이용 불편의 보완 여부를 확인함. 웹취약점 점검 및 조치결과서는 120일 오픈 계획을 기준으로 113일까지 제출하며, 추가 변경이 발생하면 관련 보안 영향을 확인하고 필요한 재점검을 수행함.

6-3. 교육 훈련

담당자별 업무에 맞춰 실제 화면과 기능 중심으로 교육/실습하고, 실습 결과와 질의사항을 반영해 교육자료와 매뉴얼을 보완/인계함

교육 훈련

교육은 홈페이지 이용방법과 관리자/운영자 실무를 구분하여 구성함. 설계 단계에서는 안내자료 초안을 작성하고, 최종 매뉴얼은 실제 구현 결과에 맞춰 보완하여 RFP 제출기한에 제공함. 구현 이후 화면이나 기능이 수정되면 매뉴얼과 교육자료도 함께 갱신함.

교육 대상	주요 교육 내용	교육 담당	시기/방법
KHIDI 콘텐츠/업무 담당자	개편 메뉴, 콘텐츠 등록/수정, 신고 목록/처리상태 관리, 파일/내려받기/알림 확인	국문/영문 기획, 기능/연계 개발 담당	120~140일, 실제 화면 중심 설명/실습
홈페이지 관리자	사용자/관리자 권한, CMS 관리, 인증/연계 설정, 로그 확인	기능/연계 개발/DB/보안 담당	시험운영 중 기능별 실습
시스템 운영 담당자/기존 유지관리 업체	시스템 구성, 실행/설정, 모니터링, 배포/백업/복구, 장애 대응	서버/성능/개발/DB 담당	운영 전환 전 절차 공유, 시험운영 중 실습
영문 콘텐츠 운영 담당자	영문 콘텐츠 선별 기준, 공식 명칭/용어, 번역/검수 반영 및 수정 관리	영문 기획/번역/원어민 검수 담당	콘텐츠 확정/시험운영 단계
일반 이용자 안내	주요 메뉴 위치, 정보 탐색, 신고/인증 등 이용방법	국문/영문 기획, 개발 담당	사용자 안내자료/매뉴얼로 제공

교육 후에는 질의응답과 실습 결과를 확인하여 이해가 부족한 내용을 보완함. 교육자료/참석 기록/질의 및 보완사항을 정리한 결과보고서를 제출하고, 최종 자료를 KHIDI와 기존 유지관리 업체에 인계함. 교육 일정과 참석 대상은 KHIDI와 사전에 확정함.

6-4. 유지관리

기술이전과 운영자료 인계로 KHIDI와 기존 유지관리 업체의 지속 운영을 지원하고, 최종산출물 인도 후 1년간 하자를 책임 보수하며 수정/재검증 이력을 관리함

유지관리 및 기술이전

제안사는 개편한 시스템을 KHIDI와 기존 유지관리 업체가 지속적으로 운영할 수 있도록 기술이전과 자료 인계를 수행함. 개발 담당자는 소스코드/프로그램 설명/연계방식/설정정보를 정리하고, 서버/성능/DB 담당자는 환경 구성/백업/복구/데이터 관리자료를 제공함. 국문/영문 기획 담당자와 디자이너는 메뉴구조도/화면 구성안/웹 스타일 가이드/영문 용어자료를 제공하여 이후 콘텐츠와 화면 수정의 일관성을 지원함. 인계 시에는 자료 목록/수령자/확인 결과를 기록하고, 운영에 필요한 질문과 보완사항을 처리함. 기존 유지관리 업체는 기존 계약 범위에서 운영을 협조하며, 이번 개발 결과의 하자보수 책임은 제안사가 부담함.

하자보수 계획

구분	수행 내용
책임 주체	제안사 아귀가 총괄 PM을 중심으로 관련 사내 담당자를 배정하여 수행
책임 기간	RFP에 따라 **시험/검사를 거쳐 최종산출물을 인도한 날부터 1년**
대상	계약/승인된 요구사항에 비추어 발생한 기능/화면/연계/데이터 처리 등 결과물의 하자
처리 절차	접수 → 영향/원인 확인 → 담당자 배정 → 수정 → 재검증 → 결과 통보
운영 협조	운영환경 접근/배포/복구가 필요한 경우 KHIDI와 기존 유지관리 업체의 승인/절차에 따라 수행
별도 협의사항	신규 기능 추가 등 하자보수 범위를 벗어나는 요청은 RFP/계약 기준에 따라 범위와 처리방안을 협의
기록/인계	접수 내용/조치일/수정 내역/재시험 결과를 기록하고 관련 문서 갱신

하자보수 연락창구와 분야별 지원 담당자를 완료 단계에 확정하여 제공함. 보완 대비액의 소진 여부를 이유로 계약상 하자보수 책임을 제한하지 않음.

6-5. 기밀보안

업무별 접근권한과 자료 반출 통제로 비공개 정보의 유출을 방지하고, 사업 종료 시 자료 반납/삭제 증빙을 제출하며 종료 후에도 비밀유지 의무를 준수함

기밀보안

총괄 PM은 보안/개인정보 담당자를 지정하고 KHIDI 지침에 따른 인력/문서/장비의 보안관리계획을 운영함. 전체 참여인력은 업무 투입 전 보안서약을 제출하고, 사전 보안교육과 월 1회 이상 자체 교육에 참여함. 시스템/소스코드/개인정보/취약점 결과 등은 업무별 접근권한을 구분하여 관리하고, 승인되지 않은 외부 전송과 반출을 금지함. 원격지 작업 시에도 승인된 장소/장비/접속방식과 자료 저장/백업 기준을 적용함. 개발/DB 담당자는 개인정보 수집 최소화와 인증/암호화/접근통제를 구현하고, 보안/개인정보 담당자는 적용 결과를 검증함. 사용자 조사에서는 필요한 정보만 수집하고, 참여자 정보와 시선/인터뷰 기록의 접근/보관/삭제 범위를 사전에 정함. 번역/검수 담당자에게도 해당 업무에 필요한 자료만 제공하고, 비공개 업무자료가 불필요하게 전달되지 않도록 통제함. 개인정보 처리업무는 KHIDI와 제안사의 계약 범위에서 수행하며 재위탁하지 않음. 사업 종료 시 제공자료와 산출물을 반납하고 업무용 장비/저장매체의 관련 자료를 삭제하여 증빙 및 대표자 확약서를 제출함. 비밀유지 의무는 사업 종료 후에도 준수함.

6-6. 비상대책

비상상황별 담당자와 보고체계를 정하고, 사전 백업과 복구 절차 시험으로 장애에 대비하며 발생 시 피해 확산 방지부터 복구 확인/재발 방지까지 관리함

비상대책

총괄 PM은 장애/보안사고/데이터 손실/일정 지연을 유형별로 구분하고 대응 담당자와 보고체계를 지정함. 서버/성능 담당자는 운영 상태를 확인하고, 개발/DB/보안 담당자는 각 분야의 이상 여부를 점검함. 운영 반영 전에는 데이터/프로그램/설정을 백업하고, 이전 상태로 복구하는 절차를 시험함.

상황	초기 대응	조치 담당/보고
접속 불가/성능 저하	영향 범위와 서버/연계 상태 확인, 추가 변경 통제	서버/성능/개발 담당이 원인을 분석하고 총괄 PM이 KHIDI에 상황/복구계획 보고
신고/인증/알림 등 기능 오류	오류 조건/처리상태/데이터 영향 확인, 잘못된 처리 확산 방지	기능/연계 개발/DB 담당 수정, QA 재검증
데이터 손실/잘못된 변경	추가 변경 중단, 원본/백업/처리기록 확인	DB/서버/성능 담당이 승인된 절차로 복구
개인정보 노출/보안 이상	관련 접근을 통제하고 기록 보존, KHIDI에 즉시 보고	보안/개인정보 담당 주관, 개발/DB/서버 담당 조치
배포 실패	배포 중단, 사전 백업과 복구계획에 따라 이전 상태 복원	개발/서버/성능 담당, 기존 유지관리 업체 협조
일정 지연/담당자 부재	지연 원인과 선행 작업 영향 확인, 인계자료를 이용한 대응 검토	총괄 PM이 우선순위/대응일정을 조정하고 필요한 변경 승인을 요청

장애는 발견/보고/조치/복구 확인/원인 분석 순서로 기록하고, 반복되는 문제의 예방조치를 마련함. 시험운영 결함은 RFP의 지속시간/발생률 기준에 따라 관리하며, 일반 운영 장애의 우선순위와 대응기준은 KHIDI 운영체계에 맞춰 확정함. 인력 변경이 필요한 경우에도 임의 교체하지 않고 RFP와 계약의 승인 절차를 따름.

6-7. 기타 지원사항

기존 운영자산을 재사용해 중복 구축을 줄이고, 운영 기준과 기술자료/성과 측정 방법을 인계하여 개편 이후의 운영과 기능 보완을 지원함

기타 지원사항

기존 KHIDI의 서버/CMS/DB/SMS/대량메일 등 운영자산은 요구사항과 보안/호환성을 충족하는 범위에서 활용함. 기존 자산의 재사용과 신규 기능 개발을 구분하여 중복 구축을 줄이고, 필요한 개편/보완은 제안사 사내 인력이 직접 수행함. 기존 유지관리 업체와는 환경/연계 조건/배포/인계사항을 공유하여 운영 전환을 지원함.

지원 분야	제공 내용	담당
정보구조/화면 운영 기준	국문/영문 메뉴구조, 화면 구성, 공통 용어/표현과 웹 스타일 가이드	국문/영문 기획, 디자인 담당
영문 콘텐츠 관리	공식 명칭/용어, 번역/검수 결과와 확인자료, 향후 수정 시 참고사항	영문 기획/번역/검수 담당
개발/운영 기술이전	소스코드/설계서/연계정보/설정/운영 및 복구 절차	개발/서버/성능/DB 담당
개편 성과 확인	주요 기능 이용기록의 수집 기준과 국문 사용성 검증 결과 정리	기능/연계 개발, 백귀리/김아현, QA
향후 변경 지원	기능 보완/시스템 연계/확장 시 필요한 기술사항 안내	총괄 PM과 해당 사내 담당자

이용 성과는 기존/개선 화면의 동일 과제 결과와 확보 가능한 이용기록을 근거로 확인함. 사업기간 중 검증한 사용성과 장기 운영 성과를 구분하고, 운영 성과 측정에 필요한 수집 기준/기록 확인방법을 인계함. 측정하지 않은 개선 수치나 확보하지 않은 이용자료를 실제 성과로 제시하지 않음.

7-1. 기타

7-1-1. 사용자 분석 상세

사용자 유형 1. 바이오헬스 기업/산업체 실무자

제약·바이오, 의료기기, 화장품, 디지털헬스 기업, 바이오헬스 스타트업/중소기업

이용 목적
지원사업과 사업 참여 기회를 찾고, 시장·정책 정보를 바탕으로 사업 의사결정을 하기 위함 지원사업 공고, 참가기업 모집, 사업화·해외진출·수출 지원, 시장·산업정보, 컨설팅 정보 등을 탐색

근거
핵심서비스 이행표준 • 제약산업체 지원 사업을 핵심서비스로 명시함. • 제약기업의 국내·외 시장진출을 위한 컨설팅 및 교육 지원을 제공한다고 명시함. • 의료기기·화장품산업체 지원사업을 핵심서비스로 명시함. • 의료기기 기업을 대상으로 시장진입 정보 제공, 단계별·맞춤형 상담, 해외 인증 및 판로개척 등을 지원함. • 화장품 기업을 대상으로 해외 판로 확대, 글로벌 홍보, 수출 및 마케팅 지원을 제공함. • 신기술 사업화 지원사업을 운영하며 창업기업을 대상으로 아이디어 발굴부터 기술사업화, 해외진출까지 맞춤형 지원을 제공함. • 디지털헬스육성 사업을 통해 디지털헬스케어 서비스 발굴·육성을 위한 지원사업을 운영함. 2025 업무유형별 고객 만족 수준 평가 • 제약산업체 지원사업을 업무 유형 중 하나에 포함함. • 의료기기·화장품 산업체 지원사업을 업무 유형 중 하나에 포함함. • 보건의료 신기술 사업화 지원사업을 업무 유형 중 하나에 포함함. • 보건의료 미래 신산업 전략기획 사업을 업무 유형 중 하나에 포함함. 공지사항 페이지 → 기업이 직접 신청하거나 지원을 받을 수 있는 지원사업·기업 모집·사업화·해외진출 관련 콘텐츠가 상위 조회 게시물에 반복적으로 포함됨. 2024.01.01 ~ 2026.09.30 등록 게시물 약 320건 • 「BIO Europe 2024 참가지원 사업 공고 기한 연장」 조회수 78,567 / 조회수 상위 2위 • 「민간-공공기관 협력 미활용 특허 무료 및 소액 나눔 공고」조회수 70,262 / 상위 4위 • 「2024년도 보건복지형 예비사회적기업 모집 공고」조회수 67,988 / 상위 5위 • 「뉴 임팩트 프로젝트 참가기업 모집 사전 공고 및 설명회 신청 안내」조회수 63,848 / 상위 9위 • 「2024년 베트남 K-혁신사절단 참가기업 모집 공고」 조회수 61,047 / 상위 14위 • 「2024 KHIDI 지원 사업 가이드북」 조회수 55,494 / 상위 20위 연구보고서 페이지 → 기업의 시장 규모 파악, 사업전략 수립 및 해외진출 검토에 활용할 수 있는 산업 실태·시장·해외진출 정보에 대한 수요가 확인됨. 2024.01.01 ~ 2026.09.30 등록 게시물 39건 • 「제1차 의료기기산업 실태조사」 조회수 46,417 / 상위 1위 • 「2022년 바이오헬스산업 실태조사」 조회수 32,924 / 상위 5위 • 「2021년 바이오헬스산업 실태조사」 조회수 31,831 / 상위 9위 • 「중국 제약산업 현황 및 중국 진출 시사점」 조회수 23,734 / 상위 16위 KHIDI 웹사이트 제공 서비스 • 제약산업정보포털 • 의료기기산업정보 • 보건산업혁신창업센터 • 보건신기술 NET • 산업별 사업을 확인할 수 있는 사업공고 및 사업포털을 별도로 운영함.

사용자가 겪는 문제	근거
지원사업과 시장정보를 탐색하는 과정에서 PC와 모바일의 정보 접근 경로가 달라지고, 게시물 비교가 어려움. PC에서는 플로팅 영역을 통해 자료실/뉴스클리핑/정보공개 등에 바로 접근할 수 있지만 모바일에서는 동일한 단축경로가 없어 다시 메뉴를 탐색해야 함. 반대로 모바일 '바로이동'에는 보건산업통계가 제공되지만 PC에서는 같은 위치에서 접근할 수 없어 기기마다 탐색 방법이 달라짐. 또한 모바일 게시판에서 날짜/작성자 등을 확인하려면 가로스크롤이 필요하고, 카테고리 '+' 버튼이 텍스트와 겹쳐 추가 콘텐츠 탐색도 어려움.	이 사용자군의 주요 목적은 지원사업/참가기업 모집 탐색, 시장 및 산업정보 확인, 사업화/해외진출 기회 파악임. 실제 상위 조회 콘텐츠에서도 BIO Europe 참가지원, K-혁신사절단, 뉴 임팩트 프로젝트, KHIDI 지원사업 가이드북 등 기업의 사업 참여와 직접 연결된 정보에 높은 수요가 나타났고, 바이오헬스산업 실태조사 등 시장자료도 많이 이용함. 따라서 기업 실무자에게 중요한 것은 기회 발견 - 조건 비교 - 상세 확인 - 참여 판단의 연속적인 탐색이며, 디바이스별 경로 차이와 목록의 비교성 저하는 핵심 업무 효율에 직접 영향을 줌.

7-1. 기타

7-1-1. 사용자 분석 상세

사용자 유형 2. 보건의료 R&D 연구자

대학/연구소 연구자, 병원 연구자, 산/학/연/병 전문가, R&D 기획/관리 담당자

이용 목적
R&D 과제와 연구 지원 정보를 찾고, 연구 수행에 필요한 자료와 역량 강화 기회를 확보하기 위함 R&D 공고, 접수·평가 정보, 연구비 관리, 교육·설명회·워크숍, 연구·통계자료 등을 탐색

근거
핵심서비스 이행표준 • 보건의료기술 연구개발 지원 사업을 핵심서비스로 명시함. • R&D 기획 시 산·학·연·병 전문가의 의견을 수렴한다고 명시함. • 연구자를 대상으로 연중 컨설팅 및 교육지원·설명회를 제공함. • R&D 신규과제 공고와 사업설명회를 운영함. • '연구자 고객 전체'를 대상으로 R&D 사업 공고·접수·평가 관련 알림을 제공한다고 명시함. • 연구자를 대상으로 R&D 연구비 사용·관리 교육을 제공함. 서비스 업무 유형 • 연구 지원 서비스를 제공함. • 대학·연구소·산업체 등의 우수 연구자에게 보건복지부 R&D 연구비를 지원하는 서비스로 정의함. • 보건산업분야 전문인력 양성을 위한 교육·훈련 서비스를 운영함. • 2025 업무유형별 고객 만족 수준 평가 • 보건의료기술 연구개발 지원사업을 업무 유형 중 하나에 포함함. • 보건의료 미래 신산업 전략기획 사업을 업무 유형 중 하나에 포함함. • 보건의료 신기술 사업화 지원사업을 업무 유형 중 하나에 포함함. 공지사항 페이지 → R&D 과제 수행과 연구역량 향상에 직접 활용되는 연구개발 교육·워크숍·연구동향 정보가 높은 조회수를 기록함. 2024.01.01 ~ 2026.09.30 등록 게시물 약 320건 • 「WHO 글로벌 인력양성 허브 '백신·바이오의약품 생산공정 기본교육' 교육생 모집 안내」 조회수 72,337 / 상위 3위 • 「2024 Grant Week 글로벌 R&D 그랜트 라이팅 워크숍 개최」 조회수 64,217 / 상위 7위 • 「2024년 GBC 연계 혁신의료기기 규제 및 연구개발 동향 공유 포럼」 조회수 61,476 / 상위 13위 연구보고서 페이지 → 연구자가 연구 기획 및 분석의 기초자료로 활용할 수 있는 실태조사·산업통계·기술 및 정책 연구자료가 높은 조회수를 보임. 2024.01.01 ~ 2026.09.30 등록 게시물 39건 • 「제1차 의료기기산업 실태조사」 조회수 46,417 / 상위 1위 • 「2022년 바이오헬스산업 실태조사」 조회수 32,924 / 상위 5위 • 「글로벌 경제안보·통상 환경변화와 보건산업 GVC 재편 관련 영향조사」 조회수 29,751 / 상위 12위 • 「국외 인공지능(AI) 기반 디지털 헬스케어 경제성 분석 및 기술 개발 중심 HTA 연구 사례」 조회수 28,179 / 상위 15위 KHIDI 웹사이트 제공 서비스 • 대표사이트에서 별도로 연구·통계 → 보건산업통계·연구자료·바이오헬스정책연구를 제공함. • 보건의료기술종합정보시스템(HTDream)을 관련 서비스로 제공함. • 국가통합바이오빅데이터 등 연구 데이터와 관련된 서비스를 연결함.

사용자가 겪는 문제	근거
연구/통계자료와 R&D 정보를 반복적으로 탐색할 때 빠른 재접근과 자료 비교가 어려움. PC에서는 플로팅 영역의 자료실/뉴스클리핑을 통해 최신 자료로 바로 이동할 수 있지만 모바일에서는 해당 단축 경로가 사라짐. 반면 모바일에서는 '바로이동'의 보건산업통계로 직접 이동할 수 있으나 PC에서는 같은 위치에 해당 메뉴가 없어 기기별 탐색 방식이 달라짐. 게시판에서도 연구 공고의 제목, 작성기관, 등록일 등을 한 화면에서 비교하기 어려워 가로스크롤을 반복해야 함.	연구자의 주요 목적은 R&D 과제 및 공고 탐색, 교육/워크숍 참여, 연구 및 통계자료 확보임. 상위 조회 콘텐츠에서도 Grant Week, WHO 백신/바이오의약품 교육, 혁신의료기기 R&D 포럼 등이 확인됐으며 산업 실태조사와 통계자료도 높은 조회수를 보임. 즉 연구자는 동일 사이트를 반복 방문하며 여러 자료를 교차 탐색하는 사용자이므로 빠른 재접근, 정보 위치의 일관성, 여러 자료의 비교 가능성이 중요함.

7-1. 기타

7-1-1. 사용자 분석 상세

사용자 유형 3. 의료기관/국제의료 관계자

병원, 의료진, 외국인환자 유치기관, 의료 해외진출 기관 및 담당자

이용 목적
외국인환자 유치와 의료 해외진출 관련 제도·사업 정보를 확인하고, 국제의료 사업을 운영·확대하기 위함 해외진출 신고, 유치기관 등록·실적보고, 국제의료 정책·법규, 설명회·행사, 해외시장·실적자료 등을 탐색

근거
핵심서비스 이행표준 • 국제의료사업 제도운영 및 전략개발사업을 핵심서비스로 명시함. • 외국인환자 유치기관 및 사업 관계자에게 관련 법규·정책·제도 정보를 제공함. • 외국인환자 유치실적 통계자료를 제공함. • 의료해외진출법에 따른 진출 신고, 유치기관 등록, 실적보고 업무를 위한 홈페이지를 운영함. • 의료해외진출지원 및 한국의료홍보사업을 핵심서비스로 운영함. • 해외진출 단계에 따라 수요자 맞춤형 지원을 제공하고, 국제입찰 시장정보·컨설팅·수출상담회 등을 지원함. 2025 업무유형별 고객 만족 수준 평가 • 국제의료사업 인프라 강화 및 한국의료 홍보 사업을 업무 유형 중 하나에 포함함. • 의료 해외진출 지원사업을 업무 유형 중 하나에 포함함. 공지사항 페이지 → 병원 운영 및 외국인환자 유치와 직접 연결되는 의료기관 실무·제도 관련 공지에 높은 이용 수요가 확인됨. 2024.01.01 ~ 2026.09.30 등록 게시물 약 320건 • 「병원 대상 중대재해처벌법 및 ESG경영」 조회수 62,197 / 상위 11위 • 「2024년 외국인환자 불법유치행위 집중신고기간 운영 안내」 조회수 59,342 / 상위 19위 연구보고서 페이지 → 외국인환자 유치 실적, 해외진출 사례 및 국가별 시장정보의 이용 수요가 매우 뚜렷하게 나타남. 2024.01.01 ~ 2026.09.30 등록 게시물 39건 • 「2024 외국인환자 유치실적 통계분석 보고서」 조회수 42,279 / 상위 2위 • 「2023년 외국인환자 한국의료 이용경험 및 만족도 조사 보고서」 조회수 35,549 / 상위 3위 • 「2023 국가별 보건산업 현황 보고서 - 북미·중남미 9개국」 조회수 32,625 / 상위 6위 • 「2023 의료 해외진출 우수사례집」 조회수 32,468 / 상위 7위 • 「2023년 의료 해외진출 통계분석 보고서」 조회수 28,735 / 상위 13위 • 2024년 국가별 보건산업 현황 보고서 아시아·북미·중남미·유럽편도 상위 20위에 포함됨. KHIDI 웹사이트 제공 서비스 • 의료기관해외진출정보 • 스마트병원확산지원센터 • 의료기관회계정보공시 • Medical Korea를 관련 서비스로 제공함. • 실제로 2026년에도 외국인환자 유치의료기관을 직접 대상으로 한 홍보영상 제작 지원사업을 운영하는 등 의료기관 대상 지원사업을 지속하고 있음.

사용자가 겪는 문제	근거
국제의료 관련 공고/행사를 모바일에서 탐색하고 정보를 검증하는 과정에서 가독성과 정보 관계 파악이 어려움. 외국인환자 및 해외진출 관련 게시물을 모바일에서 볼 때 게시일과 상세정보를 함께 비교하기 어렵고, 카테고리 진입 버튼의 식별성도 떨어짐. 언어 선택 기능 역시 현재 상태와 전환 가능 언어를 직관적으로 이해하기 어려울 수 있음. 특히 후원승인 페이지는 모바일에서 행사명/주최기관/기간/장소가 지나치게 세로로 분절되어, 어떤 행사가 누가 주최하고 언제 열리는지 한눈에 연결해서 파악하기 어려움.	이 사용자군은 외국인환자 유치/의료 해외진출 관련 제도 확인, 행사/사업 참여, 시장 및 실적자료 확인을 위해 사이트를 이용함. 실제로 외국인환자 관련 설명회, 불법유치 신고 안내, 외국인환자 유치실적 및 의료 해외진출 통계의 높은 이용수요가 확인됨. 또한 KHIDI의 후원승인 페이지는 정식 후원 승인을 받은 행사인지 확인하는 검증 목적의 서비스로, 행사명/주최기관/기간/장소 등을 함께 비교해야 함. 따라서 모바일에서 정보 간 관계가 무너지면 단순 가독성을 넘어 행사의 공식성과 신뢰성을 검증하는 과업 자체가 어려워짐.

7-1. 기타

7-1-1. 사용자 분석 상세

사용자 유형 4. 정부·공공기관·정책 담당자

중앙/지방정부, 공공기관, 유관단체, 정책연구자, 정책/제도 담당자

이용 목적
산업 현황과 정책·제도를 파악하고 정책 수립·검토를 위한 근거자료를 확보하기 위함 산업통계, 정책동향, 정책분석, 정부 공고, 공공데이터, 국제협력 자료 등을 탐색

근거
서비스 업무 유형 • 연구 수행 서비스를 제공함. • 정부의 보건복지부·식약처 등 또는 민간으로부터 의뢰받은 정책연구를 수행하는 서비스로 정의함. 핵심서비스 이행표준 • 국제의료사업 관련 정책분석을 실시한다고 명시함. • 유관기관·단체의 의견을 수렴해 관련 정책과 사업을 추진함. • 정부간(G2G) 보건의료 협력 아젠다를 발굴하고 유관기관과 협력사업을 수행함. • 최신 글로벌 바이오헬스 정책동향을 정기적으로 제공함. • 국민과 보건산업체가 필요로 하는 수출·일자리 등의 정보통계를 정기적으로 제공함. • 보건의료 신산업 통계를 생산하여 **보건산업통계포털(KHISS)**을 통해 제공함 2025 업무유형별 고객 만족 수준 평가 • 보건의료 미래 신산업 전략기획 사업을 업무 유형 중 하나에 포함함. • 국제의료사업 인프라 강화 및 한국의료 홍보 사업을 업무 유형에 포함함. • 보건의료기술 연구개발 지원사업 등 정책 및 사업 기획과 연결되는 분야를 주요 업무로 평가함. 공지사항 페이지 → 공공데이터, 정부정책, 제도·공고 등 정책 및 공공행정과 연결된 정보도 상위 조회 콘텐츠에 포함됨. 2024.01.01 ~ 2026.09.30 등록 게시물 약 320건 • 「2024년 공공데이터 개방 정책 마련을 위한 수요 조사」 조회수 63,324 / 상위 10위 • 「2024년 보건의료기술진흥 유공자 정부포상 계획 공고」 조회수 62,086 / 상위 12위 • 「2024년 외국인환자 불법유치행위 집중신고기간 운영 안내」 조회수 59,342 / 상위 19위 연구보고서 페이지 → 산업정책 수립과 정책환경 분석에 활용할 수 있는 국가별 산업현황·통상·경제환경 분석자료의 지속적인 이용 수요가 확인됨. 2024.01.01 ~ 2026.09.30 등록 게시물 39건 • 「2023 국가별 보건산업 현황 보고서 - 북미·중남미 9개국」 조회수 32,625 / 상위 6위 • 「보건의료 통상리포트 Vol.2(2023)」 조회수 31,583 / 상위 10위 • 「2023 국가별 보건산업 현황 보고서 - 유럽 14개국」 조회수 30,732 / 상위 11위 • 「글로벌 경제안보·통상 환경변화와 보건산업 GVC 재편 관련 영향조사」 조회수 29,751 / 상위 12위 • 2024년 아시아·북미·중남미·유럽 국가별 보건산업 현황 보고서도 상위 20위에 포함됨. KHIDI 웹사이트 제공 서비스 • 바이오헬스정책연구 • KHIDI 브리프 • 글로벌 동향 • 보건산업통계/KHISS • 공공데이터 제공 • 정보공개·사전정보공표 • 규제개혁마당을 별도 메뉴로 제공함.

사용자가 겪는 문제	근거
공공자료·통계·기관정보에 접근하는 단축경로가 모바일에서 사라지고, PC와 모바일의 통계 접근 방식이 달라 반복적인 정보 탐색이 비효율적임. PC 플로팅 영역에서는 조직도·경영공시·정보공개·자료실·뉴스클리핑으로 바로 이동할 수 있지만 모바일에서는 이러한 바로가기가 제공되지 않아 전체 메뉴에서 다시 찾아야 함. 반대로 국민영양통계·보건산업통계는 모바일 '바로이동'에서 제공되지만 PC의 동일 메뉴에서는 접근할 수 없어 기기 간 일관성이 떨어짐. 정책·통계 게시물을 비교할 때도 모바일 게시판의 가로스크롤이 탐색 효율을 낮춤.	정책 담당자의 주요 목적은 산업통계·정책자료 조사, 정보공개·경영자료 확인, 정책·제도 공고 모니터링임. 실제 PC 플로팅 영역의 경영공시·정보공개·자료실은 이 사용자군의 목적과 직접 연결되고, 조회수 분석에서도 정책·정부공고, 공공데이터 수요조사, 산업 실태조사의 높은 수요가 확인됨. 즉 공공자료·통계·기관정보에 반복적으로 접근하는 사용자이므로 모바일에서 단축동선이 사라지거나 기기마다 위치가 달라지는 문제의 영향이 큼.

7-1. 기타

7-1-1. 사용자 분석 상세

사용자 유형 5. 일반 정보 이용자·구직자·공공 참여자

취업준비생, 이직 준비자, 학생, 일반 국민, 공모 및 정책 참여자

이용 목적
채용·교육·행사·공모 등 개인이 참여할 수 있는 기회를 찾고, 보건산업 관련 일반 정보를 확인하기 위함 채용정보, 교육·행사, 공모전, 조사·의견수렴, 산업동향·통계, 공공정보, 후원승인 등을 탐색

근거
핵심서비스 이행표준 • 미래 신산업 전략기획 과정에서 국민의 아이디어 및 의견을 수렴하는 사업을 연 1회 이상 운영한다고 명시함. • 미래 신산업 발굴과 사회적 공감대 형성을 위한 포럼을 운영함. • 국민과 보건산업체가 필요로 하는 일자리 등의 정보통계를 정기적으로 제공한다고 명시함. 2025 업무유형별 고객 만족 수준 평가 • 미래 신산업 전략기획, 국제의료, 연구개발 등 국민 대상 정보·의견수렴을 포함하는 업무가 고객만족도 평가 대상에 포함되어 있음. 공지사항 페이지 → 채용·취업뿐 아니라 행사, 공모전, 설문·의견수렴 등 이용자가 직접 참여할 수 있는 콘텐츠가 상위 조회 게시물에 포함됨. 2024.01.01 ~ 2026.09.30 등록 게시물 약 320건 • 「한국형 ARPA-H 프로젝트 PM 채용 설명회 개최」 조회수 60,881 / 상위 16위 • 「국민건강보험공단 2024년도 하반기 2차 개방형직위 및 전문인력 채용 안내」 조회수 59,978 / 상위 17위 • 「강서 미라클메디 의료관광 상품 공모전」 조회수 59,666 / 상위 18위 • 「2024년 공공데이터 개방 정책 마련을 위한 수요 조사」 조회수 63,324 / 상위 10위 • 「[청년의사] 하이펙스 2024」 조회수 64,551 / 상위 6위 KHIDI 웹사이트 제공 서비스 • 채용정보 → 채용공고 메뉴를 별도로 제공함. • 행사정보 메뉴를 별도로 운영함. • Q&A를 통한 일반 이용자 문의 창구를 제공함. • 규제개혁마당 → 규제개혁 제안을 통해 이용자가 직접 의견을 제출할 수 있음. • 공익신고안내·KHIDI 헬프라인 등 신고채널을 운영함. • 공공데이터 제공 및 정보공개 메뉴를 운영함.

사용자가 겪는 문제	근거
사이트 구조에 익숙하지 않은 상태에서 모바일로 채용·행사·공모 정보를 찾고 검증하기가 어려움. 채용공고 등의 날짜와 상세정보를 보기 위해 게시판을 좌우로 이동해야 하며, 같은 '바로이동' 메뉴의 항목이 PC와 모바일에서 달라 탐색 구조를 예측하기 어려움. 카테고리 '+' 버튼 겹침도 추가 정보 탐색을 방해함. 행사 신뢰성을 확인하기 위해 후원승인 페이지를 방문하더라도 모바일에서는 행사명이 한두 글자씩 줄바꿈되고 일정·기관 정보가 분리되어 내용을 빠르게 확인하기 어려움.	이 사용자군의 주요 목적은 채용정보 탐색, 행사·공모·설문 참여, 기관 및 행사의 신뢰성 확인임. 조회수 분석에서도 ARPA-H PM 채용 설명회, 전문인력 채용, 공공데이터 수요조사, 공모전 등에 대한 수요가 확인됨. 전문 실무자에 비해 사이트 구조에 익숙하지 않을 가능성이 높아 메뉴 위치를 기억하기보다 화면에 보이는 단서에 의존해 탐색할 가능성이 큼. 따라서 정보구조의 일관성 저하와 모바일 가독성 문제의 영향을 상대적으로 크게 받을 수 있음.

8-1. 본 제안의 범위

본 제안은 학습 목적의 모의 제안이며, 아귀를 기획/디자인/개발/시험/서버/데이터/보안/영문 콘텐츠 인력을 보유한 회사로 가정함. RFP의 전체 요구사항에 대응하며, 백귀리, 김아현은 국문 홈페이지의 분석/기획을 집중 수행하고 나머지 과업은 분야별 가상 사내 인력이 수행하는 것으로 계획함.

구분	본 제안에서의 처리 기준
회사 전체 수행 범위	국/영문 홈페이지 개편, 디자인/웹 스타일 가이드, 반응형 구현, 신고/인증/CMS 연계 및 시험/보안/데이터/운영지원 포함
학생 집중 수행 범위	백귀리, 김아현의 국문 현황/사용자/벤치마킹 분석, 메뉴/정보구조와 화면 구성 기획
가상 사내 인력의 업무	영문 기획/디자인/개발/시험/서버/DB/보안/번역/원어민 검수 및 사업 총괄
기존 유지관리 업체	기존 환경/연계정보 제공과 운영 전환/인계 협조. 제안사의 하도급 수행사로 편성하지 않음
사업 종료 후 지원	기술이전/매뉴얼/교육/인계와 RFP의 1년 하자보수 계획을 포함
증빙자료	실제 확인 가능한 출처와 작성자료를 제시하고, 가상 경력/실적/인증/번역확인서 등을 실제 발급자료처럼 작성하지 않음
시험/인증 결과	실제 수행 결과와 향후 계약 후 수행할 검증계획을 구분하며, 미실시 시험/미취득 인증을 완료로 표시하지 않음
예산/인력	사업기간 150일은 RFP 기준이며, 13명·244인일은 모의 제안의 역할별 계획 업무량임. 전체 산출물을 충당하는 과업별 작업량은 아직 검증하지 않았으며, 착수 후 화면/기능/연계/번역/시험 등의 수량과 재사용 범위를 확인하여 업무량, 일정, 예산의 적정성을 검토함.

모의 제안이라는 이유로 RFP 과업이나 종료 후 지원을 제외하지 않으며, 실제 제작한 자료와 향후 수행계획을 구분하여 제시함.

AI 레드팀 보고서2

사용한 도구와 날짜

사용한 도구: Chat-GPT Work 6.1 Sol Light / 날짜: 26.10.20 01:54

프롬프트	AI 지적	근거 쪽	판정	이유	우리가 고친 곳
P3	공지사항 분류명 차이	p.44, 51	수용	정보구조 설계의 메뉴구조도(44쪽)는 '중앙본부', 화면 설계(51쪽)는 '중앙부처'로 표기하여 같은 분류의 이름이 다름	KHIDI 홈페이지를 다시 확인하고 메뉴 구조도의 '중앙본부'를 올바른 용어인 '중앙부처'로 수정함.
P3	채용 메뉴명 차이	p.42, 44	수용	같은 메뉴를 '채용정보'(42쪽)와 '채용공고'(44쪽)로 다르게 표기함. 연결 주소나 기능 오류까지 확인된 것은 아님	44쪽의 '채용공고'를 올바른 표현인 '채용정보'로 수정함.
P3	입찰 메뉴명 차이	p.44, 50	수용	기존 영역은 '입찰정보'(44쪽), 빠른 메뉴는 '입찰공고'(50쪽)로 표기가 다름. 별도 기능인지는 판단할 수 없음	50쪽의 '입찰공고'를 '입찰정보'로 수정함.
P3	피해지원 메뉴명 차이	p.42, 44	수용	'피해지원센터'(42쪽)와 '피해자지원센터'(44쪽)로 표기가 달라, 같은 센터를 가리킨다는 근거가 없음	44쪽의 '피해지원센터'를 '관세·수출 피해지원센터'로 수정함.
P3	게시물 1287번 등록일 차이	p.51	기각	같은 쪽의 기존 화면은 '2026-10-08', 개선 화면은 '2026.01.16'으로 같은 번호·제목 게시물의 등록일이 다름. 예시 화면의 차이로 실제 운영 데이터 오류는 아님	해당 텍스트는 프로토타입용 더미 텍스트이기 때문에 기각함.
P3	게시물 1287번 조회수 차이	p.51	기각	같은 게시물의 조회수가 기존 화면은 '457', 개선 화면은 '60'으로 예시 화면의 수치가 다름	해당 텍스트는 프로토타입용 더미 텍스트이기 때문에 기각함.
P3	개선 화면 내부의 동일 번호 정보 차이	p.51	기각	개선 화면에서 같은 1287번과 제목을 반복하면서 분류·날짜·조회수를 '외부공지/2026.01.16/60', '내부공지/2026.01.15/166'처럼 다르게 표시함	해당 텍스트는 프로토타입용 더미 텍스트이기 때문에 기각함.
P4	플로팅 버튼의 '헤매지 않는' 효과 미검증	p.33, 57	수용	모바일 플로팅 메뉴로 '헤매지 않는다'는 효과를 제시했으나, 클릭 수·수행 시간·성공률을 아직 측정하지 않아 이용 효과가 검증되지 않음. 설계 근거 부재가 아닌 효과 미검증의 문제임	p.33의 '헤매지 않는다'를 '탐색 부담 감소를 기대함'으로 수정하고, p.57의 기존안과 개선안 화면 비교 테스트계획과 연결함.
P4	공고 요약의 효율 향상 미검증	p.49, 57	수용	사업공고 주요내용 요약으로 효율이 향상된다고 제시했으나, 클릭 수·수행 시간·성공률을 측정하지 않아 효과가 아직 검증되지 않음	p.33의 세부 추진 전략의 혜택을 설계에 따른 기대효과로 명시하고, 실제 계약 후 기존·개선 화면을 비교하는 p.57의 검증계획과 연결함. p.49는 해당 전략을 구체화한 화면으로, 중복 설명은 추가하지 않음.
P5	150일·244인일 수행량의 산정 근거 부족	p.82	수용	8-1에 총량(13명·244인일, 부가세 포함 9,900만 원)은 제시했으나, 전체 산출물을 충당하는 과업별 작업량의 산정 설명이 없음	244인일을 모의 제안의 잠정 계획값으로 명시하고, 전체 과업 수행에 충분한지는 미확정으로 남김. 착수 후 과업별 수량과 재사용 범위를 확인하여 업무량·일정·예산의 적정성을 검토하도록 보완함.

AI 레드팀 보고서2

사용한 도구와 날짜

사용한 도구: Chat-GPT Work 6.1 Sol Light / 날짜: 26.10.20 01:54

프롬프트	AI 지적	근거 쪽	판정	이유	우리가 고친 곳
P5	예산 배분의 견적 근거 부족	p.69	수용	역할별 예산 배분(5-5-2)이 실제 견적이나 공식 단가로 확정한 원가가 아니며 견적 확인이 필요하다고 스스로 명시함	'실제 견적이 아니며 견적 확인이 필요하다'는 포괄적인 설명을 수정하고, 총 예산의 구성 항목을 명시함. 공식 일평균 임금과 제안사의 업무량, 기ㅅ타 비용 가정을 구분하고, 착수 후 재사용 범위, 작업량 및 서비스 이용료를 확인해 수행 가능성을 보완함.
P5	가상 전문인력의 실제 확보 근거 부족	p.82	수용	나머지 과업을 분야별 가상 사내 인력이 수행하는 것으로 계획하여 실제 확보 증빙은 없음. 다만 모의 제안의 가정을 명시했으므로 허위 기재로 볼 근거는 없음	기술 분야를 수행할 사내 인력은 모의 제안의 가정이며, 실제 확보 증빙이 없다는 점을 인정함. 데이터/보안/개발 등 기술 요구사항에 대응하기 위해 분야별 사내 인력을 보유한 회사로 가정했음을 명시함.
P5	디자이너 1명의 수행량 근거 부족	p.5, 37	수용	디자이너 1명이 PC·모바일 디자인 구성도를 각각 3종 이상 제시하는데, 화면 수·수정 횟수에 따른 작업량 근거가 없음. 인력 부족 자체가 확정된 것은 아님	p.37에 착수 후 작업 범위를 구체화하여 배치, 일정 및 예산의 적정성을 검토하는 절차를 추가함. 인력 부족 여부는 미확정으로 남김.
P5	개발환경 구축 완료 일정 없음	p.66, 67	수용	운영환경과 동일한 개발·시험환경 구성 계획과 선행조건은 있으나, 구축 완료 시점이 제시되지 않음	p.66에 개발/시험환경 구성 및 확인 목표를 15일 이내로 추가함.
P5	시험 이관의 개별 일정 없음	p.55	수용	데이터 요구사항(3-3)에 작업 시점을 정한 후 시험 이관을 수행한다는 계획만 있고, 실제 날짜·구간이 없음	p.66에 시험 이관의 잠정 구간을 91~100일로 추가하고, 데이터 구조·이관 프로그램 준비를 선행조건으로 명시함. 세부 일정은 대상과 규모 확인 후 확정하도록 보완함.
P5	시험운영 연장 여유의 산정 근거 부족	p.71	수용	결함 발생률 5% 이상 시 시험운영을 연장한다고 했으나, 141~150일 보완·인계 구간 안에서 연장 기간을 얼마나 수용할 수 있는지 근거가 없음	p.71에 141~150일이 보완/인계/검수 구간이며 시험운영 연장 전용 예비기간이 아님을 명시함. 수용 가능한 연장 일수는 미확정으로 남기고, 연장 필요 시 작업량과 최종 일정 영향을 산정하여 KHIDI와 대응계획을 협의하도록 보완함.
P5	기능점수 산정 역량·개별 일정 근거 부족	p.56	수용	기능점수 작성 담당자를 지정했으나 역량은 '보유한 것으로 가정'한 것이며, 개별 작성·검토 일정이 없음	p.56에 역량 가정과 증빙의 한계를 명시하고, p.56, 66에 초안 작성 및 구현 후 보완 및 검토의 잠정 구간을 추가함. 세부 일정은 착수 후 확정하도록 보완함.
P6	수행 시간 감소의 개선 폭 불명확	p.10	수용	기대효과에서 서비스 접근·정보 확인 시간이 감소한다고 했으나 감소 목표의 폭이 없고, 기대효과가 이미 달성한 성과처럼 읽힐 수 있음	p.10의 시간 감소 목표를 현재 미검증임을 명시함. 감소 목표는 착수 후 기존 화면 측정 결과를 바탕으로 정하고, p.57의 비교 검증계획과 연결함.
P6	미실시 검증을 완료한 것처럼 쓴 문장 여부	p.57, 82	수용	57쪽과 82쪽에서 미실시 시험·미취득 인증을 완료로 표시하지 않는다고 명시하여, 미실시 검증을 완료한 것처럼 쓴 문장은 확인되지 않음(기존 판정 유지)	추가 수정 없음. 미실시 검증을 완료로 표시하지 않는 기존 원칙을 유지함.

P8에서 철회된 지적 수: 1개/ 내용: P3 작업 중 언급한 '바로이동' 메뉴의 항목 수 차이/철회 이유: 구조도의 별도 상위 메뉴를 '바로이동' 하위 항목으로 잘못 세었으며, 제안서 38·41쪽 모두 하위 항목은 '메인', 'Q&A'로 확인됨.

레드팀 말고 AI를 쓴 곳: 편집 가능한 표 제작, 기술 관련 항목 가상의 대응방안 도출, 평가표 대응표 작성, 예산 배분, 요구사항 대응표, 페이지 넘버링, 장표마다 들어가는 정리 문장 초안 작성
